
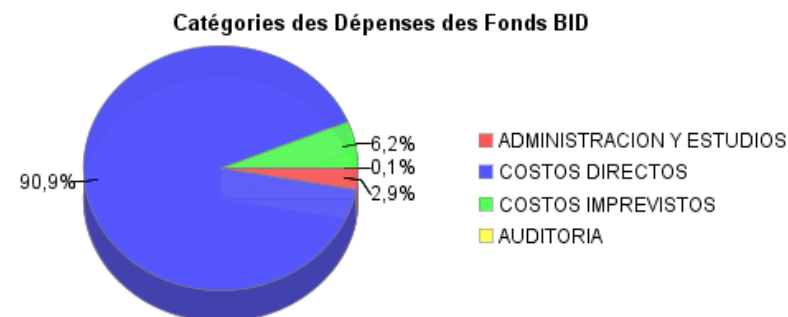


Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES				
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2322/OC-VE	Montant Courant Approuvé:	140.000.000,00	Initial BID:	140.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	140.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400	Solde:	140.000.000,00	Cofinancement/Pays:	60.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	200.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010

Progrès Cumulé

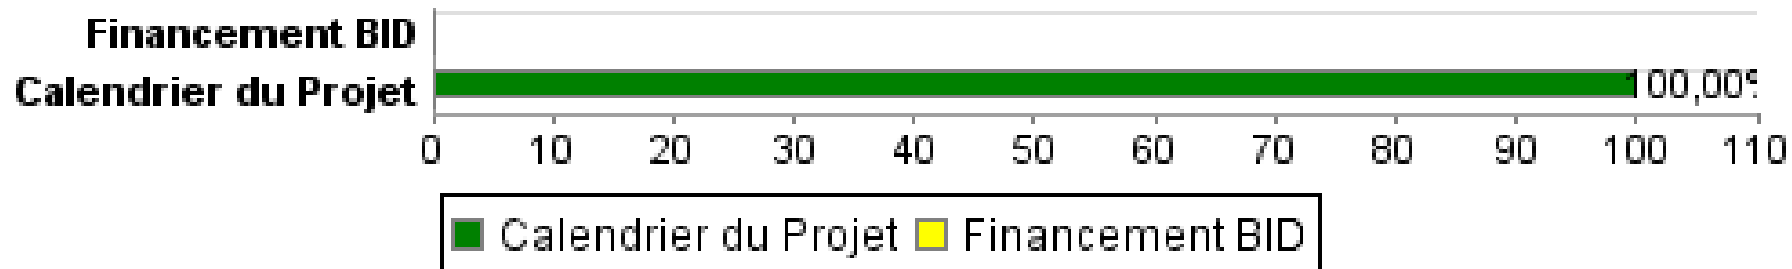

Résultats

Résultat:	Residuos y desechos sólidos dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observações:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1.100,00	2011	P A	0,00

Résultat:	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a RDS se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0,20	2011	P A	4,00

Résultat:	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto				3,00				4.000.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan				4,00				800.000,00
Infraestructura y Mejora Operacional									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno				5,00				135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día dispuestas				1.100,00				39.600.000,00
Costos administrativos y de supervisión									
Costos imprevistos									
Auditoría									
TOTAL									179.600.000,00
