
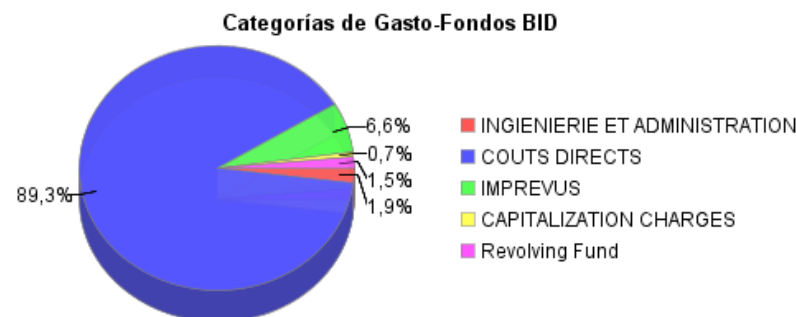
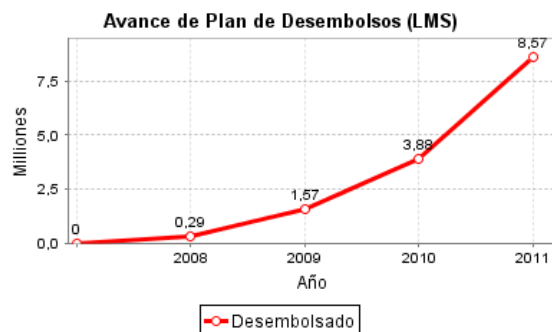



Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | Costo total y Fuente |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | | |
| Sector: | ENERGY | | |
| Número(s) de Préstamo: | 1813/SF-HA;2394/GR-HA | Monto Aprobado Actual: | 18.328.400,00 |
| Etapa: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 6.022.445,46 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 32,86 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | Saldo: | 12.305.954,54 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | |
| | | BID Original: | 34.100.510,84 |
| | | Actual BID: | 18.328.400,00 |
| | | Pari-passu: | 99,00 |
| | | Co-financiamiento/País: | 160.000,00 |
| | | Estimado Original: | 34.260.510,84 |
| | | Período de Amortización (meses): | 354 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|--|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R) | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Oct 20, 2011 Validado por Representante de País: Oct 21, 2011 |

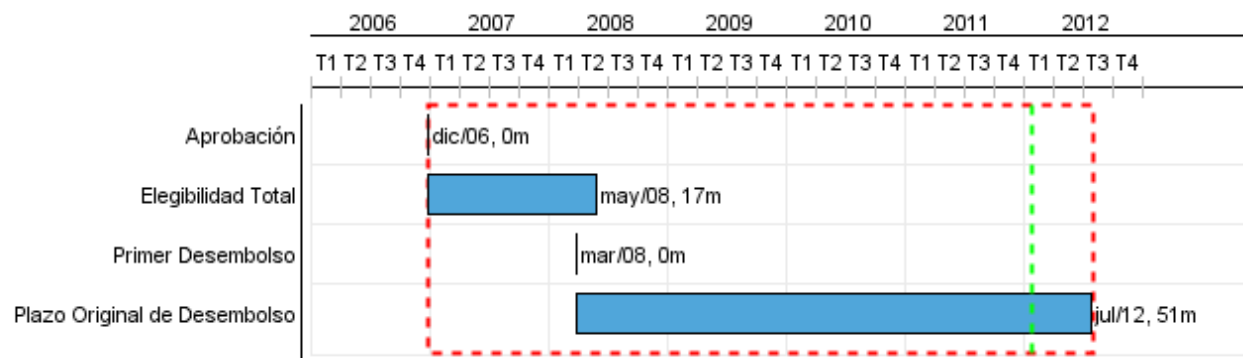

Progreso Acumulado al 2011

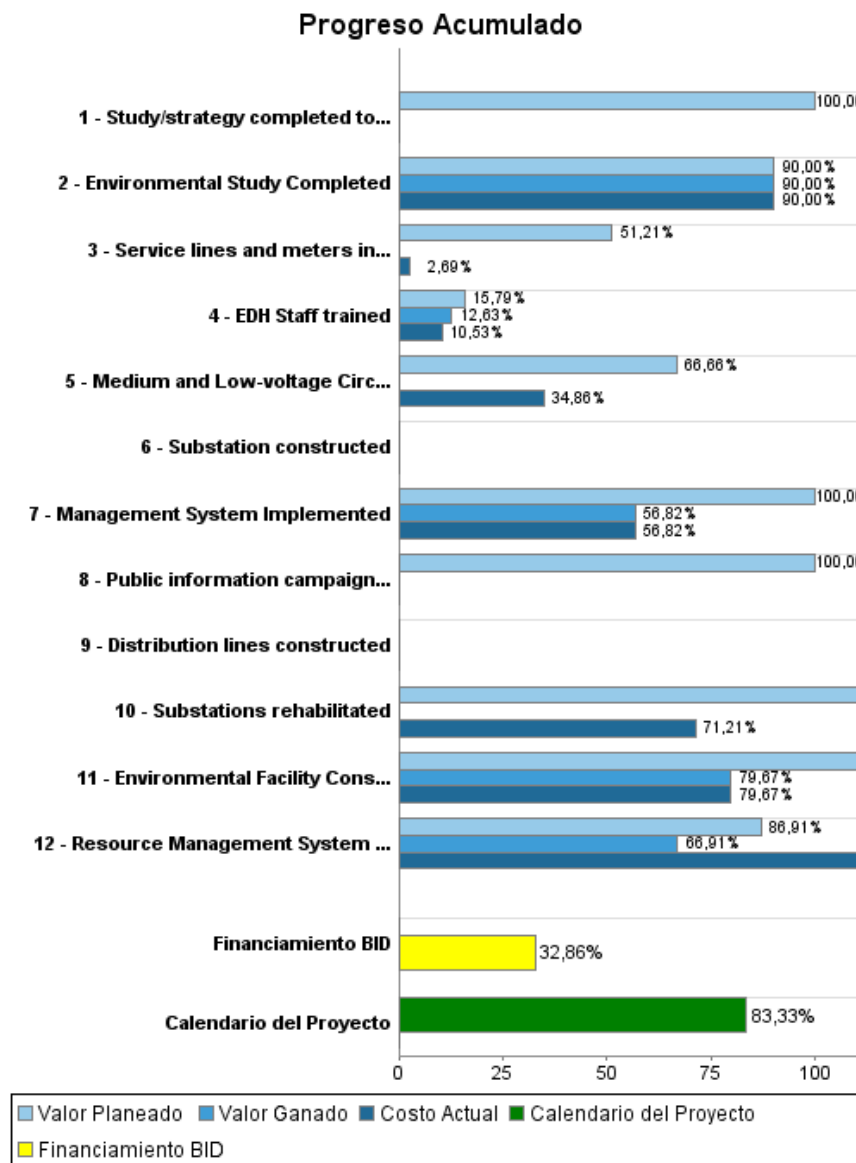

Resultados

Resultado: Technical and non-technical losses in the distribution system reduced.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Technical losses | MWh | 48,05 | 2007 | P A | 30,05 | 30,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
| Billing rate | %/month | 75,00 | 2007 | P A | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 84,00 | 84,00 | | 84,00 |
| Cash recovery rate | %/month | 30,00 | 2007 | P A | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |

Resultado: Basic distribution system infrastructure improved

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Electrical outages | outages | 126,00 | 2007 | P A | 33,00 | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 22,00 |

Resultado: Quality of client service improved

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Energy delivered in the program area | MWh | 287,00 | 2007 | P A | 287,00 | 287,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |

Resultado: EDH Management capacity improved

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Transfers from the central government to EDH recorded in the budget | MUSD | 50,00 | 2006 | P A | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Rehabilitation of medium and low-voltage works and retailing components | | | | | | | | | |
| Substations rehabilitated | Substations | 2,00 | | | 3,00 | 200.000,00 | 136.180,00 | | 2.632.000,00 |
| Medium and Low-voltage Circuits Rehabilitated | Circuits | 5,00 | | | 7,00 | 1.038.000,00 | 1.728.508,00 | | 6.074.072,00 |
| Service lines and meters installed | Meters | 25.000,00 | | | 35.000,00 | 1.000.000,00 | 157.644,00 | | 5.858.000,00 |
| Substation constructed | Substation | | | | 1,00 | | | | 8.337.750,00 |
| Distribution lines constructed | Kilometers | | | | 27,40 | | | | 3.395.000,00 |
| Set up Commercial Management and Institutional Reinforcement System | | | | | | | | | |
| Management System Implemented | System | | 1,00 | | 1,00 | 1.100.000,00 | 600.000,00 | | 4.400.000,00 |
| Resource Management System Operational | System | | 1,00 | | 1,00 | | 685.931,00 | | 2.400.000,00 |
| EDH Staff trained | Staff | | 5,00 | | 20,00 | | 20.000,00 | | 190.000,00 |
| Environmental Facility Constructed | Facility | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 35.000,00 | | 300.000,00 |
| Environmental Study Completed | Study | | 1,00 | | 1,00 | | 62.000,00 | | 100.000,00 |
| Study/strategy completed to implement the medium-and long-term investment plan | Study | | | | 1,00 | | | | 250.000,00 |
| Public information campaign conducted | Campaign | | | | 1,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| Project Administration | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.413.000,00 | 3.425.263,00 | | 34.011.822,00 |
