




























Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total		S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022	S2	2023	S2	2024
												S1	S1		S1		S1		S1		S1		S1		S1		S1
1		Programa de Ampliación y Mejora para Abastecimiento Sostenible y Resiliente de Agua en Ciudades I (BO-L 1191)	lun 03/04/17	mar 01/08/23	\$8,750,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$13,750,000	\$2,500,000	\$75,000,000																	
2		Preparación y Aprobación del Programa	lun 03/04/17	mar 09/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
3		Preparación del Programa	lun 03/04/17	mié 29/11/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
4		Misión de Identificación	lun 03/04/17	vie 07/04/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
5		Misión de Orientación	lun 12/06/17	vie 16/06/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
6		Misión de Análisis	lun 04/09/17	vie 08/09/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
7		Misión de Negociación	vie 20/10/17	vie 20/10/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
8		Aprobación por el Directorio Ejecutivo del BID	mié 29/11/17	mié 29/11/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
9		Aprobación del Contrato de Préstamo	mié 29/11/17	mar 15/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
10		Suscripción del Contrato de Préstamo Estado Plurinacional de Bolivia - BID	mié 29/11/17	mar 09/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
11		Aprobación de la Asamblea y Promulgación de Ley	mié 10/01/18	mar 15/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
12		Suscripción del Convenio Subsidiario MPD - MMAyA	mié 16/05/18	mar 07/08/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
13		Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	mié 16/05/18	jue 26/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
14		Resolución Ministerial para la Ampliación de Atribuciones UCP-PAAP	mié 16/05/18	vie 29/06/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
15		Informe técnico para la emisión de RM	mié 16/05/18	mié 16/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
16		Informe jurídico para la emisión de RM	jue 17/05/18	lun 11/06/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
17		Emisión de R.M.	mar 12/06/18	vie 29/06/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
18		Contratación de personal mínimo	mié 16/05/18	jue 26/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
19		Asignación Personal Clave UCP-PAAP	mié 16/05/18	mié 16/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
20		Designación de los responsable del Programa para la firmas autorizadas UCP - PAAP	lun 02/07/18	jue 26/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
21		Declaración de Elegibilidad por el BID	vie 27/07/18	mar 07/08/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
22		Inscripción Presupuestaria	mié 08/08/18	mar 09/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
23		Inscripción presupuestaria UCP-PAAP	mié 08/08/18	mar 09/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
24		Componente I. Obras de Infraestructura	mié 22/08/18	mié 12/04/23	\$7,719,743	\$18,308,645	\$19,156,881	\$9,200,890	\$1,075,684	\$55,461,843																	
25		Obras de Infraestructura	mié 22/08/18	mié 12/04/23	\$7,719,743	\$18,308,645	\$19,156,881	\$9,200,890	\$1,075,684	\$55,461,843																	
26		La Paz - El Alto	mié 22/08/18	mar 22/06/21	\$3,067,000	\$4,200,000	\$3,863,000	\$0	\$0	\$11,130,000																	
27		Obras Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pampahasi	mié 19/09/18	mar 25/05/21	\$2,961,000	\$4,000,000	\$3,639,000	\$0	\$0	\$10,600,000																	
28		Proceso de Contratación (LPI)	mié 19/09/18	mar 05/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
29		Ejecución de Obras	mié 06/03/19	mar 02/02/21	\$2,961,000	\$4,000,000	\$2,690,000	\$0	\$0	\$9,651,000																	
30		Entrega Definitiva	mié 03/02/21	mar 25/05/21	\$0	\$0	\$949,000	\$0	\$0	\$949,000																	
31		Supervisión de Obras Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pampahasi	mié 22/08/18	mar 22/06/21	\$106,000	\$200,000	\$224,000	\$0	\$0	\$530,000																	
32		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 22/08/18	mar 05/02/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																	
33		Ejecución del Servicio	mié 06/02/19	mar 22/06/21	\$106,000	\$200,000	\$224,000	\$0	\$0	\$530,000																	
34		Cochabamba	mié 05/09/18	mar 03/08/21	\$4,569,998	\$7,478,020	\$8,758,020	\$4,578,278	\$1,075,684	\$26,460,000																	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
											S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
35		Obras Proyecto Linea de Aduccion 5 Jove Rancho - Quillacollo	mié 03/10/18	mar 11/05/21	\$744,000	\$987,000	\$1,989,000	\$0	\$0	\$3,720,000																
36		Proceso de Contratación (LPI)	mié 03/10/18	mar 19/02/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
37		Ejecución de Obras	mié 20/02/19	mar 19/01/21	\$744,000	\$987,000	\$1,166,500	\$0	\$0	\$2,897,500																
38		Entrega Definitiva	mié 20/01/21	mar 11/05/21	\$0	\$0	\$822,500	\$0	\$0	\$822,500																
39		Supervisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 5 Jove Rancho - Quillacollo	mié 05/09/18	mar 08/06/21	\$40,000	\$60,000	\$100,000	\$0	\$0	\$200,000																
40		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 05/09/18	mar 22/01/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
41		Ejecución del Servicio	mié 23/01/19	mar 08/06/21	\$40,000	\$60,000	\$100,000	\$0	\$0	\$200,000																
42		Obras Proyecto Linea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe	vie 05/10/18	jue 26/11/20	\$1,102,743	\$2,790,000	\$3,200,000	\$2,207,258	\$0	\$9,300,001																
43		Proceso de Contratación (LPI)	vie 05/10/18	jue 21/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
44		Ejecución de Obras	vie 22/03/19	jue 06/08/20	\$1,102,743	\$2,790,000	\$3,200,000	\$1,655,443	\$0	\$8,748,186																
45		Entrega Definitiva	vie 07/08/20	jue 26/11/20	\$0	\$0	\$0	\$551,815	\$0	\$551,815																
46		Supervisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe	vie 07/09/18	jue 24/12/20	\$218,000	\$150,000	\$80,000	\$52,000	\$0	\$500,000																
47		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	vie 07/09/18	jue 21/02/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
48		Ejecución del Servicio	vie 22/02/19	jue 24/12/20	\$218,000	\$150,000	\$80,000	\$52,000	\$0	\$500,000																
49		Obras Proyecto Linea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur	mié 31/10/18	mar 06/07/21	\$2,335,255	\$3,296,020	\$3,269,020	\$2,114,020	\$1,075,684	\$12,089,999																
50		Proceso de Contratación (LPI)	mié 31/10/18	mar 16/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
51		Ejecución de Obras	mié 17/04/19	mar 16/03/21	\$2,335,255	\$3,296,020	\$3,269,020	\$2,114,020	\$537,843	\$11,552,158																
52		Entrega Definitiva	mié 17/03/21	mar 06/07/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$537,841	\$537,841																
53		Surpevisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur	mié 03/10/18	mar 03/08/21	\$130,000	\$195,000	\$120,000	\$205,000	\$0	\$650,000																
54		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
55		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 03/08/21	\$130,000	\$195,000	\$120,000	\$205,000	\$0	\$650,000																
56		Oruro	mié 03/10/18	mar 12/10/21	\$0	\$6,299,645	\$4,931,258	\$1,159,097	\$0	\$12,390,000																
57		Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de oruro APRAUR en la ciudad de Oruro	mié 31/10/18	mar 14/09/21	\$0	\$6,063,645	\$4,652,258	\$1,084,097	\$0	\$11,800,000																
58		Proceso de Contratación (LPI)	mié 31/10/18	mar 16/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
59		Ejecución de Obras	mié 17/04/19	mar 25/05/21	\$0	\$6,063,645	\$4,652,258	\$542,049	\$0	\$11,257,952																
60		Entrega Definitiva	mié 26/05/21	mar 14/09/21	\$0	\$0	\$0	\$542,048	\$0	\$542,048																

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022	S2	2023	S2	2024
												S1		S1		S1		S1		S1		S1		S1		
61		Supervisión de Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de oruro APRAUR en la ciudad de Oruro	mié 03/10/18	mar 12/10/21	\$0	\$236,000	\$279,000	\$75,000	\$0	\$590,000																
62		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
63		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 12/10/21	\$0	\$236,000	\$279,000	\$75,000	\$0	\$590,000																
64		Otros proyectos en Cochabamba, Sucre, Potosí, La Paz-El Alto y Oruro	jue 03/10/19	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$1,273,623	\$3,132,536	\$0	\$4,406,159																
65		Obras otros proyectos en Sucre y Potosí	jue 31/10/19	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$1,200,623	\$2,986,325	\$0	\$4,186,948																
66		Proceso de Contratación (LPI)	jue 31/10/19	mié 15/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
67		Ejecución de Obras	jue 16/04/20	mié 21/12/22	\$0	\$0	\$1,200,623	\$2,328,042	\$0	\$3,528,665																
68		Entrega Definitiva	jue 22/12/22	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$0	\$658,283	\$0	\$658,283																
69		Supervisión de obras otros proyectos en Sucre y Potosí	jue 03/10/19	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$73,000	\$146,211	\$0	\$219,211																
70		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	jue 03/10/19	mié 18/03/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
71		Ejecución del Servicio	jue 19/03/20	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$73,000	\$146,211	\$0	\$219,211																
72		Gestión Social de apoyo a los proyectos del Componente 1	mié 03/10/18	mar 17/01/23	\$82,745	\$330,980	\$330,980	\$330,979	\$0	\$1,075,684																
73		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
74		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 17/01/23	\$82,745	\$330,980	\$330,980	\$330,979	\$0	\$1,075,684																
75		Componente II. Gestion de la oferta y la demanda	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$209,000	\$5,139,000	\$2,714,000	\$3,428,000	\$0	\$11,490,000																
76		Implementación de la Gestión de la oferta y la demanda en La Paz-El Alto	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$209,000	\$1,216,000	\$800,000	\$855,000	\$0	\$3,080,000																
77		Implementación de un SIG	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$15,000	\$60,000	\$60,000	\$15,000	\$0	\$150,000																
78		Proceso de Contratación (LPN)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
79		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$15,000	\$60,000	\$60,000	\$15,000	\$0	\$150,000																
80		Renovación de valvulas reductoras de presión	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$40,000	\$560,000	\$224,000	\$576,000	\$0	\$1,400,000																
81		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
82		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$40,000	\$560,000	\$224,000	\$576,000	\$0	\$1,400,000																
83		Macromedicion de distritos hidraulicos	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$79,000	\$296,000	\$316,000	\$89,000	\$0	\$780,000																
84		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
85		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$79,000	\$296,000	\$316,000	\$89,000	\$0	\$780,000																
86		Optimización de la Micromedición	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$75,000	\$300,000	\$200,000	\$175,000	\$0	\$750,000																
87		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
88		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$75,000	\$300,000	\$200,000	\$175,000	\$0	\$750,000																
89		Implementación de la Gestión de la oferta y la demanda en Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre.	mié 15/05/19	mar 20/07/21	\$0	\$3,923,000	\$1,914,000	\$2,573,000	\$0	\$8,410,000																
90		Proceso de Contratación	mié 15/05/19	mar 20/07/21	\$0	\$3,923,000	\$1,914,000	\$2,573,000	\$0	\$8,410,000																
91		Componente III. Estudios de Preinversion	mié 15/05/19	mar 15/06/21	\$0	\$400,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$2,000,000																
92		Elaboración de los Estudios de preinversión para otros proyectos en La Paz - El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí	mié 15/05/19	mar 11/05/21	\$0	\$380,000	\$1,520,000	\$0	\$0	\$1,900,000																

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
											S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1		
93		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 15/05/19	mar 29/10/19	\$0	\$380,000	\$1,520,000	\$0	\$0	\$1,900,000																
94		Ejecución del Servicio	mié 30/10/19	mar 11/05/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
95		Supervisión a la elaboración de los estudios de preinversión para otros proyectos en La Paz - El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosi	mié 05/06/19	mar 15/06/21	\$0	\$20,000	\$80,000	\$0	\$0	\$100,000																
96		Proceso de Contratación (SCC)	mié 05/06/19	mar 24/09/19	\$0	\$20,000	\$80,000	\$0	\$0	\$100,000																
97		Ejecución del Servicio	mié 25/09/19	mar 15/06/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
98		Componente IV. Gestión de los recursos hídricos y manejo de sequías	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$377,144	\$714,288	\$489,715	\$928,852	\$2,509,999																
99		Apoyo para el desarrollo y capacitación para el modelado hidrológico y el desarrollo de balances hídricos a nivel nacional priorizando las cuencas que sirven a las 5 ciudades beneficiarias del Programa y del desarrollo de planes de seguridad hídrica.Elabo	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$152,856	\$285,718	\$200,000	\$361,426	\$1,000,000																
100		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
101		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$152,856	\$285,718	\$200,000	\$361,426	\$1,000,000																
102		Implementación de Planes de sequías	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$152,859	\$285,714	\$215,000	\$356,426	\$1,009,999																
103		Proceso de Contratación (LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
104		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$152,859	\$285,714	\$215,000	\$356,426	\$1,009,999																
105		Monitoreo y mejora de disponibilidad de información	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$71,429	\$142,856	\$74,715	\$211,000	\$500,000																
106		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
107		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$71,429	\$142,856	\$74,715	\$211,000	\$500,000																
108		Monitoreo, Evaluación y Auditoria	mié 08/08/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	\$250,000	\$500,000																
109		Auditoria Contable	mié 08/08/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000																
110		Proceso de contratación (SBCC)	mié 08/08/18	mar 30/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
111		Ejecución Auditoria	mié 31/10/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000																
112		Evaluación Intermedia	vie 17/04/20	jue 22/10/20	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000																
113		Contratación de consultor individual (CCIN)	vie 17/04/20	jue 18/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
114		Ejecución de la consultoria	vie 19/06/20	jue 22/10/20	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000																
115		Evaluación Final	vie 18/03/22	jue 16/02/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$200,000																
116		Contratación de Firma Supervisora (SBCC-LPI)	vie 18/03/22	jue 01/09/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																
117		Ejecución de la consultoria	vie 02/09/22	jue 16/02/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$200,000																
118		Administración	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$771,257	\$725,211	\$714,831	\$581,395	\$245,464	\$3,038,158																
119		Personal de la UCP-PAAP	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$436,872	\$423,136	\$452,756	\$439,320	\$143,389	\$1,895,473																
120		Gastos Operativos UCP-PAAP	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$334,385	\$302,075	\$262,075	\$142,075	\$102,075	\$1,142,685																

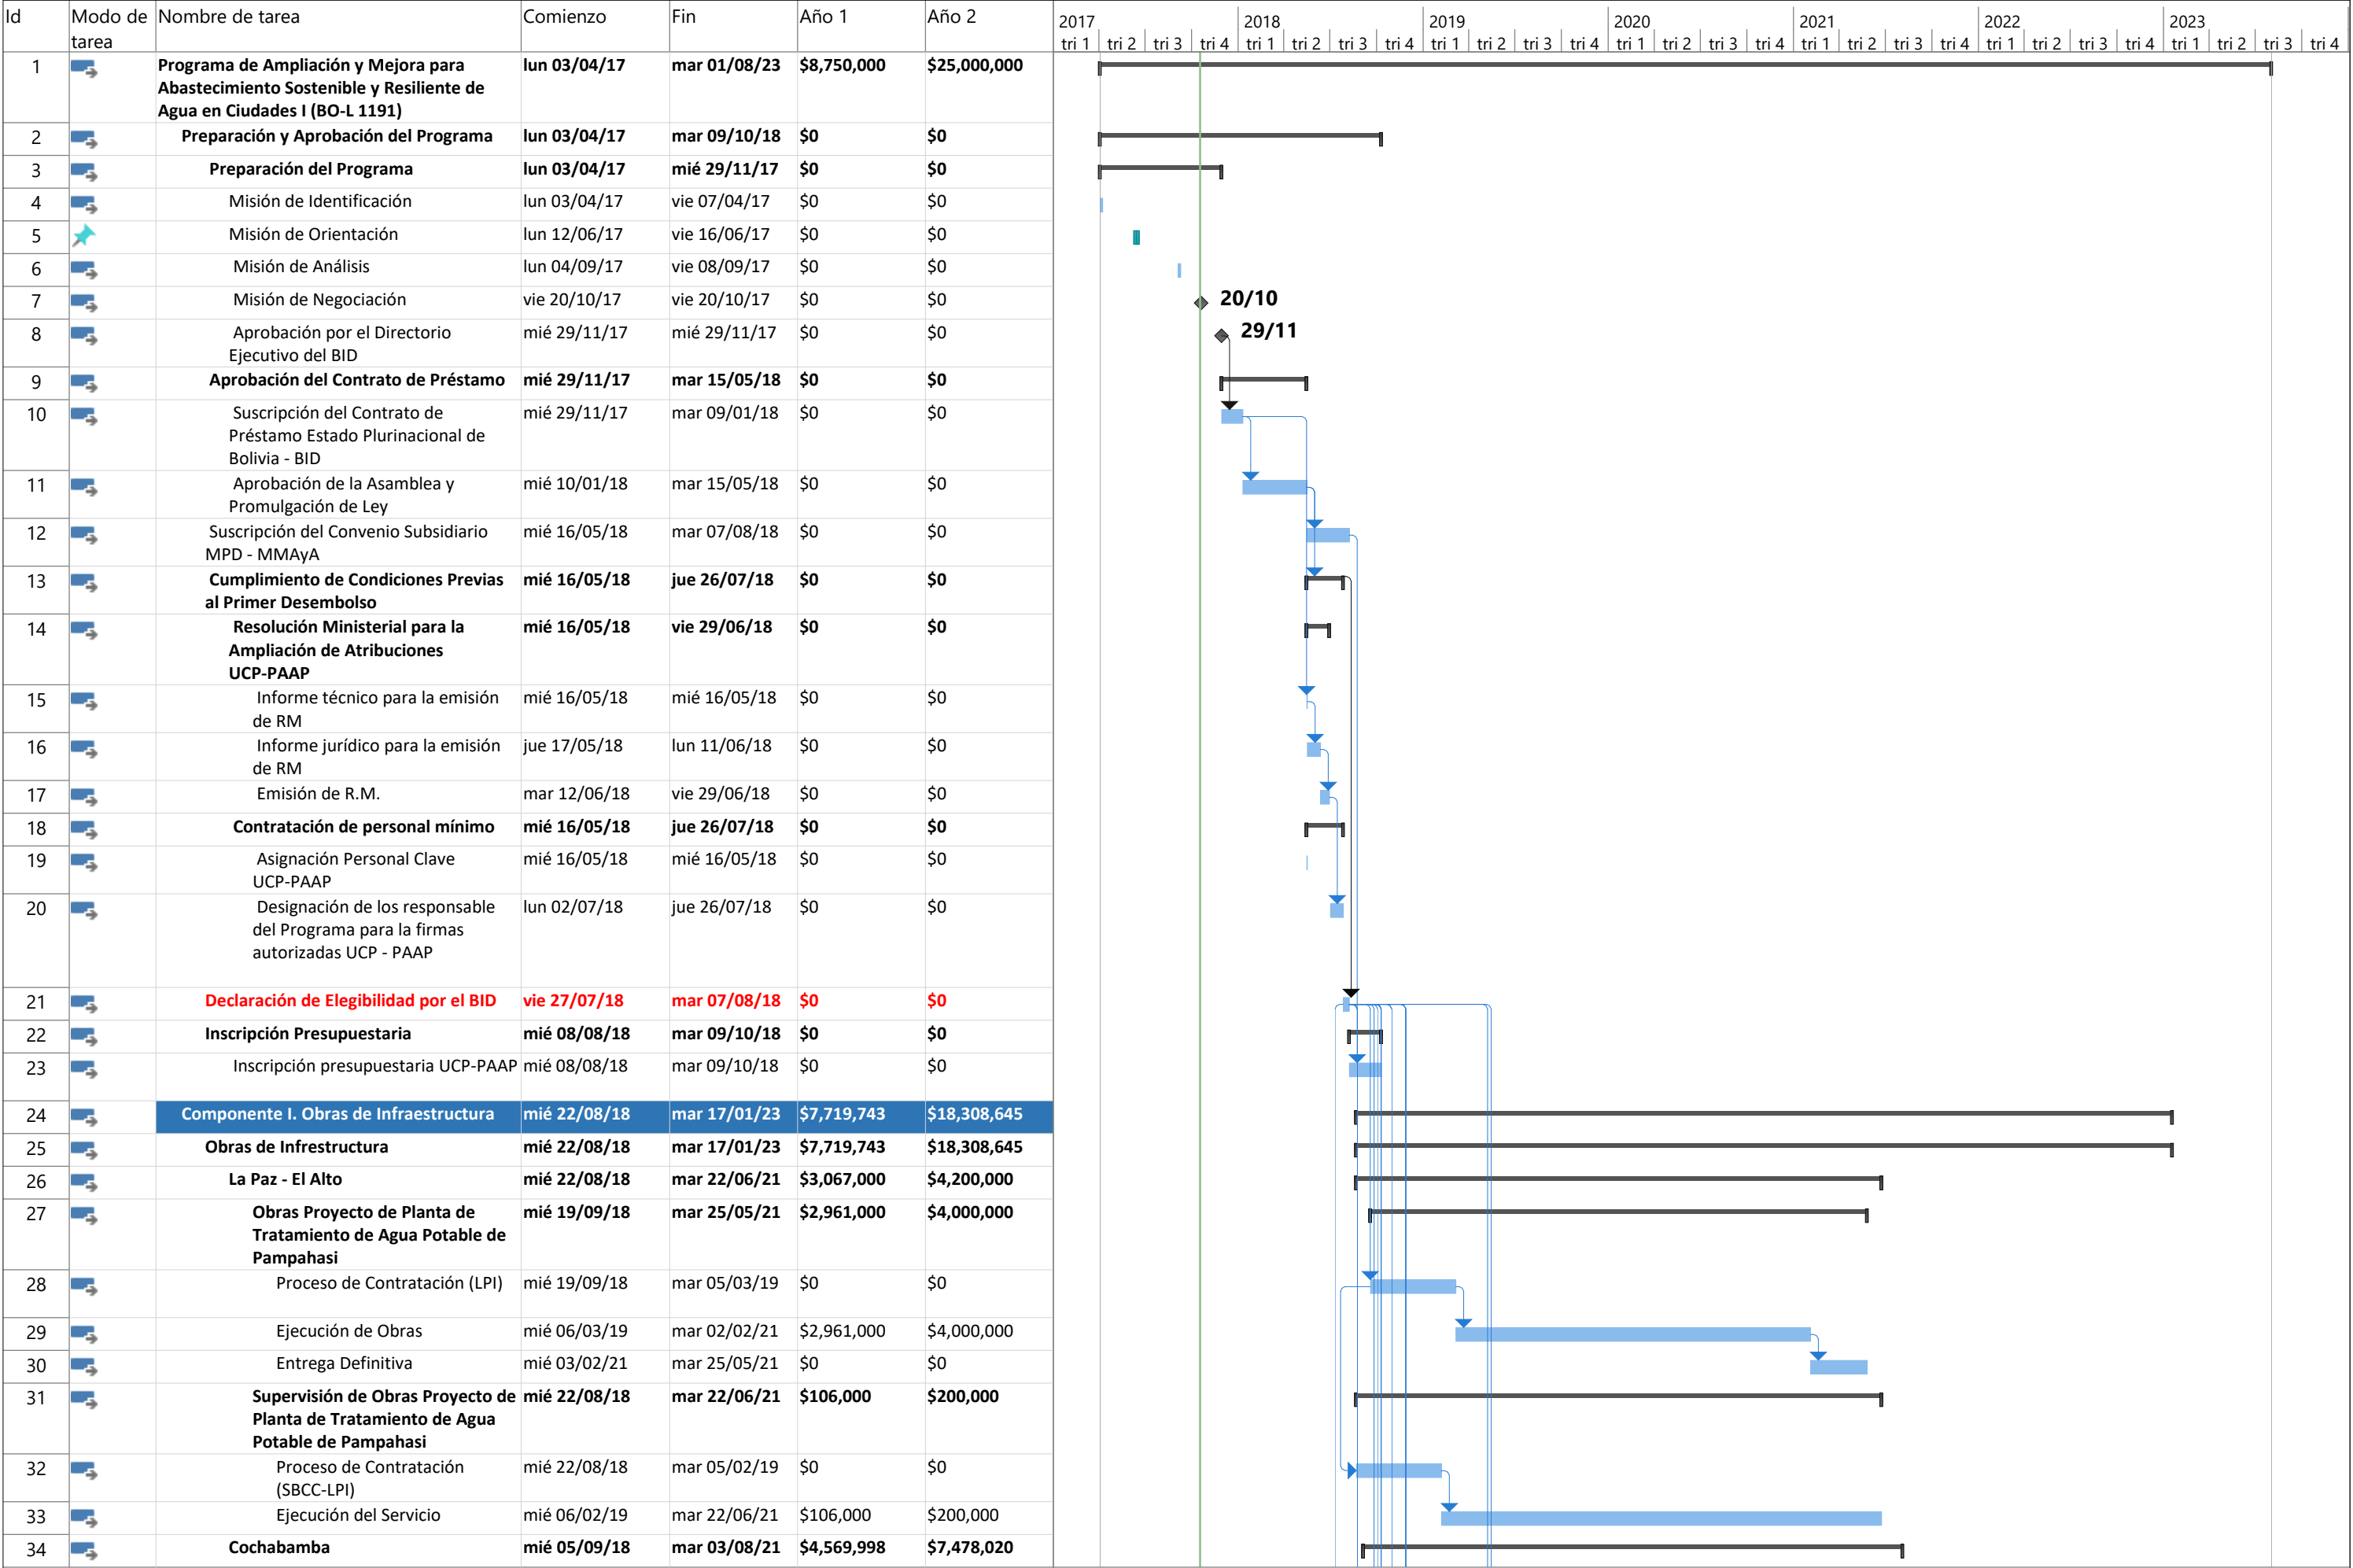



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
							tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4
35		Obras Proyecto Linea de Aduccion 5 Jove Rancho - Quillacollo	mié 03/10/18	mar 11/05/21	\$744,000	\$987,000																												
36		Proceso de Contratación (LPI)	mié 03/10/18	mar 19/02/19	\$0	\$0																												
37		Ejecución de Obras	mié 20/02/19	mar 19/01/21	\$744,000	\$987,000																												
38		Entrega Definitiva	mié 20/01/21	mar 11/05/21	\$0	\$0																												
39		Supervisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 5 Jove Rancho - Quillacollo	mié 05/09/18	mar 08/06/21	\$40,000	\$60,000																												
40		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 05/09/18	mar 22/01/19	\$0	\$0																												
41		Ejecución del Servicio	mié 23/01/19	mar 08/06/21	\$40,000	\$60,000																												
42		Obras Proyecto Linea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe	vie 05/10/18	jue 26/11/20	\$1,102,743	\$2,790,000																												
43		Proceso de Contratación (LPI)	vie 05/10/18	jue 21/03/19	\$0	\$0																												
44		Ejecución de Obras	vie 22/03/19	jue 06/08/20	\$1,102,743	\$2,790,000																												
45		Entrega Definitiva	vie 07/08/20	jue 26/11/20	\$0	\$0																												
46		Supervisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe	vie 07/09/18	jue 24/12/20	\$218,000	\$150,000																												
47		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	vie 07/09/18	jue 21/02/19	\$0	\$0																												
48		Ejecución del Servicio	vie 22/02/19	jue 24/12/20	\$218,000	\$150,000																												
49		Obras Proyecto Linea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur	mié 31/10/18	mar 06/07/21	\$2,335,255	\$3,296,020																												
50		Proceso de Contratación (LPI)	mié 31/10/18	mar 16/04/19	\$0	\$0																												
51		Ejecución de Obras	mié 17/04/19	mar 16/03/21	\$2,335,255	\$3,296,020																												
52		Entrega Definitiva	mié 17/03/21	mar 06/07/21	\$0	\$0																												
53		Surpevisión de Obras Proyecto Linea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur	mié 03/10/18	mar 03/08/21	\$130,000	\$195,000																												
54		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0																												
55		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 03/08/21	\$130,000	\$195,000																												
56		Oruro	mié 03/10/18	mar 12/10/21	\$0	\$6,299,645																												
57		Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de oruro APRAUR en la ciudad de Oruro	mié 31/10/18	mar 14/09/21	\$0	\$6,063,645																												
58		Proceso de Contratación (LPI)	mié 31/10/18	mar 16/04/19	\$0	\$0																												
59		Ejecución de Obras	mié 17/04/19	mar 25/05/21	\$0	\$6,063,645																												
60		Entrega Definitiva	mié 26/05/21	mar 14/09/21	\$0	\$0																												

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
							tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4
61		Supervisión de Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de oruro APRAUR en la ciudad de Oruro	mié 03/10/18	mar 12/10/21	\$0	\$236,000																												
62		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0																												
63		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 12/10/21	\$0	\$236,000																												
64		Gestión Social de apoyo a los proyectos del Componente 1	mié 03/10/18	mar 17/01/23	\$82,745	\$330,980																												
65		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 03/10/18	mar 19/03/19	\$0	\$0																												
66		Ejecución del Servicio	mié 20/03/19	mar 17/01/23	\$82,745	\$330,980																												
67		Componente II. Gestion de la oferta y la demanda	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$209,000	\$5,139,000																												
68		Implementación de la Gestión de la oferta y la demanda en La Paz-El Alto	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$209,000	\$1,216,000																												
69		Implementación de un SIG	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$15,000	\$60,000																												
70		Proceso de Contratación (LPN)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0																												
71		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$15,000	\$60,000																												
72		Renovación de valvulas reductoras de presión	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$40,000	\$560,000																												
73		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0																												
74		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$40,000	\$560,000																												
75		Macromedicion de distritos hidraulicos	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$79,000	\$296,000																												
76		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0																												
77		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$79,000	\$296,000																												
78		Optimización de la Micromedición	mié 17/10/18	mar 20/07/21	\$75,000	\$300,000																												
79		Proceso de Contratación (LPI)	mié 17/10/18	mar 02/04/19	\$0	\$0																												
80		Ejecución del Servicio	mié 03/04/19	mar 20/07/21	\$75,000	\$300,000																												
81		Implementación de la Gestión de la oferta y la demanda en Cochabamba, Oruro, Potosi y Sucre.	mié 15/05/19	mar 20/07/21	\$0	\$3,923,000																												
82		Proceso de Contratación	mié 15/05/19	mar 20/07/21	\$0	\$3,923,000																												
83		Componente III. Estudios de Preinversion	mié 15/05/19	mar 15/06/21	\$0	\$400,000																												
84		Elaboración de los Estudios de preinversión para otros proyectos en La Paz - El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosi	mié 15/05/19	mar 11/05/21	\$0	\$380,000																												
85		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 15/05/19	mar 29/10/19	\$0	\$380,000																												
86		Ejecución del Servicio	mié 30/10/19	mar 11/05/21	\$0	\$0																												
87		Supervisión a la elaboración de los estudios de preinversión para otros proyectos en La Paz - El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosi	mié 05/06/19	mar 15/06/21	\$0	\$20,000																												
88		Proceso de Contratación (SCC)	mié 05/06/19	mar 24/09/19	\$0	\$20,000																												
89		Ejecución del Servicio	mié 25/09/19	mar 15/06/21	\$0	\$0																												
90		Componente IV. Gestión de los recursos hídricos y manejo de sequias	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$377,144																												

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
							tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4
91		Apoyo para el desarrollo y capacitación para el modelado hidrológico y el desarrollo de balances hídricos a nivel nacional priorizando las cuencas que sirven a las 5 ciudades beneficiarias del Programa y del desarrollo de planes de seguridad hídrica.Elabo	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$152,856																												
92		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0																												
93		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$152,856																												
94		Implementación de Planes de sequias	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$152,859																												
95		Proceso de Contratación (LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0																												
96		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$152,859																												
97		Monitoreo y mejora de disponibilidad de información	mié 28/11/18	mar 20/12/22	\$0	\$71,429																												
98		Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mié 28/11/18	mar 14/05/19	\$0	\$0																												
99		Ejecución del Servicio	mié 15/05/19	mar 20/12/22	\$0	\$71,429																												
100		Monitoreo, Evaluación y Auditoria	mié 08/08/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000																												
101		Auditoria Contable	mié 08/08/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000																												
102		Proceso de contratación (SBCC)	mié 08/08/18	mar 30/10/18	\$0	\$0																												
103		Ejecución Auditoria	mié 31/10/18	lun 31/07/23	\$50,000	\$50,000																												
104		Administración	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$771,257	\$725,211																												
105		Personal de la UCP-PAAP	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$436,872	\$423,136																												
106		Gastos Operativos UCP-PAAP	mié 08/08/18	mar 01/08/23	\$334,385	\$302,075																												
