
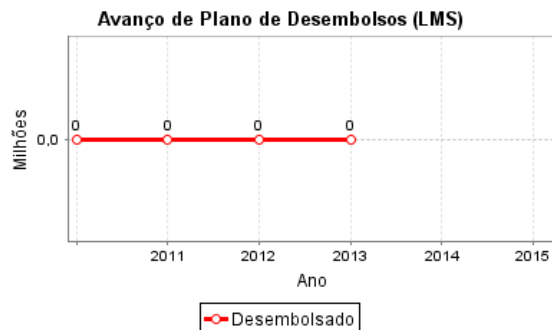


## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
Sector: TRANSPORT		
Número da Operação: 2470/BL-HO	Atual: 135.000.000,00	Original BID: 135.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 135.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada: HO-T1078, HO-T1115, HO-P1061, RG-P1400	Saldo: 135.000.000,00	Cofinanciamento/País: 415.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 135.415.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 16-abr-2013

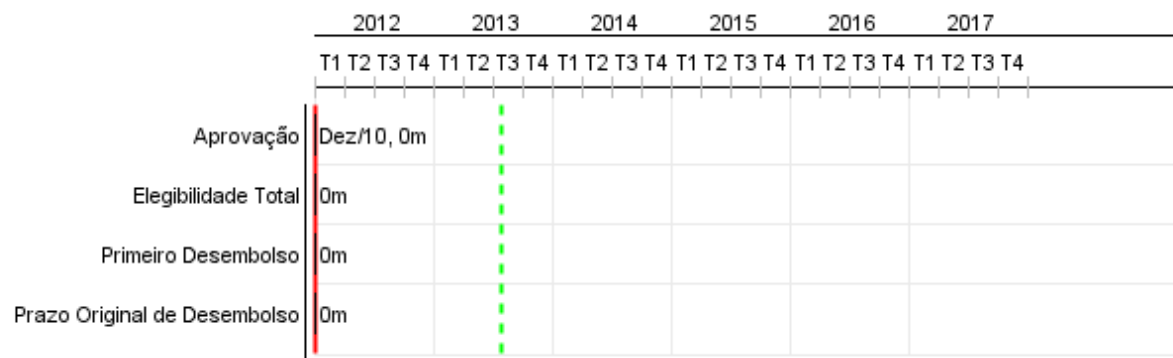

## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Productividad en la transferencia de contenedores en el muelle incrementada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Movimientos por buque y hora de atraque	mov/buque/hora	30,00	2008	P A	50,00

<b>Resultado:</b>	Estancia en puerto para los buques reducida
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tiempo de espera respecto de tiempo de atraque (Te/Ta) para buques portacontenedores Lo-Lo	Te/Ta	35,00	2008	P A	1,00
Tiempo de espera respecto de tiempo de atraque (Te/Ta) para buques graneleros y otros buques	Te/Ta	52,00	2008	P A	0,07

<b>Resultado:</b>	Mejorada la capacidad en gestión portuaria
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Personal contratado y capacitado para puestos clave	porcentaje		2008	P A	100,00
Sistema de mantenimiento preventivo implantado	porcentaje		2008	P A	100,00
Programa y planes de seguridad implantados	porcentaje		2008	P A	100,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1. Ingeniería y Administración</b>									
Gerencia de Proyecto realizada	Gerencia				0,75				4.200.000,00
Auditoria financiera realizada	informes				4,00				500.000,00
<b>Componente 2: Obras civiles y supervisión</b>									
Dragado y relleno del proyecto de expansión realizado	obra				1,00				35.750.000,00
Terminal de contenedores construida	terminal				1,00				108.975.000,00
<b>Componente 3: Adquisición de Equipo</b>									
Equipamiento Terminal de Contenedores adquirido	Proyectos				1,00				67.500.000,00
<b>Componente 4: Fortalecimiento Institucional</b>									
Unidades de Mantenimiento Ambiental fortalecidas	Unidad				1,00				1.000.000,00
Unidades de Planificacion Portuaria y Comercializacion fortalecidas	Unidad				2,00				500.000,00
Plan de Gestión Ambiental, Social y H&S implementado	plan				1,00				400.000,00
Programa de Seguridad y Ambiental elaborado	programa				1,00				250.000,00
Estudio tarifario elaborado	estudio				1,00				250.000,00
<b>Imprevistos</b>									
IMPREVISTOS	N/A								3.800.000,00
<b>Gastos Financieros</b>									
Gastos Financieros	N/A								2.290.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>225.415.000,00</b>
