
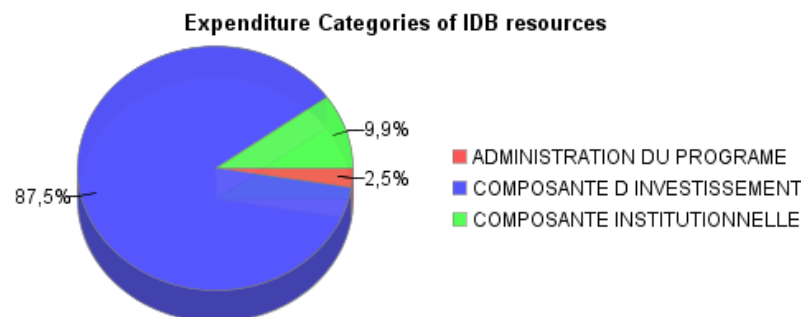
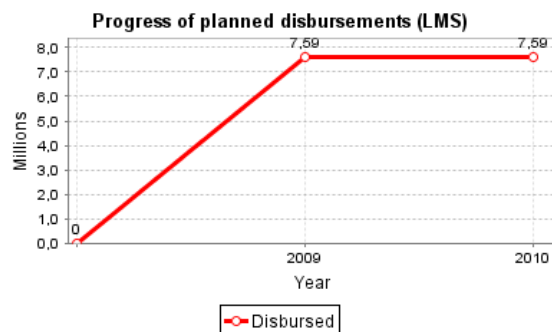



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS				
Sector:	TRANSPORTATION-RURAL ROADS				
Loan Number(s):	991/SF-HA;2379/GR-HA	Current Approved Amount:	50.034.669,99	Original IDB:	50.251.737,53
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	49.817.602,45	Current IDB:	50.034.669,99
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	99,57	Pari-passu:	96,53
Related Operation(s):	TC8803307, HA-L1046	Balance:	217.067,54	Co-Financing/Country:	1.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	51.251.737,53
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	B	(X) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 31, 2011 Validated by Country Representative: Apr 27, 2011

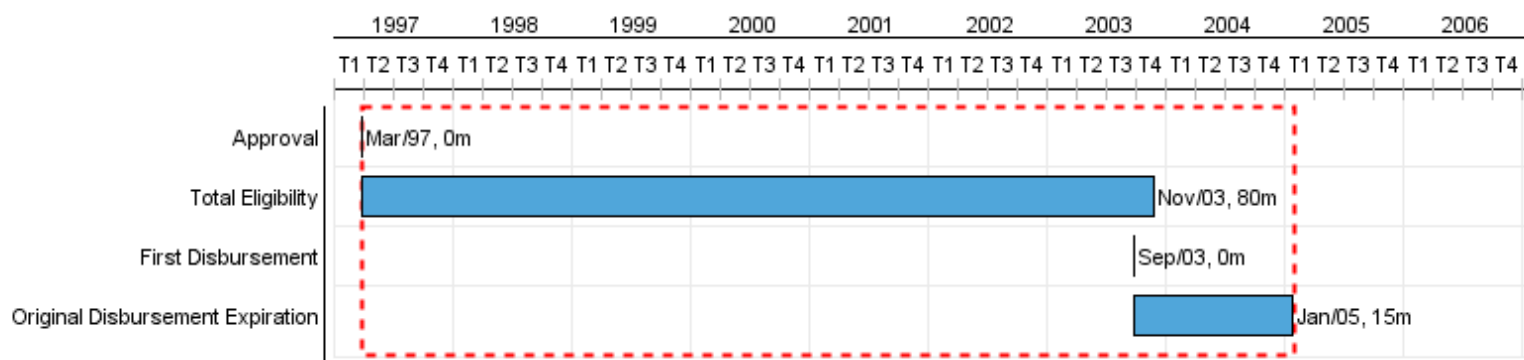

Accumulated Progress as of 2010

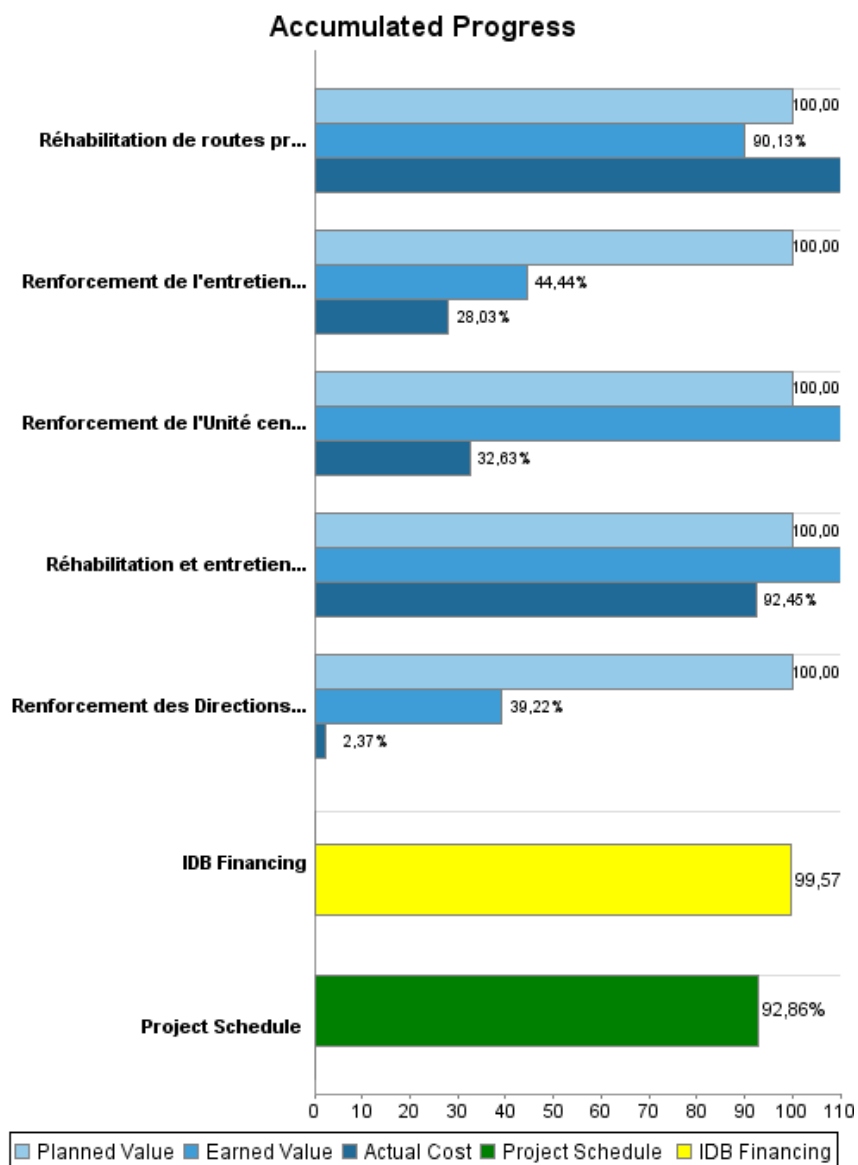

Outcomes

Outcome:	L'accès aux régions productrices du pays et le transport de la production économique aux centres d'exportation et de consommation est facilité
Suppositions:	Les travaux sur le réseau routier primaire sont priorisés

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	End of project
Temps de parcours sur routes réhabilitées	Pourcentage (%) de réduction des temps de parcours		2004	P A			50,00
Débit journalier moyen des routes réhabilitées	Pourcentage (%) d'augmentation de véhicules/jour		2004	P A			20,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Composante institutionnelle									
Renforcement des Directions départementales du MPTC par l'embauche de consultants en développement communautaire et d'ingénieurs en suivi de travaux	Consultants/ ingénieurs embauchés	3,00	4,00		9,00	500.000,00	40.226,00		1.700.000,00
Renforcement de l'Unité centrale d'exécution par l'embauche de consultants techniques et institutionnels	Consultants embauchés	1,00	7,00		2,00	500.000,00	489.478,00		1.500.000,00
Renforcement de l'entretien routier avec les intervenants locaux	Contrats d'entretien signés	9,00	8,00		18,00	300.000,00	168.194,00		600.000,00
Composante d'investissement									
Réhabilitation de routes primaires	Nombre de kilomètres réhabilités	20,00	51,00		116,00	8.200.000,00	28.237.235,00		23.200.000,00
Réhabilitation et entretien de routes secondaires et tertiaires	Nombre de kilomètres de routes réhabilitées et entretenues	25,00	197,00		250,00	7.600.000,00	14.422.939,00		15.600.000,00
Composante administrative									
Composante financière									
TOTAL						17.100.000,00	43.358.072,00		42.600.000,00
