
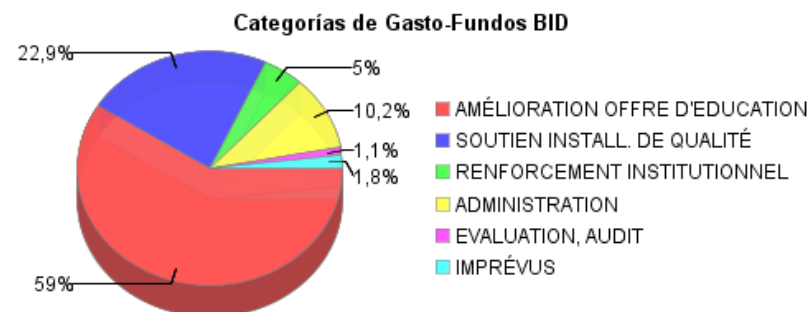
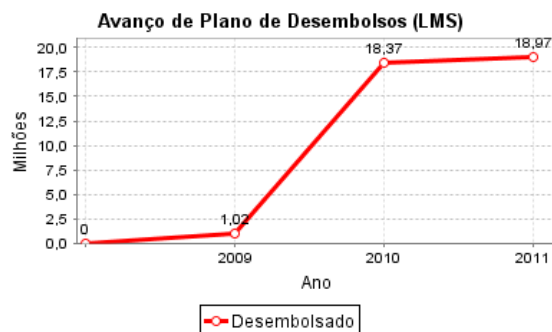



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y SOCIAL		
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número da Operação:	2153/GR-HA	Atual:	20.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	20.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00
Operação Relacionada:		Saldo:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	20.500.000,00
		Corrente BID:	20.500.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Cofinanciamento/País:	
		Original Estimado:	20.500.000,00
		Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 21, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 23, 2011

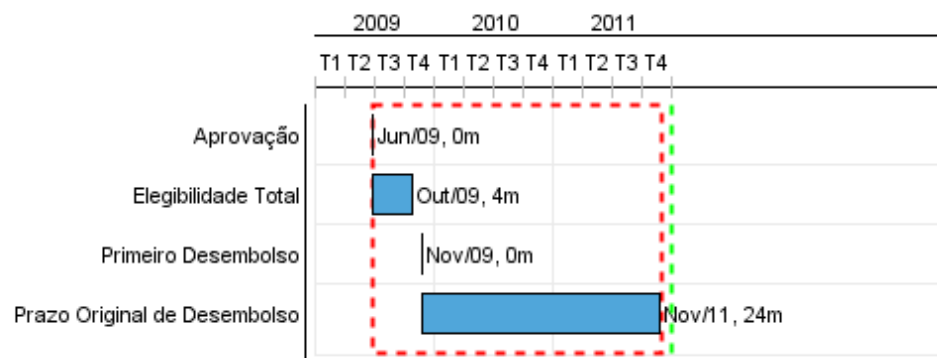

Progresso Acumulado até 2011

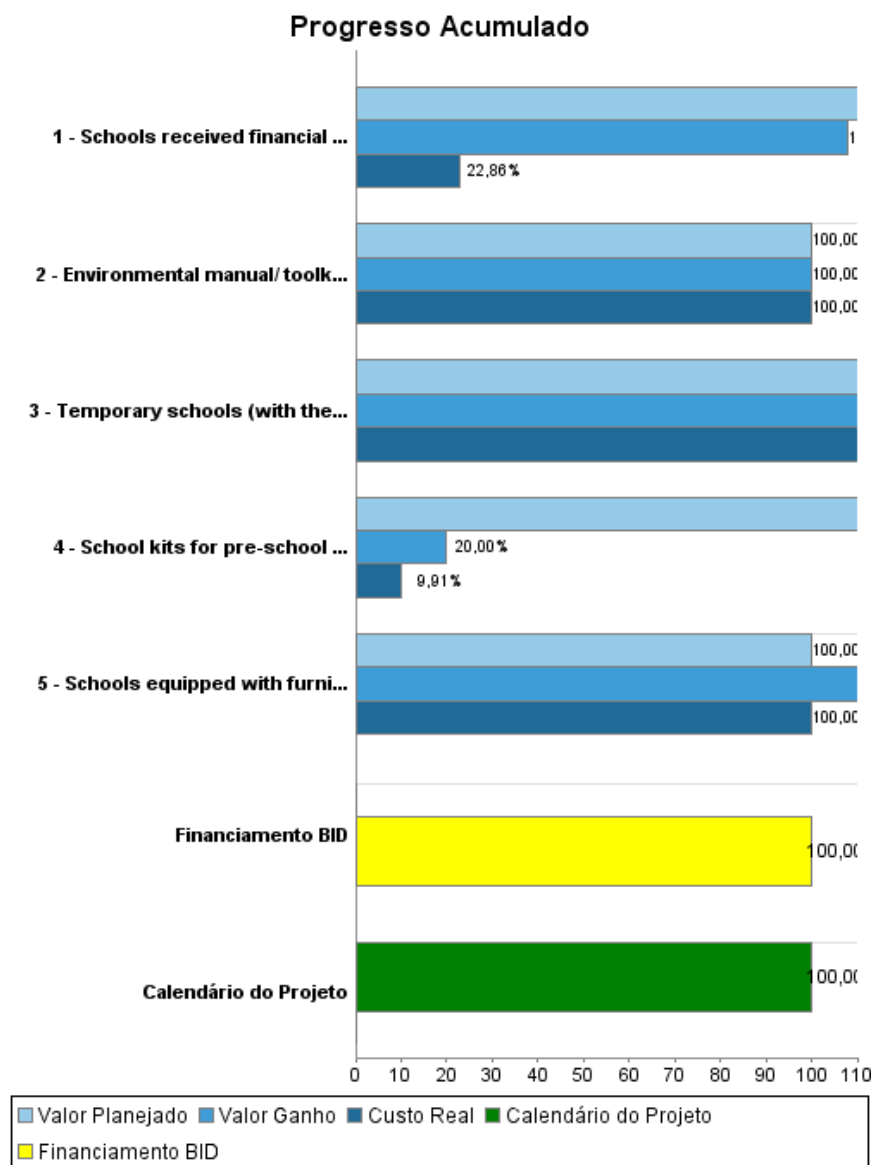

Resultados

Resultado:	Public education supply improved.
Suposições:	Transparent use of resources.
Observações:	None

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Children from schools affected by the earthquake are back to school using secured structures	Students		2010	P A	65.000,00
Schools damaged by the earthquake that reopened with secured structures.	Percentage of Schools		2010	P A	1,05

Resultado:	Quality of school facilities improved.
Suposições:	Transparent use of resources.
Observações:	None

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Schools damaged by the earthquake fully equipped with quality materials and furniture	Percentage of schools		2010	P A	1,05

Resultado:	MENFP's building capacities strengthened
Suposições:	Transparen use of resources
Observações:	None

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
New and approved environmental codes for building schools have been considered in the financing of new school constructions.	Percent completion of Document		2010	P A	100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Improvement of public education supply									
Temporary schools (with the capability of double shifts) build and operational in selected sites by the end of the project.	Temporary schools				50,00	1.452.591,00			8.000.000,00
Support to quality facilities									
Schools equipped with furniture and school materials by the end of the project.	Schools				50,00				2.617.500,00
School kits for pre-school and secondary education children distributed and in use by the end of the project.	school kits	80.000,00			100.000,00	817.590,00			3.682.500,00
FAES institutional development									
Schools received financial support by the end of the project	Schools	800,00			1.909,00	2.024.317,00			3.000.000,00
Environmental manual/ toolkit to guide future school construction developed and approved.	Manual				1,00				290.018,00
Administration									
Evaluation									
Contingency									
TOTAL						4.294.498,00			17.590.018,00
