

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA COORDINACION EJECUTIVA DE PRESIDENCIA
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1409/OC-GU
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: GOM - Operación Global de Obras Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 43.408.349,28
Monto Desembolsado a la fecha: 37.348.991,26
% Desembolsado: 86,04
Saldo: 6.059.358,02

Costo total y Fuente

BID Original: 46.800.000,00
Actual BID: 43.408.349,28
Pari-passu: 90,00
Co-financiamiento/País: 5.200.000,00
Estimado Original: 52.000.000,00
Período de Amortización (meses): 240

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011
Validado por Representante de País: Sep 28, 2011

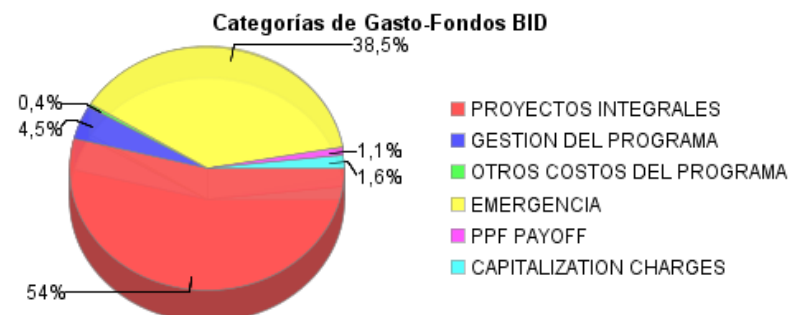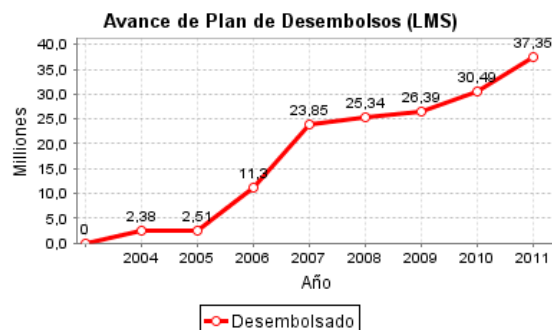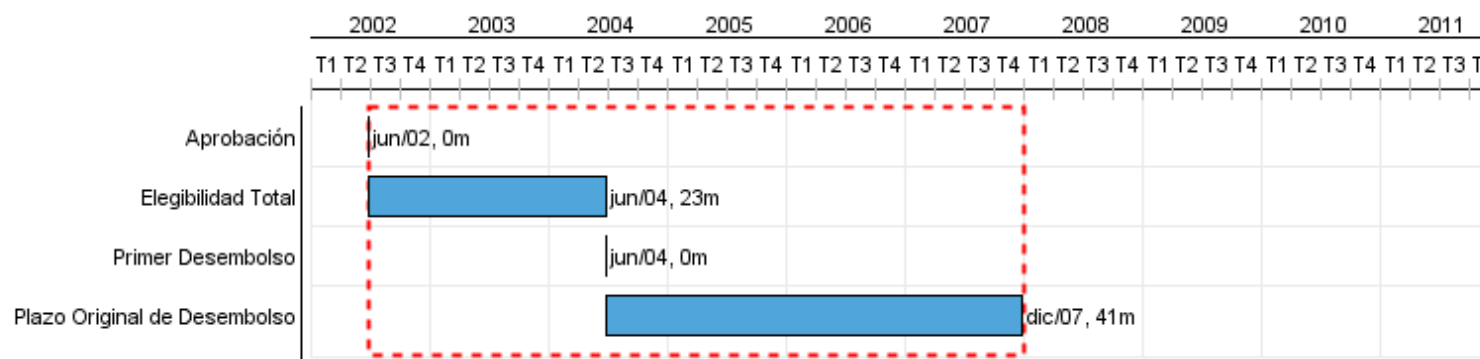

Progreso Acumulado al 2011

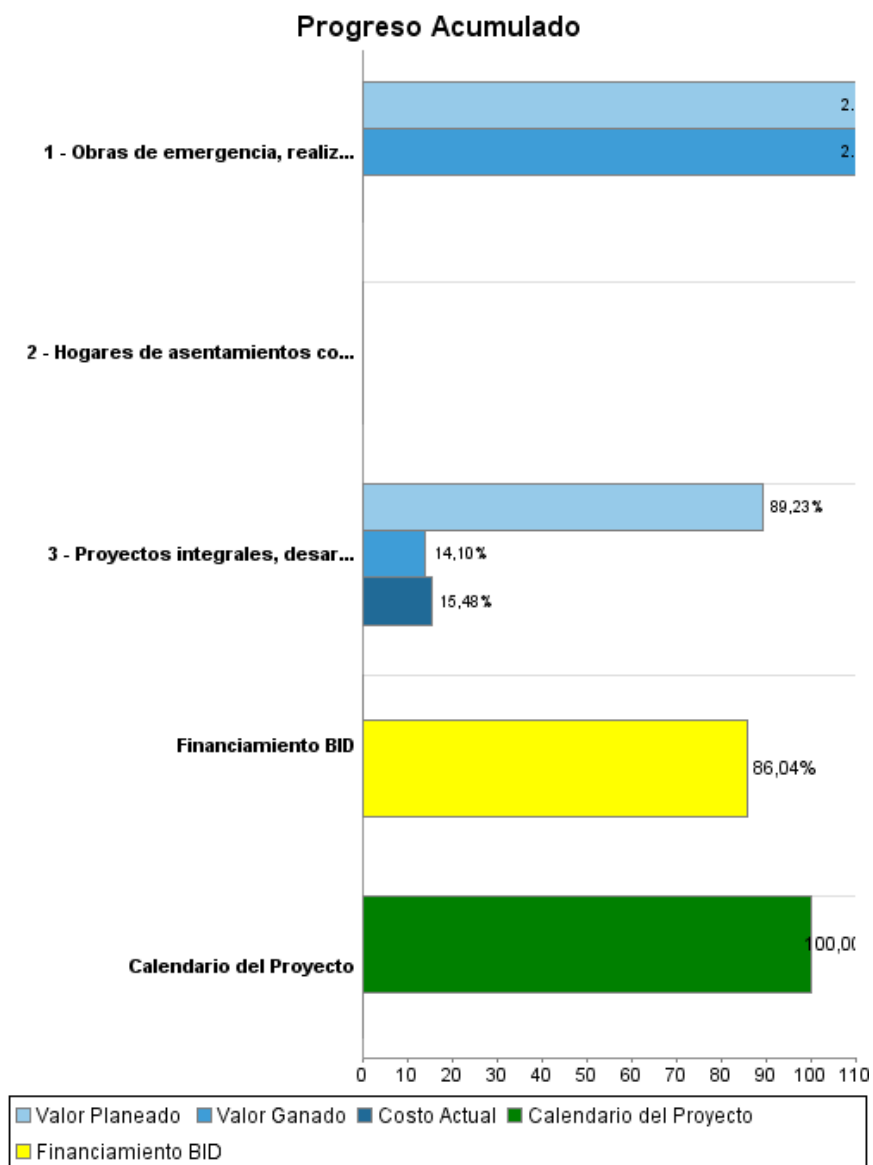

Resultados

Resultado: Calidad de vida de los habitantes de asentamientos en 3 municipalidades, mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2009	Fin de Proyecto
Hogares con condiciones sanitarias en los asentamientos del Programa, mejoradas	Hogares	3.600,00	2000	P		85,00	3.400,00
				A	45,00		
Hogares con prácticas de higiene (lavado de alimentos, disposición apropiada de residuos, entre otros), mejoradas.	Hogares	4.000,00	2000	P			2.720,00
				A			
Hogares con accesibilidad a asentamientos y viviendas, mejorada	Hogares	4.000,00	2010	P			2.720,00
				A			

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Emergencia									
Obras de emergencia, realizadas.	obras	21,00	21,00		21,00	385.836,28			16.761,00
Proyectos Integrales, desarrollados									
Proyectos integrales, desarrollados (Infraestructura Fisica)	Obras	22,00	3,00		26,00	9.939.441,16	1.586.535,99		16.913.846,43
Hogares de asentamientos con red de agua potable instalada	Hogares				1,00				745.294,91
Gestion del Programa									
TOTAL						10.325.277,44	1.586.535,99		17.675.902,34
