
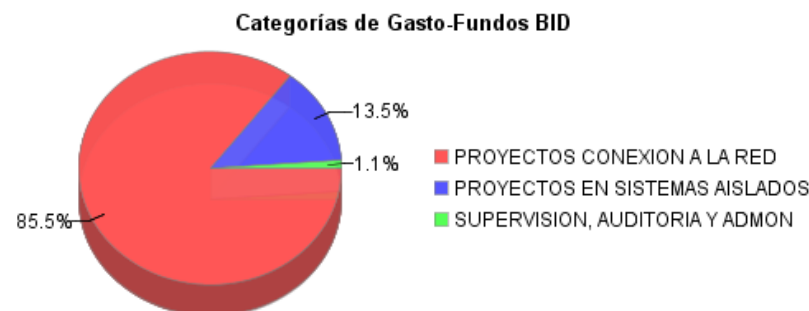
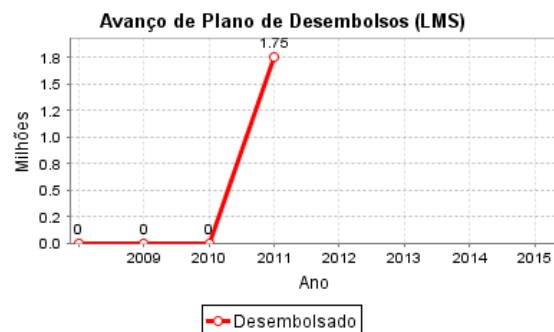



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		
Sector: ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Número da Operação: 2033/OC-GU	Atual: 55.000.000,00	Original BID: 55.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.016.064,30	Corrente BID: 55.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 5,48	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: GU-P1043, GU-T1120	Saldo: 51.983.935,70	Cofinanciamento/País: 150.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 55.150.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012

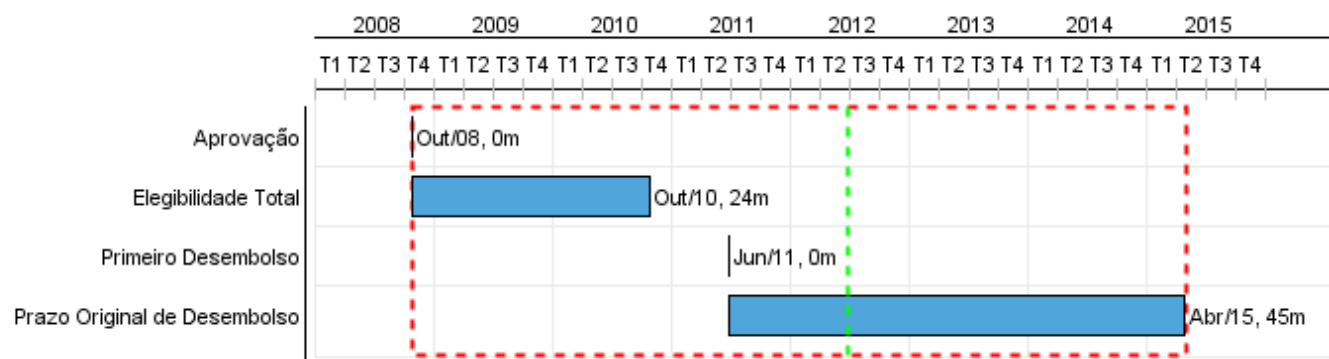

Progresso Acumulado até 2011

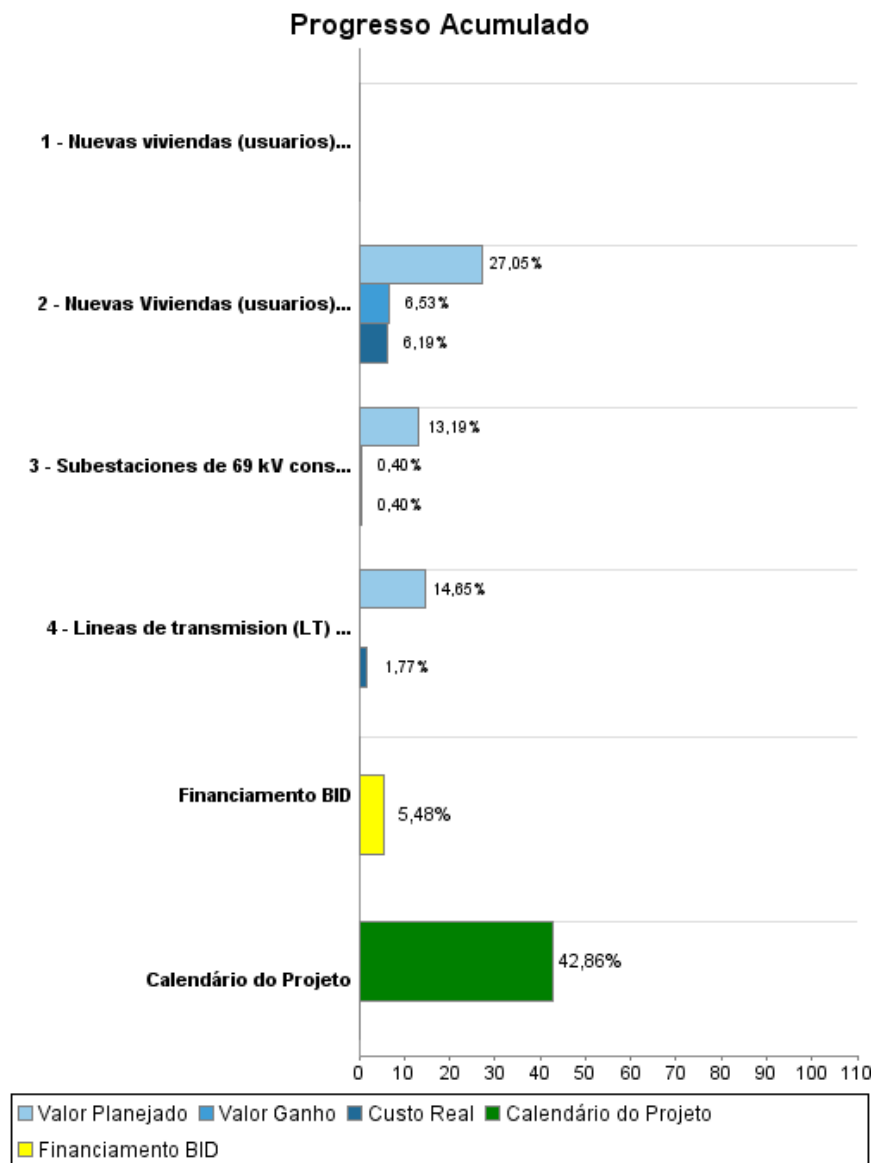

Resultados

Resultado:	Cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Cobertura de electrificación rural a nivel nacional	Porcentaje	82.60	2007	P A		85,90
Cobertura de electrificación en los municipios más pobres priorizados.	Porcentaje	66.10	2007	P A		73,90

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1 - Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.									
Nuevas Viviendas (usuarios) conectadas a la red nacional	viviendas	6.267,00	1.793,00		25.751,00	5.337.351,00	1.447.428,00		23.400.000,00
Lineas de transmision (LT) del PER, construidas	Kilómetros	32,00			175,00	1.804.813,00	272.296,00		15.400.000,00
Subestaciones de 69 kV construidas	subestaciones				6,00	865.398,00	33.085,00		8.200.000,00
Componente 2 - Electrificación rural en sistemas aislados.									
Nuevas viviendas (usuarios) electrificadas en zonas aisladas	viviendas				5.000,00				7.400.000,00
Componente 3 - Apoyo a la administración del Programa y supervisión.									
TOTAL						8.007.562,00	1.752.809,00		54.400.000,00
