

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	SECRETARIA COORDINACION EJECUTIVA DE PRESIDENCIA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Número da Operação:	1409/OC-GU
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	43.408.349,28
Desembolsado:	42.927.599,26
% Desembolsado:	98,89
Saldo:	480.750,02

Custo Total e Fonte

Original BID:	46.800.000,00
Corrente BID:	43.408.349,28
Pari-passu:	90,00
Cofinanciamento/País:	5.200.000,00
Original Estimado:	52.000.000,00
Período de Amortização (meses):	240

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

C(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


27-sep-2012

Validado pelo Representante do País:

27-sep-2012

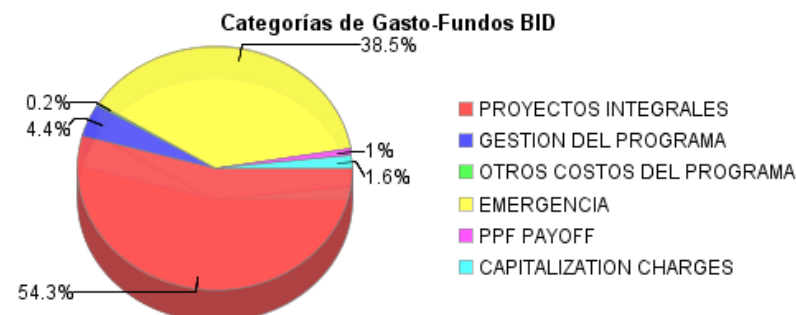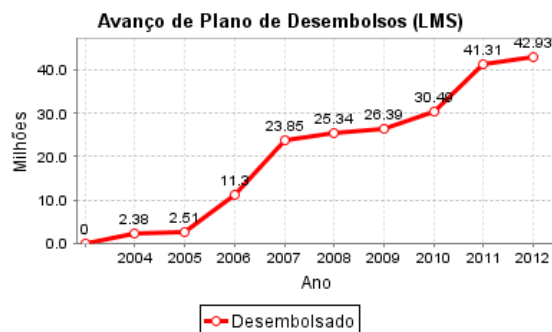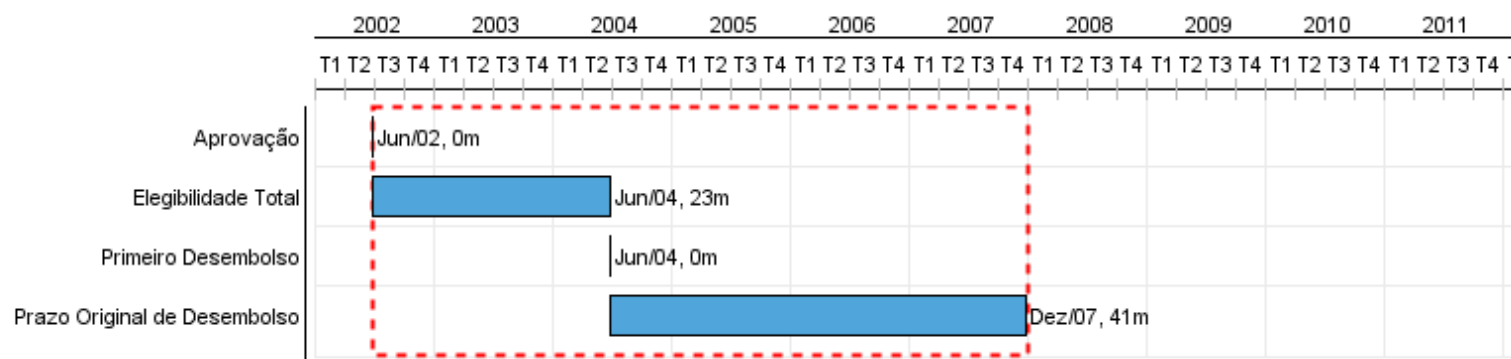

Progresso Acumulado até 2012

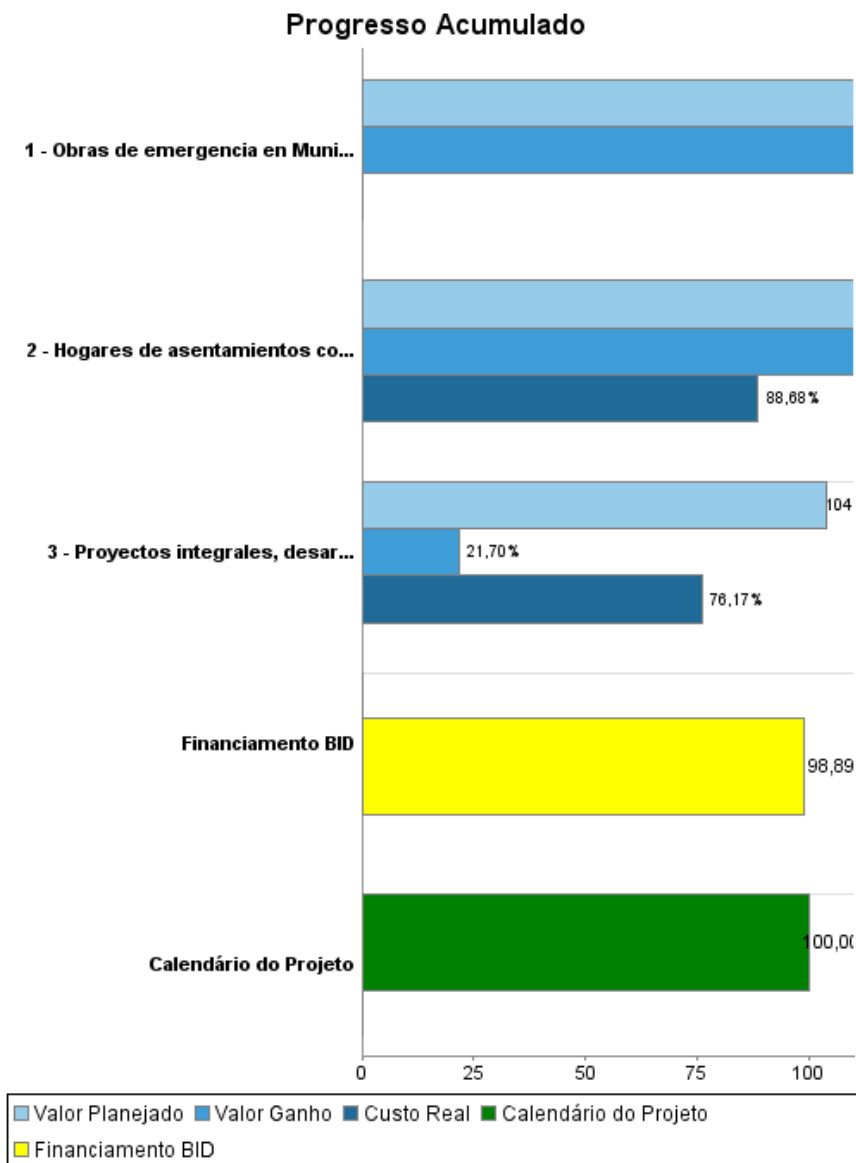

Resultados

Resultado: Calidad de vida de los habitantes de asentamientos en 3 municipalidades, mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2009	Final do Projeto
Hogares con condiciones sanitarias en los asentamientos del Programa, mejoradas	Hogares	3,600.00	2000	P		85.00	3,400.00
				A	45.00		
Hogares con prácticas de higiene (lavado de alimentos, disposición apropiada de residuos, entre otros), mejoradas.	Hogares	4,000.00	2000	P			2,720.00
				A			
Hogares con accesibilidad a asentamientos y viviendas, mejorada	Hogares	4,000.00	2010	P			2,720.00
				A			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Emergencia									
Obras de emergencia en Municipios, realizadas	Asentamientos	21,00	21,00		21,00	100.000,00			385.836,28
Proyectos Integrales, desarrollados									
Proyectos integrales, desarrollados (Infraestructura Fisica)	Obras	18,00	6,00		22,00	2.500.000,00	1.904.607,88		16.913.846,43
Hogares de asentamientos con red de agua potable instalada	Hogares	497,00	1.660,00		1.660,00	600.000,00	100.065,00		745.294,91
Personal de Supervisión	N/A						4.712,62		1.949.968,00
Gestion del Programa									
Auditoria	N/A					1.875,00	431,59		73.360,00
Administración	N/A					5.000,00	25.781,64		411.196,80
TOTAL						3.206.875,00	2.035.598,73		20.479.502,42
