

Relatório Resumido

Dados Gerais

| | |
|-----------------------|---|
| Executor: | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |
| Sector: | ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS |
| Número da Operação: | 2016/BL-HO |
| Estágio: | Approved |
| Tipo Operação: | INV - Investimento |
| Operação Relacionada: | HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation |

Fundos Disponíveis (US\$)

| | |
|-----------------|---------------|
| Atual: | 28.550.000,00 |
| Desembolsado: | 17.269.979,90 |
| % Desembolsado: | 60,49 |
| Saldo: | 11.280.020,10 |

Custo Total e Fonte

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Original BID: | 28.550.000,00 |
| Corrente BID: | 28.550.000,00 |
| Pari-passu: | 91,00 |
| Cofinanciamento/País: | 2.760.000,00 |
| Original Estimado: | 31.310.000,00 |
| Período de Amortização (meses): | 282 |

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012
Validado pelo Representante do País: 01-oct-2012

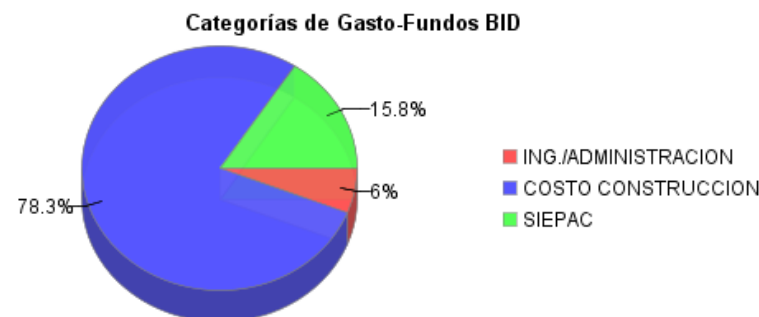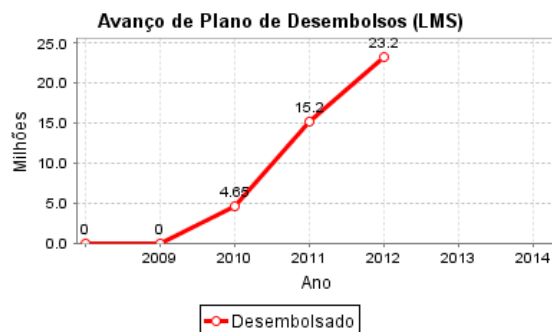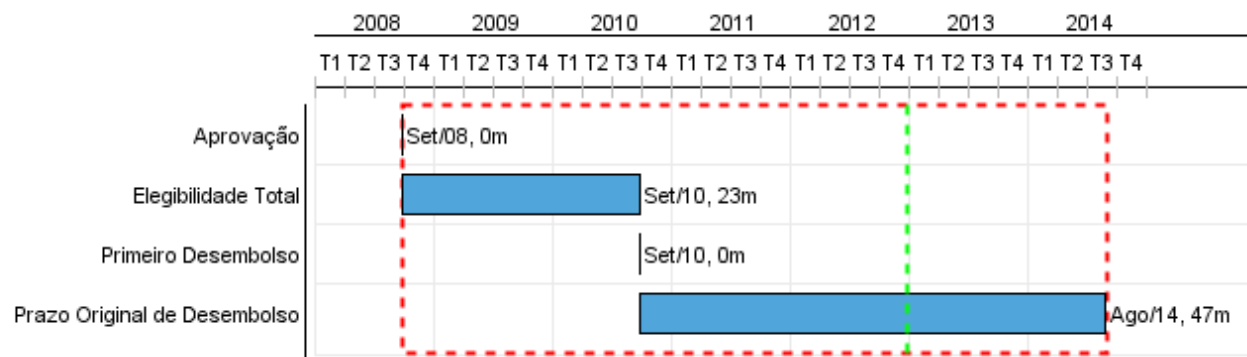

Progresso Acumulado até 2012

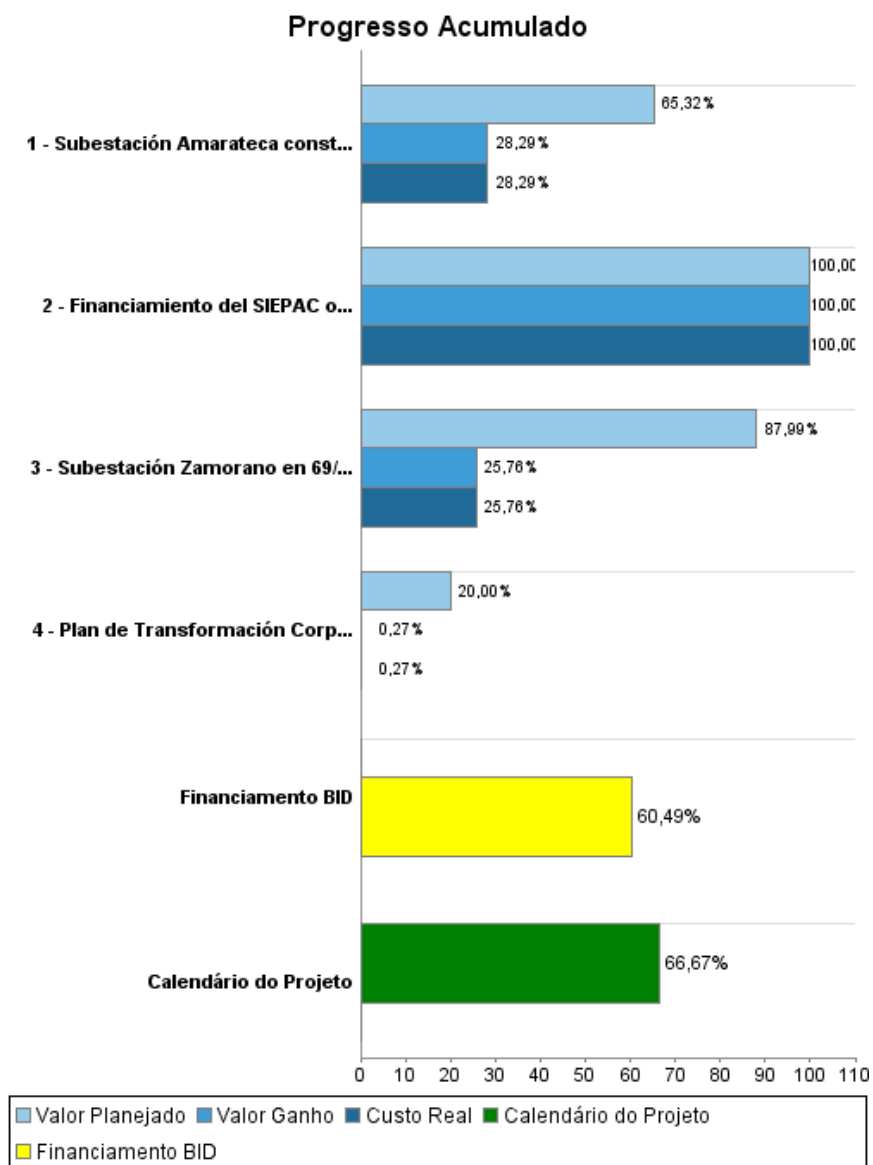

Resultados

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca | MW | | 2007 | P A | 132.10 |
| Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano | MW | 6.40 | 2007 | P A | 8.40 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica. | | | | | | | | | |
| Subestación Amarateca construida y en operación | Subestación | | | | 1,00 | 6.290.474,18 | 871.749,62 | | 20.346.000,00 |
| Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación | Subestación | | | | 1,00 | 660.000,00 | 71.970,91 | | 1.250.500,00 |
| Asesoría, supervisión de obras y Regencia Ambiental del Proyecto realizadas | N/A | | | | | 400.000,00 | 91.435,04 | | 646.000,00 |
| Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE. | | | | | | | | | |
| Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado | Plan | | | | 1,00 | 150.000,00 | 2.000,00 | | 750.000,00 |
| Financiamiento del SIEPAC otorgado | Transferencia | | | | 1,00 | | | | 4.500.000,00 |
| Gestión del Programa | | | | | | | | | |
| Gestión del Programa | N/A | | | | | 500.000,00 | 250.224,98 | | 3.858.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 8.000.474,18 | 1.287.380,55 | | 31.350.500,00 |
