

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA COORDINACION EJECUTIVA DE PRESIDENCIA  
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING  
Numéro(s) de Prêt(s): 1409/OC-GU  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s):  
Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 43.408.349,28  
Montant Décaissé à ce Jour: 42.927.599,26  
% Décaissé: 98,89  
Solde: 480.750,02

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 46.800.000,00  
Courant BID: 43.408.349,28  
Pari Passu: 90,00  
Cofinancement/Pays: 5.200.000,00  
Estimation Initiale: 52.000.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 240

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 27-sep-2012

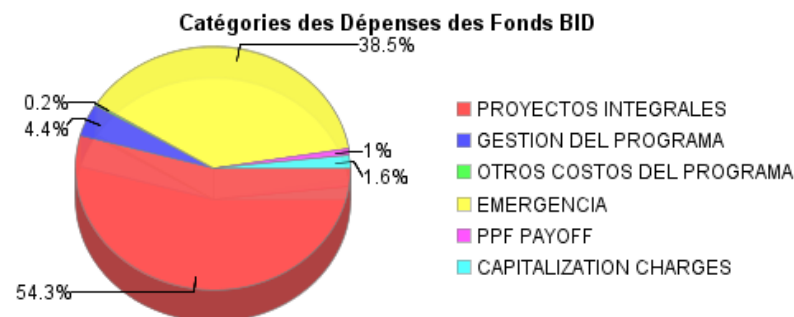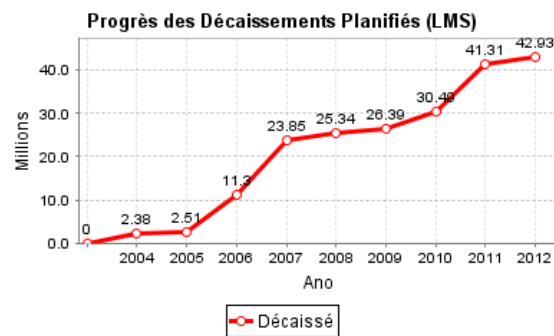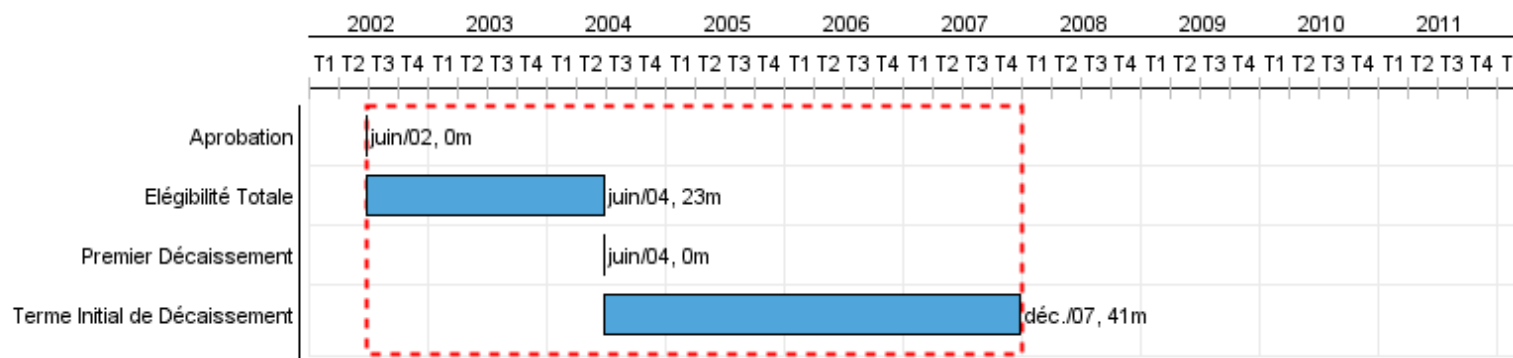

## Progrès Cumulé à 2012

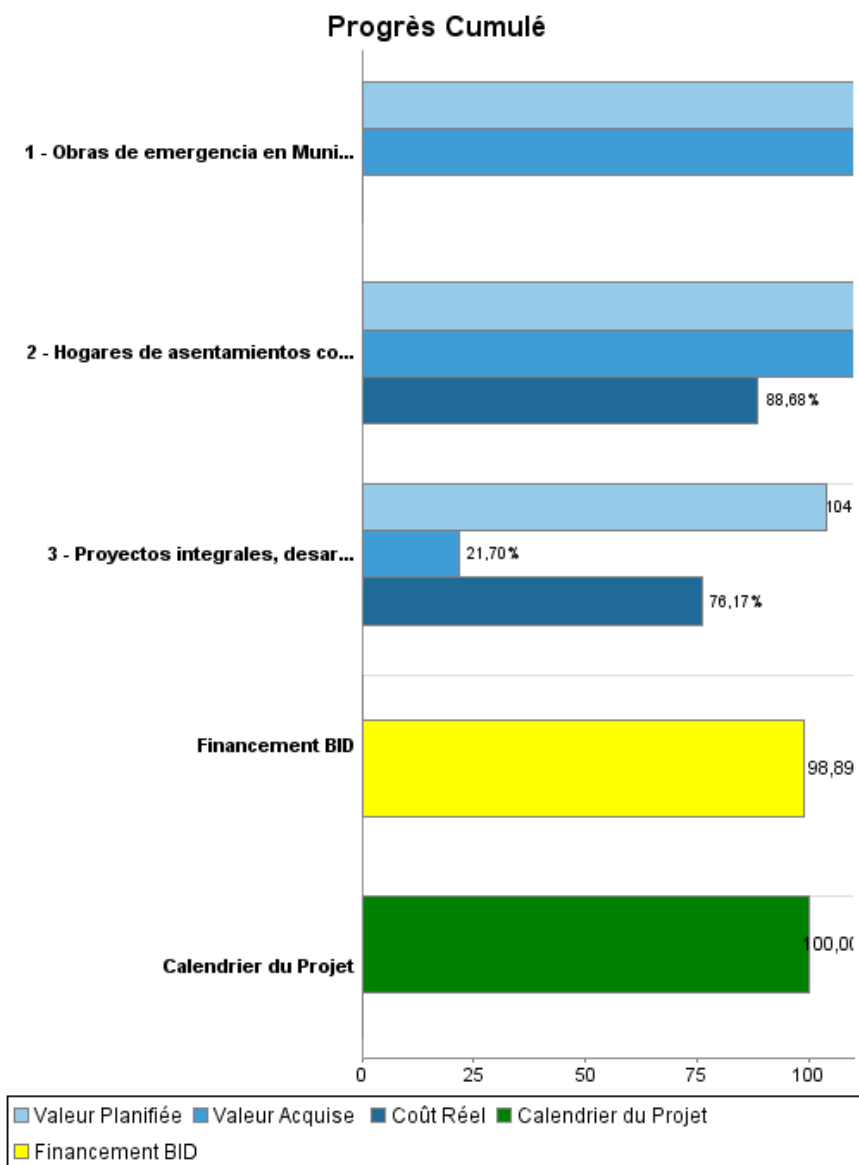

## Résultats

**Résultat:** Calidad de vida de los habitantes de asentamientos en 3 municipalidades, mejorado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2009	Fin du Projet
Hogares con condiciones sanitarias en los asentamientos del Programa, mejoradas	Hogares	3,600.00	2000	P		85.00	3,400.00
				A	45.00		
Hogares con prácticas de higiene (lavado de alimentos, disposición apropiada de residuos, entre otros), mejoradas.	Hogares	4,000.00	2000	P			2,720.00
				A			
Hogares con accesibilidad a asentamientos y viviendas, mejorada	Hogares	4,000.00	2010	P			2,720.00
				A			

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Emergencia</b>									
Obras de emergencia en Municipios, realizadas	Asentamientos	21,00	21,00		21,00	100.000,00			385.836,28
<b>Proyectos Integrales, desarrollados</b>									
Proyectos integrales, desarrollados ( Infraestructura Fisica)	Obras	18,00	6,00		22,00	2.500.000,00	1.904.607,88		16.913.846,43
Hogares de asentamientos con red de agua potable instalada	Hogares	497,00	1.660,00		1.660,00	600.000,00	100.065,00		745.294,91
Personal de Supervisión	N/A						4.712,62		1.949.968,00
<b>Gestion del Programa</b>									
Auditoria	N/A					1.875,00	431,59		73.360,00
Administración	N/A					5.000,00	25.781,64		411.196,80
<b>TOTAL</b>						<b>3.206.875,00</b>	<b>2.035.598,73</b>		<b>20.479.502,42</b>
