
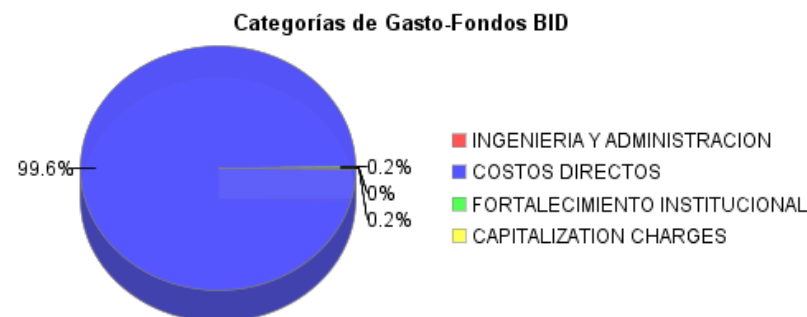
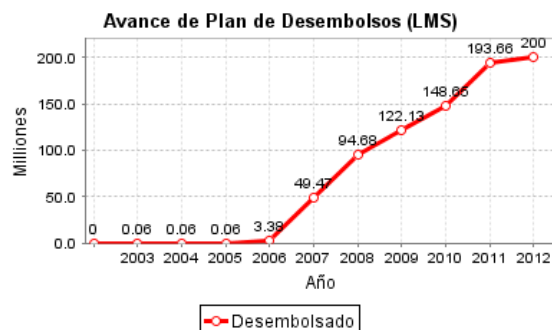



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS		
Sector:	TRANSPORT		
Número(s) de Préstamo:	1294/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	200.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	199.999.999,97
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC9803504	Saldo:	0,03
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	200.000.000,00
		Actual BID:	200.000.000,00
		Pari-passu:	50,00
		Co-financiamiento/País:	80.000.000,00
		Estimado Original:	280.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	162

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012 Validado por Representante de País: 15-oct-2012

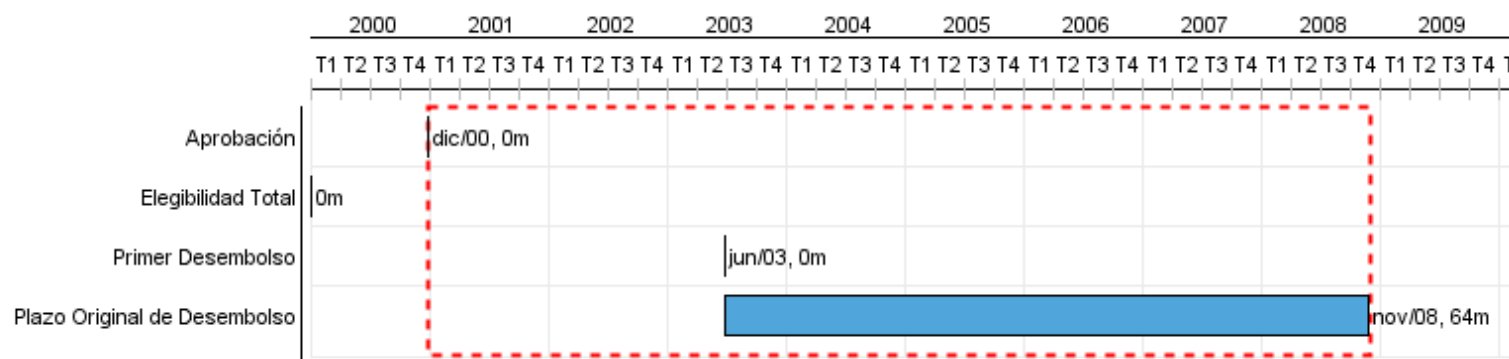

## Progreso Acumulado al 2012

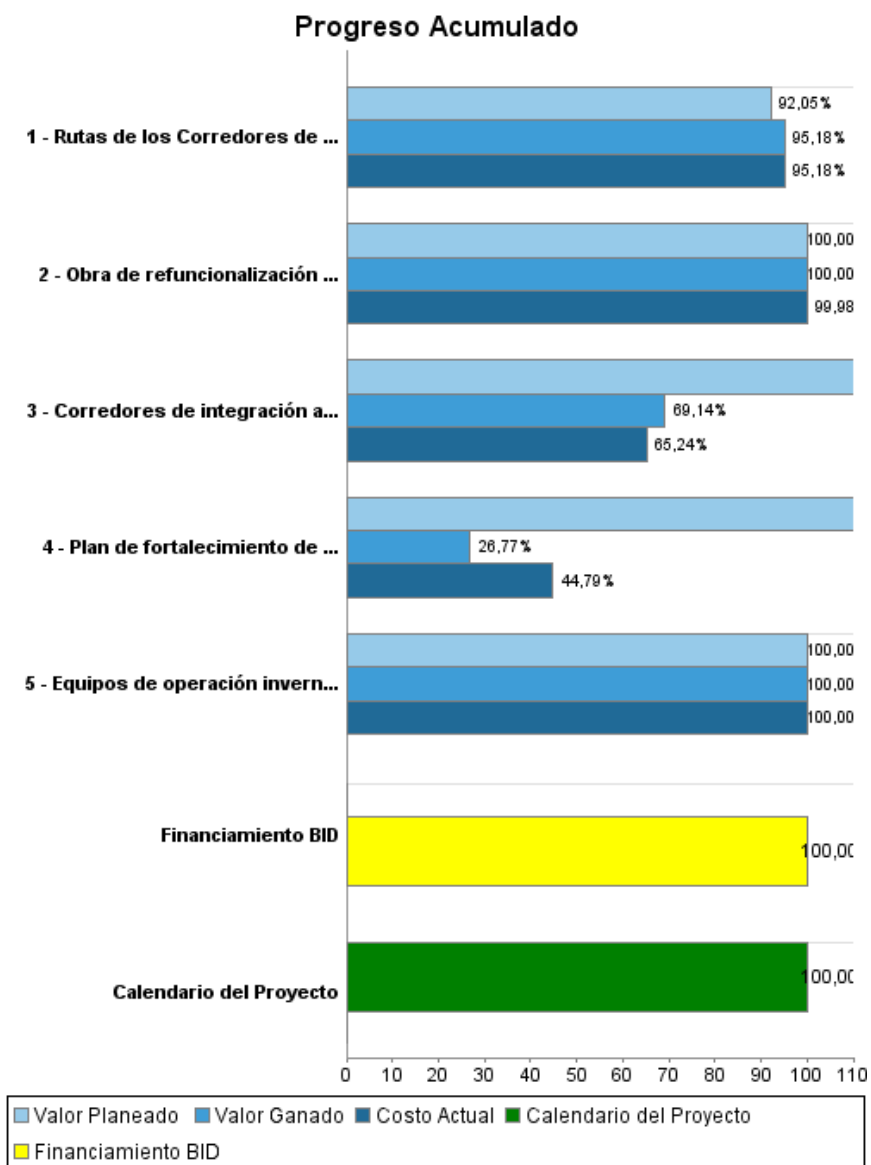

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Costos de Transporte Reducidos	\$/km	1.42		P A	1.01
Tiempo de Viaje Reducido	\$/km	1.30		P A	1.00
Condiciones de Seguridad Mejoradas	Alertas			P A	3.00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.</b>									
Corredores de integración ampliados	Kilómetros	92,00	35,00		242,00	264.658.000,00	86.050.284,00		513.800.000,00
Rutas de los Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros				68,00				28.400.000,00
<b>2. Fortalecimiento Institucional</b>									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00				1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
<b>3. Adquisición de equipos de operación</b>									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
<b>4. Ingeniería y Administración</b>									
Ingeniería y Administración	N/A								19.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>264.658.000,00</b>	<b>86.050.284,00</b>		<b>570.510.391,00</b>
