
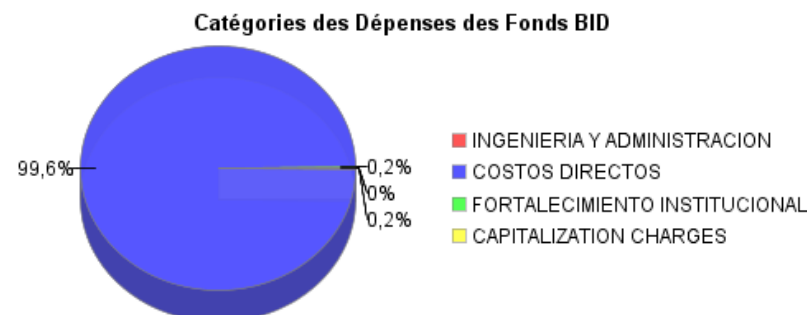
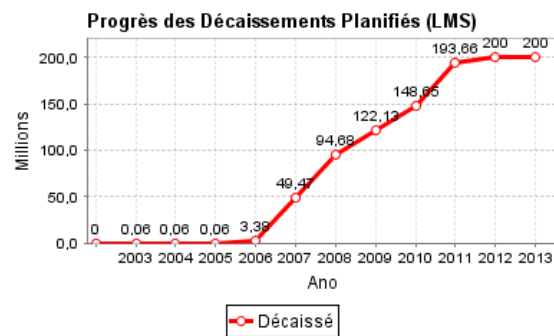



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS				
Secteur:	TRANSPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1294/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	200.000.000,00	Initial BID:	200.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	199.999.999,97	Courant BID:	200.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):	TC9803504	Solde:	0,03	Cofinancement/Pays:	200.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	400.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013

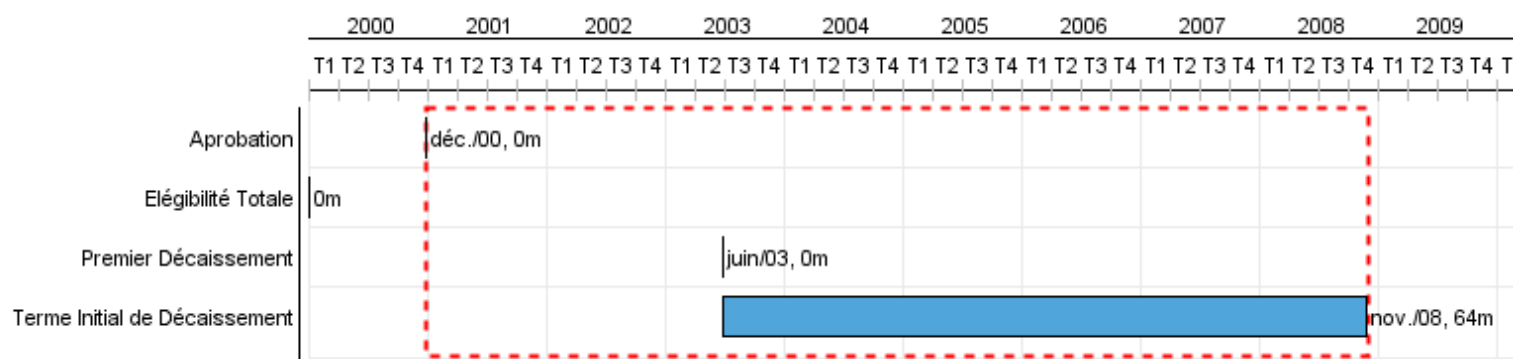

Progrès Cumulé à 2012

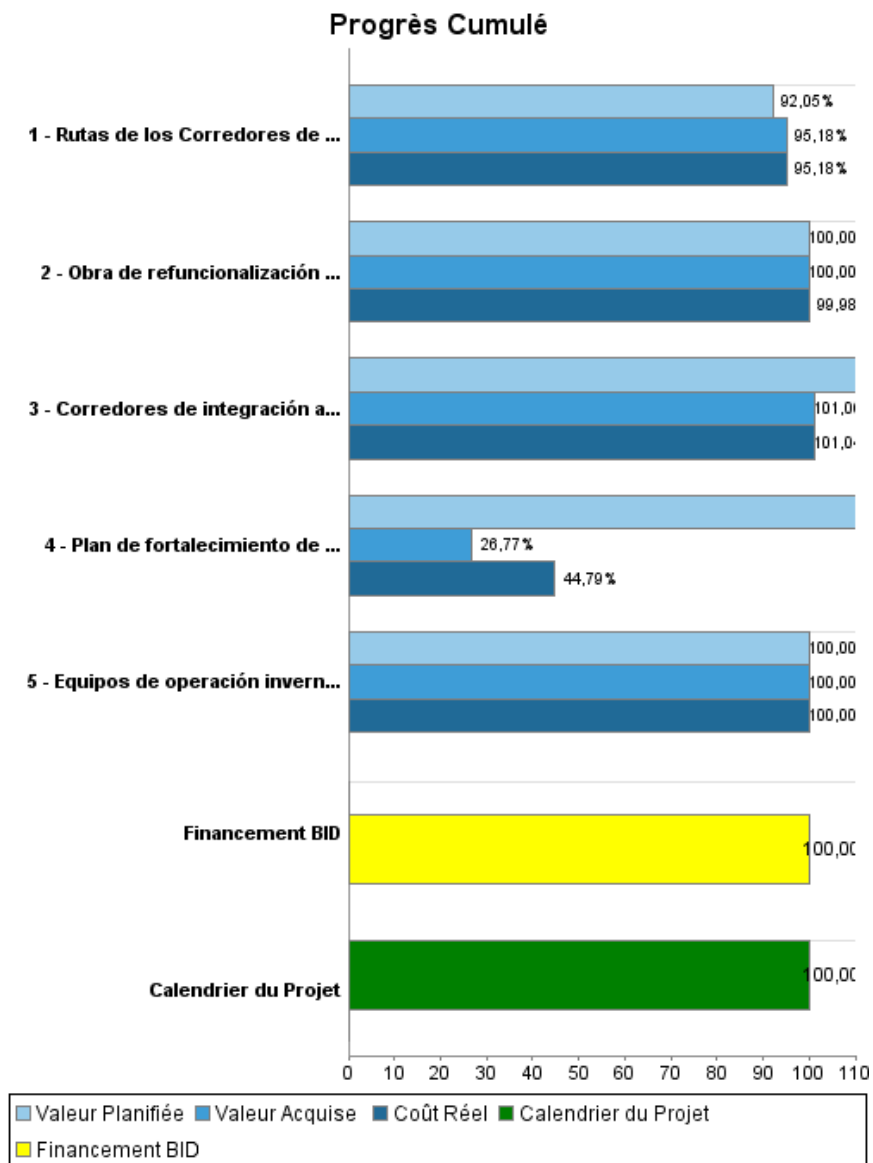

Résultats

Résultat: Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costos de Transporte Reducidos	\$/km	1,42		P A	1,01
Tiempo de Viaje Reducido	\$/km	1,30		P A	1,00
Condiciones de Seguridad Mejoradas	Alertas			P A	3,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.									
Corredores de integración ampliados	Kilómetros	92,00	92,00		242,00	264.658.000,00	270.000.000,00		513.800.000,00
Rutas de los Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros				68,00				28.400.000,00
2. Fortalecimiento Institucional									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00				1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
3. Adquisición de equipos de operación									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
4. Ingeniería y Administración									
Ingeniería y Administración	N/A								19.500.000,00
TOTAL						264.658.000,00	270.000.000,00		570.510.391,00
