
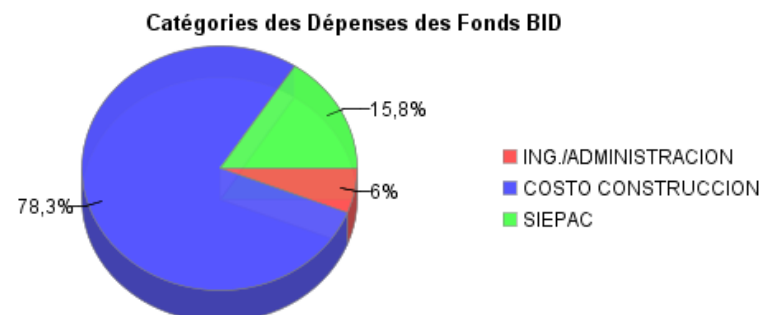
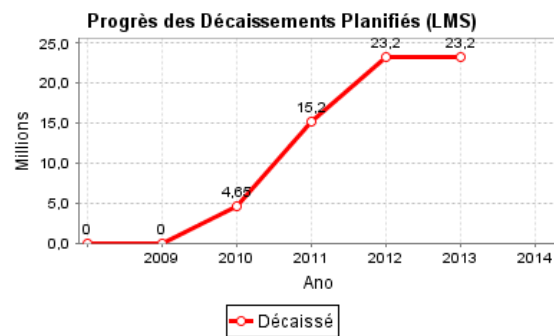



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2016/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	28.550.000,00	Initial BID:	28.550.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	23.201.467,27	Courant BID:	28.550.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	81,27	Pari Passu:	91,00
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Solde:	5.348.532,73	Cofinancement/Pays:	2.760.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	31.310.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 16-abr-2013

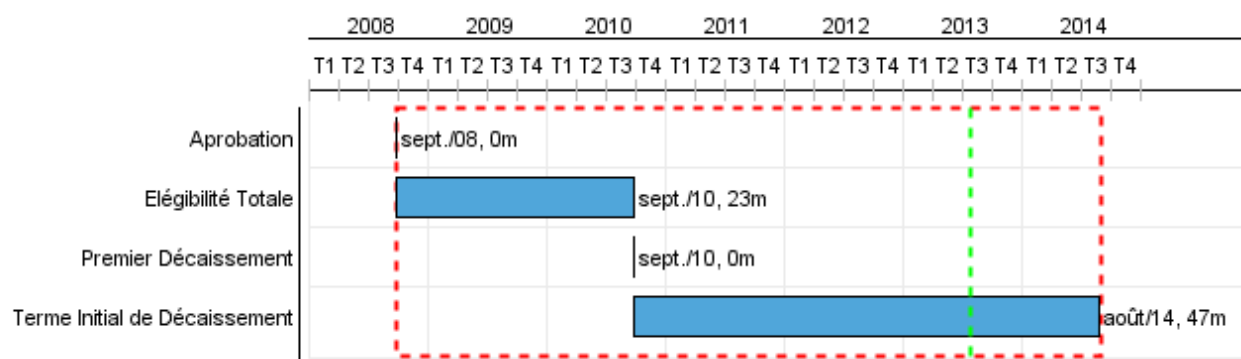

## Progrès Cumulé à 2012

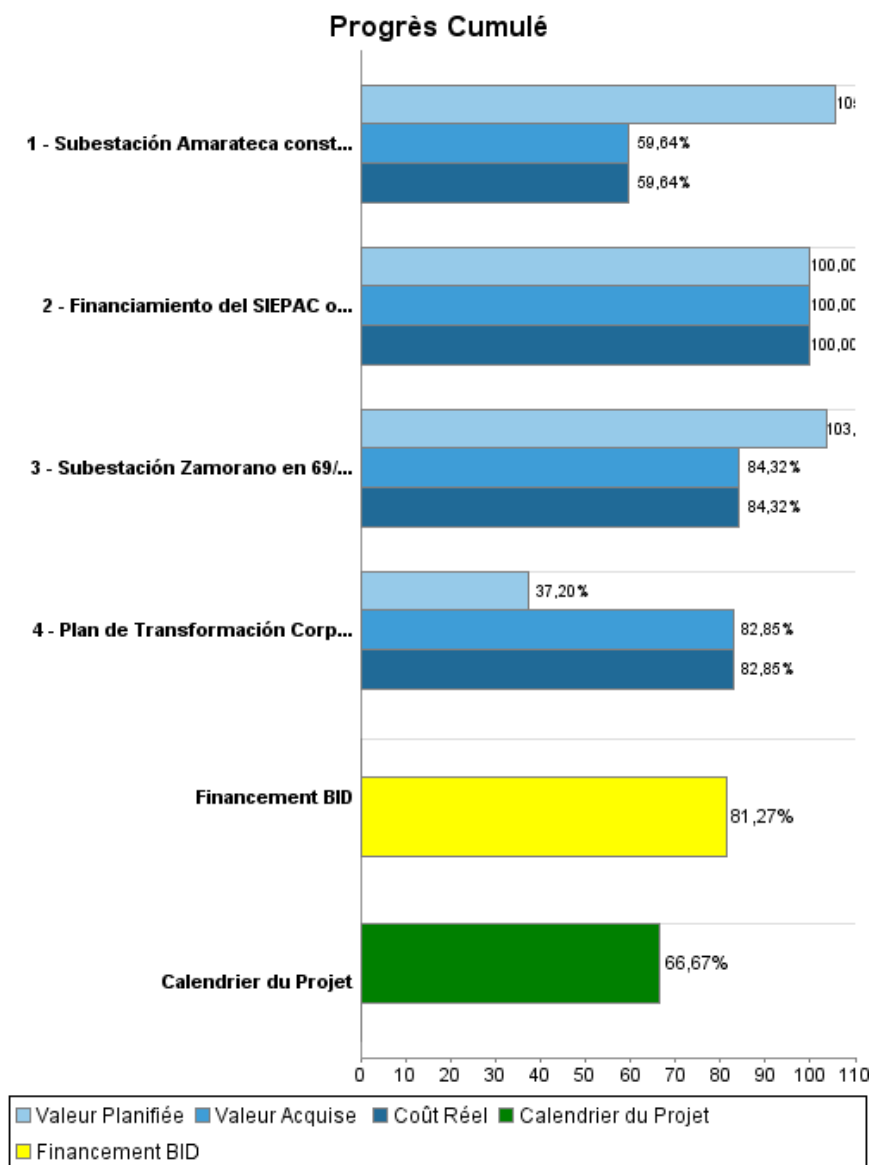

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P	132,10
				A	
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P	8,40
				A	

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	6.290.474,18	7.249.800,88		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	660.000,00	804.322,22		1.250.500,00
Asesoría, supervisión de obras y Regencia Ambiental del Proyecto realizadas	N/A					400.000,00	195.998,48		646.000,00
<b>Composante 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00	150.000,00	621.400,49		750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión del Programa	N/A					500.000,00	84.320,56		3.858.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.000.474,18</b>	<b>8.955.842,63</b>		<b>31.350.500,00</b>
