
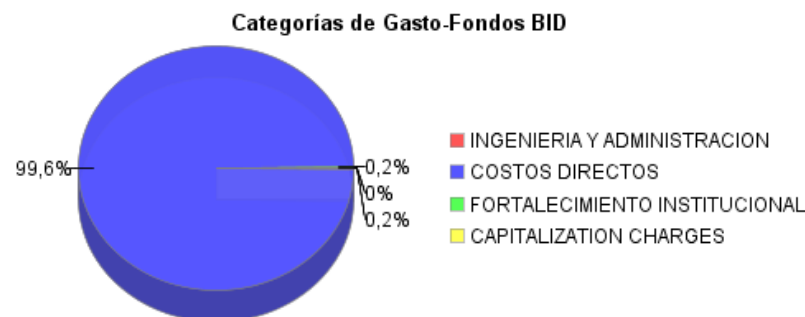
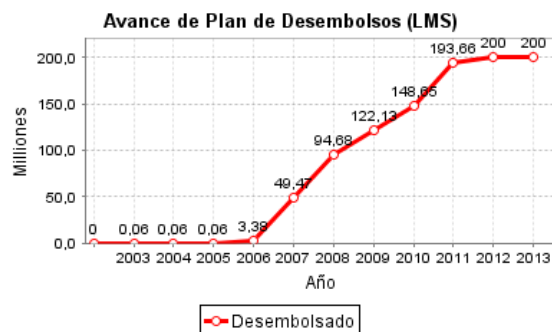



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS		
Sector:	TRANSPORT		
Número(s) de Préstamo:	1294/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	199.999.999,97
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	199.999.999,97
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC9803504	Saldo:	
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	200.000.000,00
		Actual BID:	199.999.999,97
		Pari-passu:	50,00
		Co-financiamiento/País:	200.000.000,00
		Estimado Original:	400.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	162

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 02-oct-2013 Validado por Representante de País: 25-oct-2013

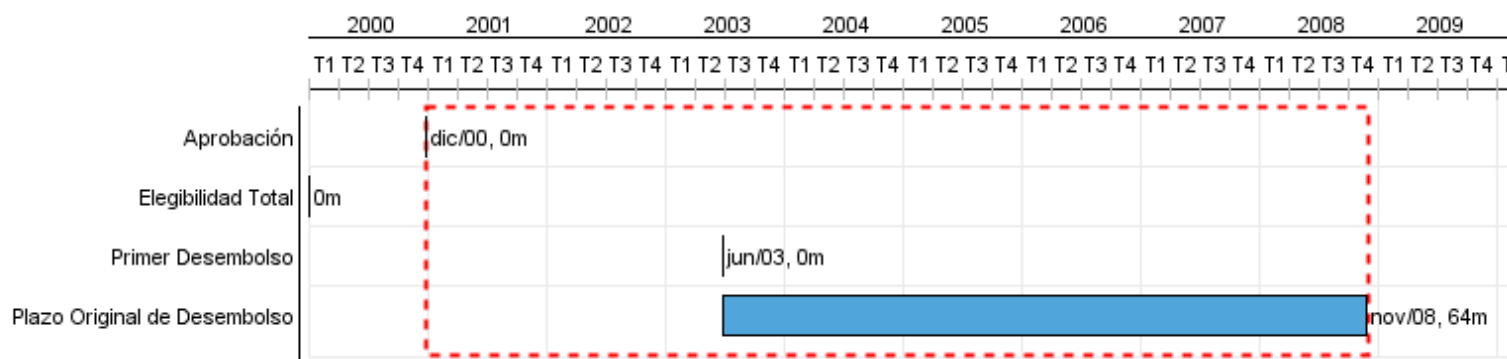

Progreso Acumulado al 2013

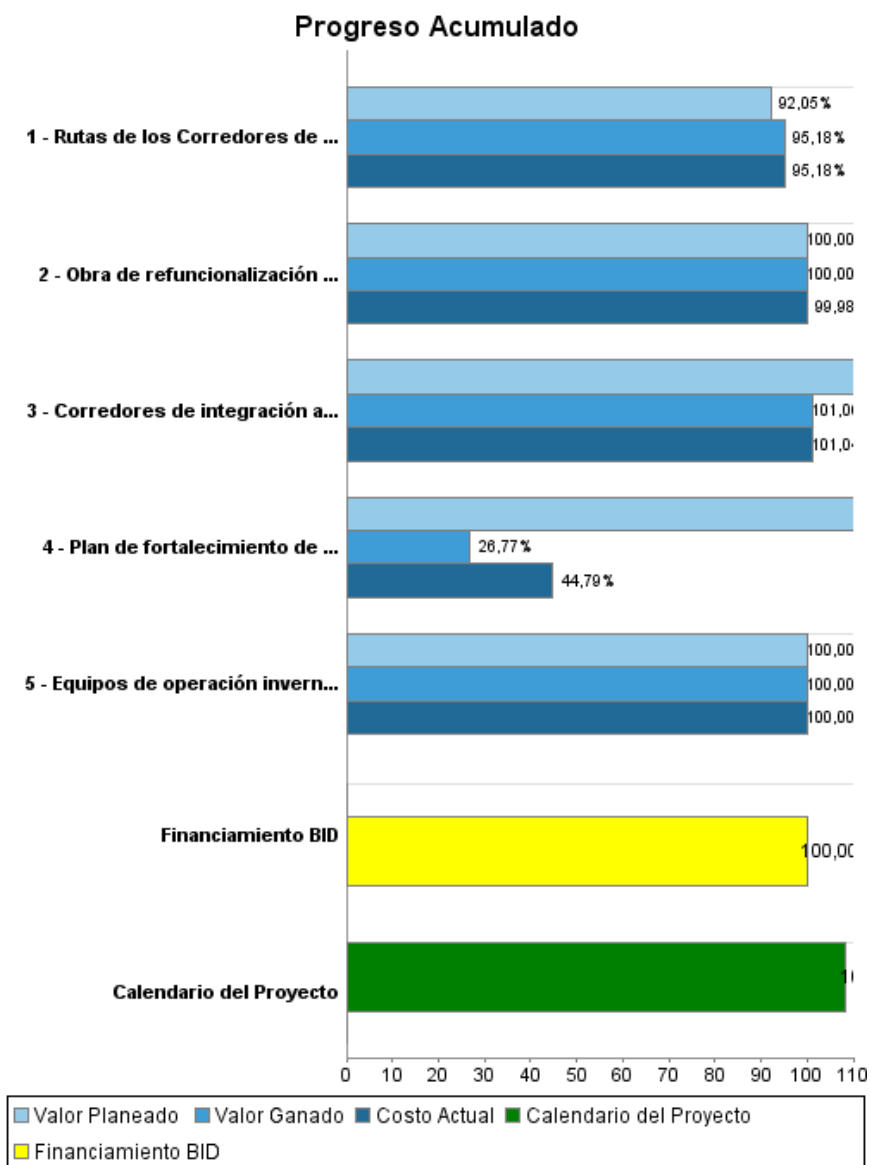

Resultados

Resultado:	Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Costos de Transporte Reducidos	\$/km	1,42		P A	1,01
Tiempo de Viaje Reducido	\$/km	1,30		P A	1,00
Condiciones de Seguridad Mejoradas	Alertas			P A	3,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.									
Corredores de integración ampliados	Kilómetros				242,00				513.800.000,00
Rutas de los Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros				68,00				28.400.000,00
2. Fortalecimiento Institucional									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00				1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
3. Adquisición de equipos de operación									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
4. Ingeniería y Administración									
Ingeniería y Administración	N/A								19.500.000,00
TOTAL									570.510.391,00
