

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Sector: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Número(s) de Préstamo: 2016/BL-HO
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 28.550.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 28.550.000,00
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Costo total y Fuente

BID Original: 28.550.000,00
Actual BID: 28.550.000,00
Pari-passu: 91,00
Co-financiamiento/País: 2.760.000,00
Estimado Original: 31.310.000,00
Período de Amortización (meses): 282




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 07-oct-2013
Validado por Representante de País: 08-oct-2013

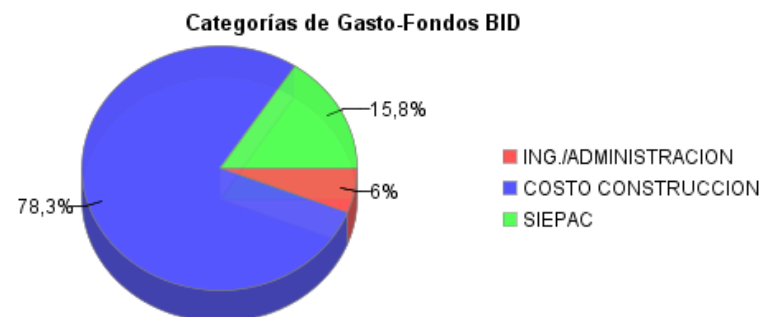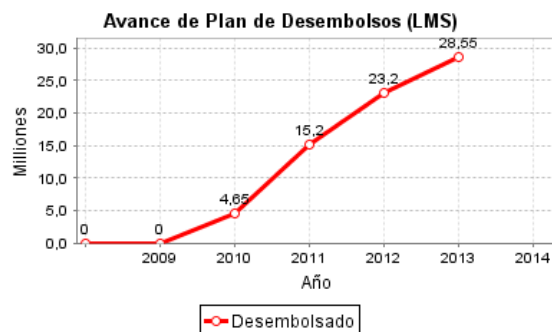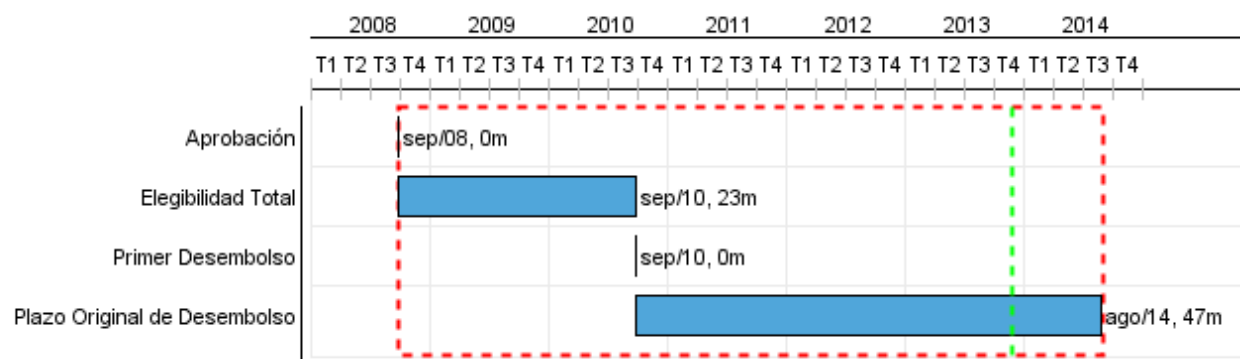

Progreso Acumulado al 2013

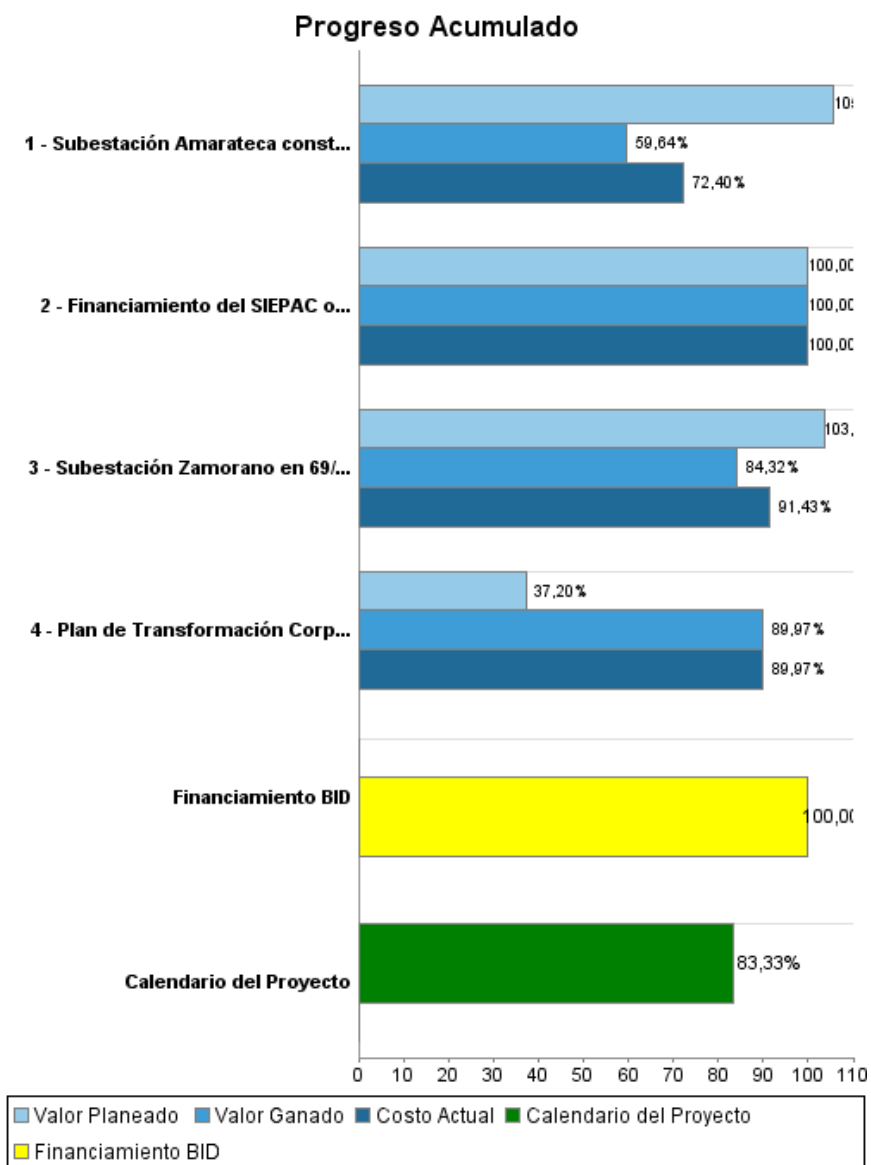

Resultados

Resultado:	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación	1,00			1,00	8.212.000,00	2.595.273,37		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación	1,00			1,00	196.000,00	88.923,28		1.250.500,00
Asesoría, supervisión de obras y Regencia Ambiental del Proyecto realizadas	N/A					355.000,00	109.656,64		646.000,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00	129.000,00	53.340,19		750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
Gestión del Programa									
Gestión del Programa	N/A					3.000.000,00	262.255,02		3.858.000,00
TOTAL						11.892.000,00	3.109.448,50		31.350.500,00
