



Operation Number: **DR0123**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/23/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/30/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **11/06/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Drinking Water and Sanitation Sector Reform	Loan Number:	1198/OC-DR,1198/OC-DR-1,1198/OC-DR-2
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO,SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO,SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO		
Team Leader:	Grau Benaiges,Javier	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA ,REPUBLICA DOMINICANA ,REPUBLICA DOMINICANA Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR0123	\$71,000,000.00	\$27,796,689.86	\$18,000,000.00	\$0.00	\$89,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR0123	\$27,796,689.86	\$24,747,657.32	89.03%	\$3,049,032.54


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

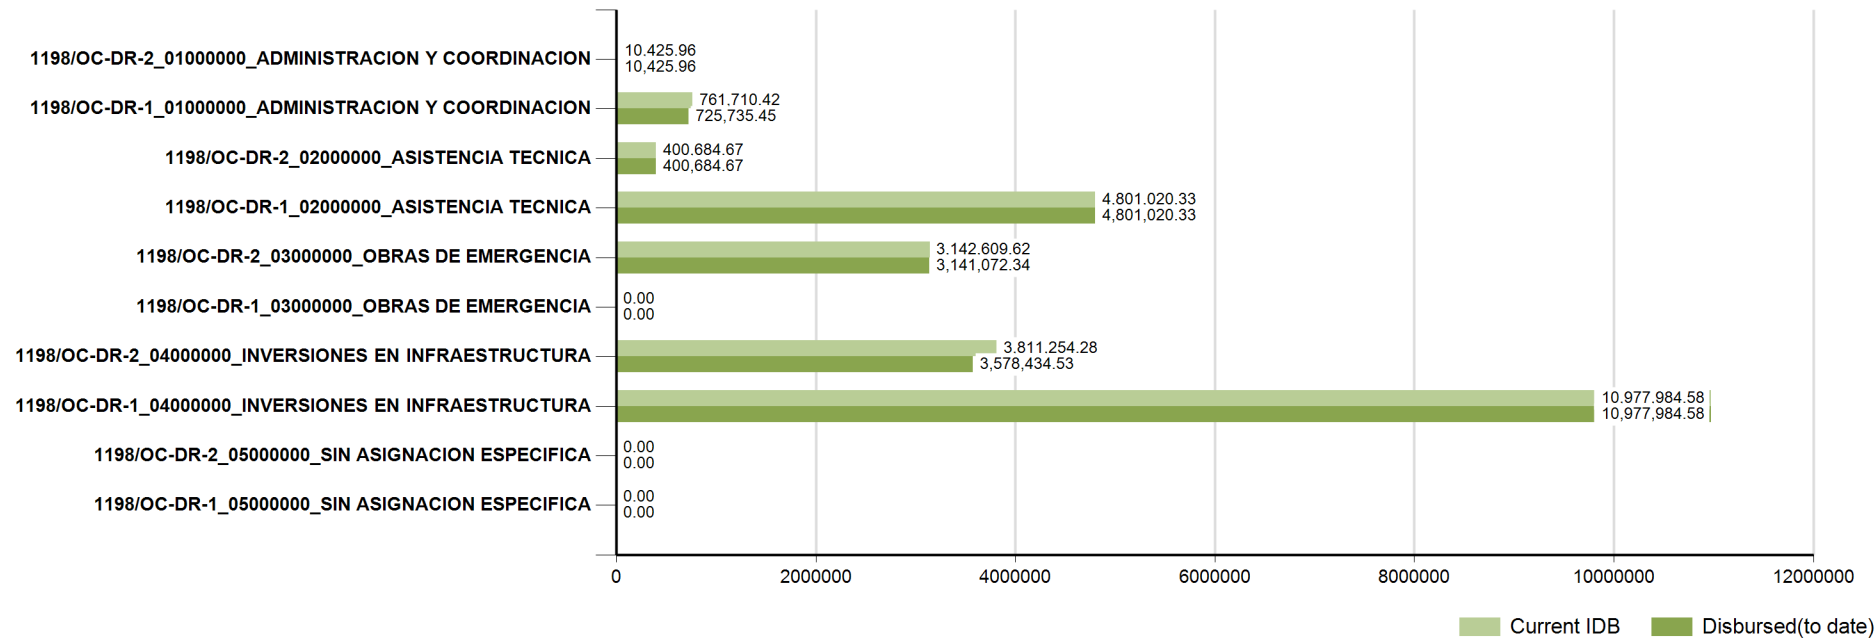

Expense Categories by Operation (cumulative values)

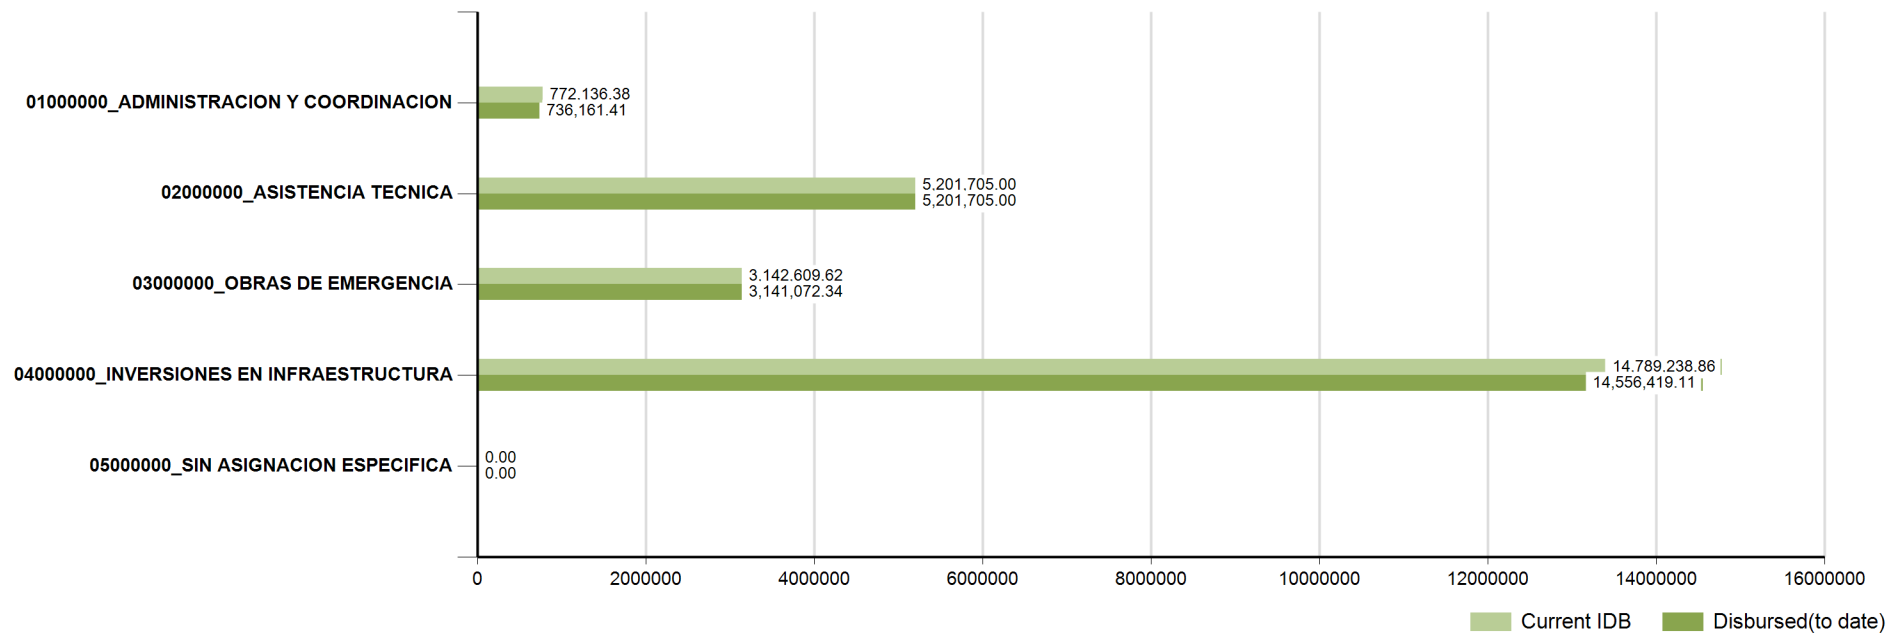

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 La cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento mejoran en Santo Domingo y se fortalece institucionalmente a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.
Observation:	Estos impactos coinciden con los establecidos en la Estrategia de País para el 2010-2013 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República Dominicana, tal y como establecen en su eje número 4 "Un manejo sostenible del medio ambiente y



Outcomes

Outcome:	1 Capacidad técnica y comercial de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo mejorada.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
1.1 Clientes registrados en sistemas comerciales		%	60.00	2009	Informes de Progreso Semestrales, Estados Financieros Auditados, Evaluación Final, e Informes de Plan de Gestión Empresarial.		P	60.00	60.00	70.00		70.00
	P(a)						60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	
	A						60.00	60.00	60.00			
1.2 Clientes registrados con micromedición		%	27.00	2009	Informes del Departamento Comercial de la CAASD, informe de evaluación final. Informes de avance del Plan de Gestión Empresarial.		P	27.00	27.00	40.00		40.00
	P(a)						27.00	27.00	27.00	27.00	40.00	
	A						27.00	21.00	27.00			
1.3 Índice de Agua No Contabilizada		%	63.00	2010	Informes de Progreso, Evaluación Final, Consultoría Plan Gestión Empresarial.		P	63.00	63.00	50.00		50.00
	P(a)						63.00	63.00	63.00	63.00	50.00	
	A						63.00	63.00	63.00			
Outcome:	2 Cobertura de agua potable de la CAASD incrementada											
Observation:												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP
2.1 Cobertura de agua potable		%	89.00	2010	Informes de Progreso, Informes Plan Gestión Empresaria I, Evaluación Final del proyecto.		P	89.00	89.00	91.00	91.00
							P(a)	89.00	89.00	89.00	91.00
							A	89.00	89.00	89.00	
2.2 Viviendas con nueva conexión de agua potable.	RF	Households	0.00	2013	Informes de supervisión de obra. Informe evaluación final.		P				
							P(a)		0.00	540.00	540.00
							A				

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Fortalecimiento de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
1.1. Plan de Gestión Empresarial implementado	Plan	P	1.00	P	782,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	807,684.49
		A	1.00	A	807,684.49
1.2. Plan Maestro de Alcantarillado implementado	Plan	P	1.00	P	4,500,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	3,271,406.03
		A	1.00	A	3,271,406.03
1.3. Plan Tecnico Operativo implementado.	Plan	P	4.00	P	425,000.00
		P(a)	4.00	P(a)	187,800.00
		A	4.00	A	187,800.00
1.4. Corporacion de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo fortalecida financieramente (auditorias)	Organización	P	5.00	P	0.00
		P(a)	5.00	P(a)	57,965.29
		A	5.00	A	57,965.29
2. Obras de Emergencia		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
2.1. Micromedidores adquiridos	micromedidores	P	20,000.00	P	109,000.00
		P(a)	20,100.00	P(a)	9,000.00
		A	20,100.00	A	9,000.00
2.2. Planta de tratamiento de aguas servidas Los Ríos y Los Jardines rehabilitada	Plantas	P	1.00	P	1,278,658.32
		P(a)	2.00	P(a)	1,278,658.32
		A	2.00	A	1,278,658.32
2.3. Cajas para medidores adquiridas	cajas	P	0.00	P	450,000.00
		P(a)	20,000.00	P(a)	100,000.00
		A	20,000.00	A	100,000.00
2.4. Medidores y cajas instalados.	Medidores	P	20,000.00	P	1,200,000.00
		P(a)	20,000.00	P(a)	1,143,677.51
		A	20,000.00	A	1,143,677.51
3. Obras de infraestructura		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
3.1. Programa Macro y Micro-medición y control de fugas ejecutado	Programas	P	1.00	P	1,546,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	96,000.00
		A	1.00	A	96,000.00
3.2. Tuberías de redes de distribucion de agua potable instaladas	Kms.	P	1.00	P	13,046,000.00
		P(a)	16.00	P(a)	6,172,597.60
		A	16.00	A	6,172,597.60
3.3. Programa de extensión en barrios carenciados de agua potable ejecutado	Programa	P	1.00	P	1,000,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A	1.00	A	0.00
3.4. Diseños de obras de redes de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales preparados.	Programa	P	0.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	200,000.00
		A	1.00	A	200,000.00
3.5. Programa de rehabilitación de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas ejecutado	Programa	P	1.00	P	1,650,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	800,000.00
		A	1.00	A	800,000.00

3.6. Programa de regularización de servicios a comunidades rurales conectadas a sistemas urbanos ejecutado	Programa	P	0.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
3.7. Obras de emergencia Tormenta Noel implementada.	Obra	P	1.00	P	4,571,186.00
		P(a)	1.00	P(a)	5,441,186.00
		A	1.00	A	5,441,186.00
3.8 Viviendas con nueva conexion de agua potable	Vivendas	P		P	
		P(a)	540.00	P(a)	957,126.83
		A	540.00	A	957,126.83
3.9 Programa de Calidad de Agua implementado	Programa	P		P	
		P(a)	1.00	P(a)	1,885,040.52
		A	1.00	A	1,885,040.52
Otros Costos					

Other Cost		Cost
Costos de administracion, seguimiento, financieros	P	\$7,607,000.00
	P(a)	\$8,358,589.16
	A	\$8,358,589.16
Sin Asignacion.	P	
	P(a)	\$0.00
	A	\$0.00
Total Cost		Total Cost
	P	\$38,164,844.32
	P(a)	\$30,321,744.32
	A	\$30,766,731.75

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3. Obras de infraestructura	Modify Component	El programa finalizó en el 2013 (en el 2014 se ha realizado la auditoría final y se ha justificado el fondo rotatorio) por lo que no se pudo modificar la planificación de los productos del programa. Lo único que se ha reportado ha sido el avance físico y financiero. En relación a programación en futuros años, al finalizar la ejecución en el 2013, no se ha procedido a ningún cambio en unidades o avance financiero previsto en futuros años.	6/6/2014	6/6/2014
Output	2. Obras de Emergencia	Modify Component	El programa finalizó en el 2013 (en el 2014 se ha realizado la auditoría final y se ha justificado el fondo rotatorio) por lo que no se pudo modificar la planificación de los productos del programa. Lo único que se ha reportado ha sido el avance físico y financiero. En relación a programación en futuros años, al finalizar la ejecución en el 2013, no se ha procedido a ningún cambio en unidades o avance financiero previsto en futuros años.	6/6/2014	6/4/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
