
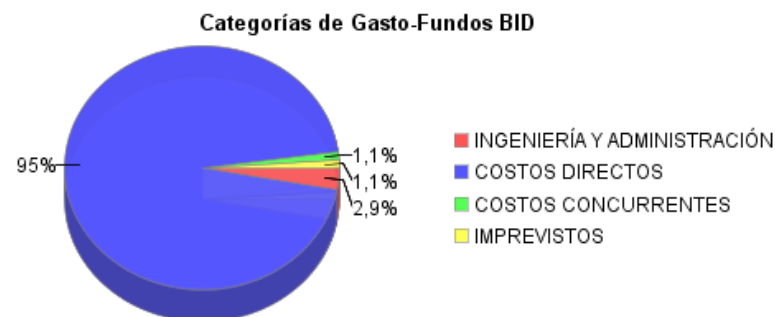



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Empresa de Obra Sanitaria de Pasto		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 2183/OC-CO	Atual: 27.800.000,00	Original BID: 27.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 27.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: CO-T1069, RG-P1374	Saldo: 27.800.000,00	Cofinanciamento/País: 16.200.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 44.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 222

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 1, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

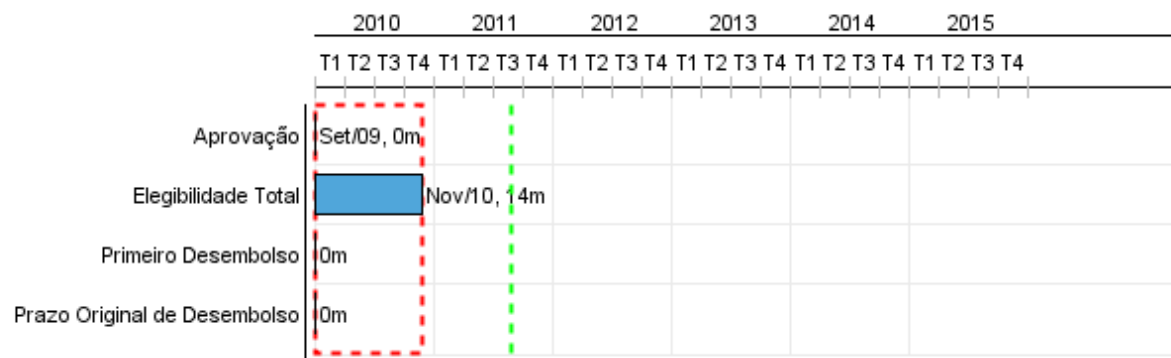

## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

**Resultado:** Calidad del Rio Pasto (medida en la estacion Club de Tennis) mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Caudal Estacion Club de Tennis	m3/seg	1,61	2006	P A	1,86
DBO5 Estacion Club de Tennis	mg/l	210,00	2006	P A	1,60
OD DBO5 Estacion Club de Tennis	mg/l	0,60	2006	P A	1,51
Coliformes DBO5 Estacion Club de Tennis	NMP/ 100ml	4,50	2006	P A	3,20
Numero de descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (rio pasto y afluentes) de aguas residuales	Descargas	6,00	2006	P A	0,00
Numero de quejas al año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)	Quejas		2011	P A	0,00

**Resultado:** Cobertura del servicio de acueducto mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Suscriptores del servicio de agua potable servidos por EMPOPASTO	Suscriptores	62.500,00	2009	P A	68.000,00
Suscriptores del servicio de acueducto en los estratos 1 y 2 del area urbana	Suscriptores	37.625,00	2008	P A	40.936,00

**Resultado:** Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Razon de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Ratio	1,00	2009	P A	1,00
Endeudamiento financiero (Deudas/Pasivo)	Porcentaje	40,00	2009	P A	40,00
Eficiencia del recaudo (Monto facturado/ Monto recaudado en un año)	Porcentaje	85,00	2009	P A	85,00
Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)	Ratio	1,50	2009	P A	1,50
EBITDA (Resultado del año ante de Depreciacion, Amortizacion e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio	Porcentaje	20,00	2009	P A	20,00

**Resultado:** Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento en la zona rural mejorado

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

CO-L1028 - Water and Sanitation Program for the Municipio of Pasto  
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento  
Última Atualização do PMR: 30/03/2011

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Hogares con acceso al servicio	Hogares		2009	P A	6.200,00
Razon de liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Porcentaje		2011	P A	0,00
Eficiencia del recaudo (Monto facturado/ Monto recaudado en un año)	Porcentaje		2011	P A	0,00

<b>Resultado:</b>	Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Disminucion de costos de bombeo medido en KWH ahorrados	\$		2011	P A	0,00
Indice de Agua no Contabilizada (Agua facturada/ Agua producida en un año)	Porcentaje	42,20	2009	P A	37,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Obras de Agua Potable</b>									
Planta de tratamiento de Agua Potable construida	Planta de tratamiento				1,00				6.300.000,00
Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, valvulas) instaladas	Sectores				13,00				2.300.000,00
<b>Obras de Alcantarillado</b>									
Colectores e interceptores (longitud de via intervenida) con diametros entre 12 y 40 en tuberia de concreto/PVC que recogen las aguas servidas han sido construidos	km				7,60				19.300.000,00
Redes de alcantarillado (longitud via intervenida) construidos	km				6,01				5.000.000,00
<b>Fortalecimiento Empresarial</b>									
Plan estrategico integrado a hechos y propositos	Plan estrategico				1,00				750.000,00
Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional				1,00				
<b>Agua para el Campo</b>									
Planes de inversion de agua potable y saneamiento basico en zonas rurales disenados	proyectos				15,00				4.050.000,00
Sistemas de acueducto rural construidos	sistemas				18,00				
<b>Costos Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>37.700.000,00</b>
