
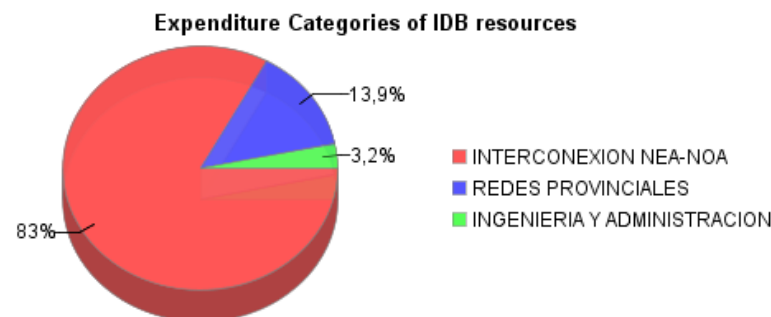
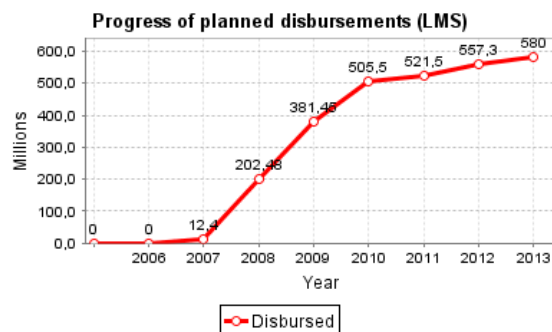



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Loan Number(s):	1764/OC-AR	Current Approved Amount:	580.000.000,00	Original IDB:	580.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	577.596.370,68	Current IDB:	580.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	99,59	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	AR-L1095	Balance:	2.403.629,32	Co-Financing/Country:	145.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	725.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: A(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 07-oct-2013 Validated by Country Representative: 25-oct-2013

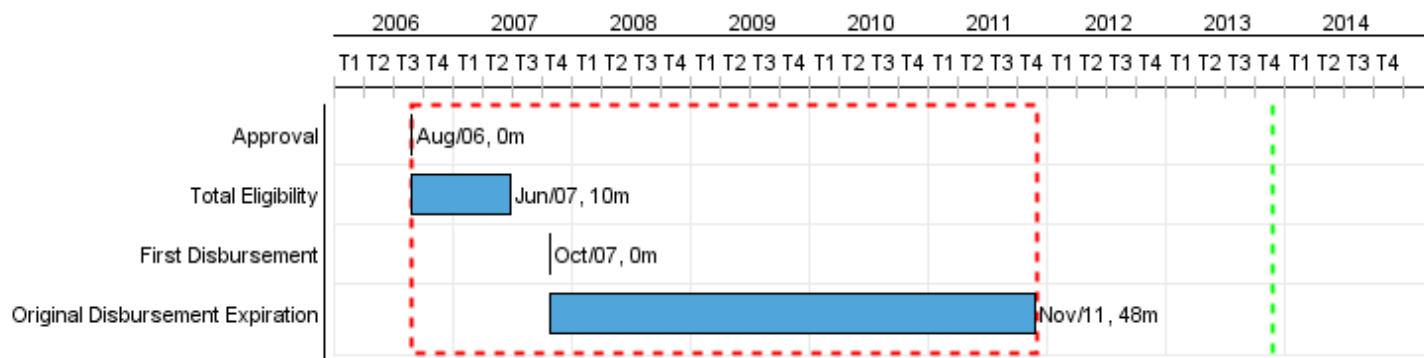

Accumulated Progress as of 2013

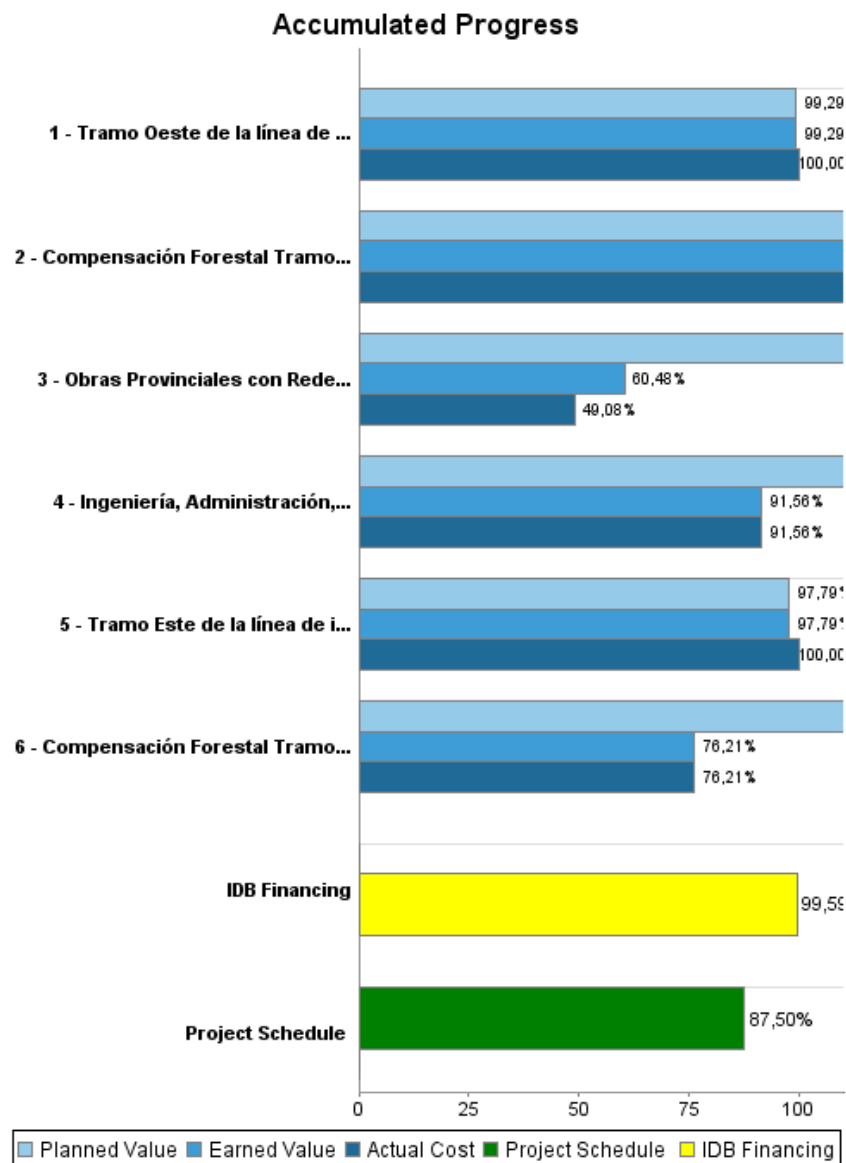

Outcomes

Outcome: Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Aumento del grado de electrificación en la Región del Norte Grande	%	77,30	2003	P A	87,00	87,00

Outcome: Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Disminuye la relación de Energía no Suministrada (ENS) con respecto a la demanda abastecida en los sistemas de transmisión regional	MWh/año x10(-4)	2,54	2004	P A	2,16	2,16

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA									
Tramo Este de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				571,00				494.141.000,00
Tramo Oeste de la línea de interconexión de extra alta tensión y EETT construida y operando	km				637,00				509.970.000,00
Compensación Forestal Tramo Este realizada	Obra Compensada				1,00	4.000.000,00	6.432.000,00		5.540.000,00
Compensación Forestal Tramo Oeste realizada	Obra Compensada				1,00	2.500.000,00	2.302.000,00		5.035.000,00
Componente II - Obras civiles y electromecánicas para las redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande									
Obras Provinciales con Redes de transmisión, subtransmisión y Estaciones de transformación terminadas	Obras	5,00	1,00		19,00	42.000.000,00	35.453.000,00		203.691.000,00
Componente III - Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos									
Ingeniería, Administración, Inspección, Escalonamiento e Imprevistos	0					520.000,00	152.000,00		19.123.000,00
TOTAL						49.020.000,00	44.339.000,00		1.237.500.000,00
