

PMR Operational Report

Operation Number	RG-L1074	Chief of Operations Validation Date	10/12/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Agua Negra Pass International Tunnel Structuring Program	Loan Number	3867/OC-RG, 3868/OC-RG
Executing Agency	Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte	Sector/Subsector	TR-FRA - TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
Team Leader	LEANO, JUAN MANUEL	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	REGIONAL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1074	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

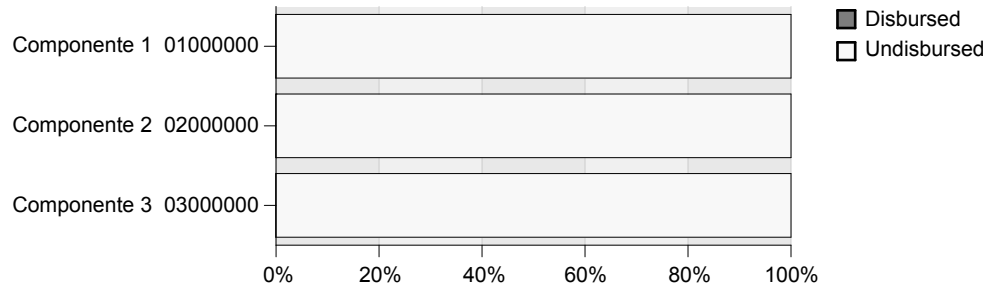

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Construcción del Túnel de Aguas Negras (TAN)

Observation: Medio de Verificación. Apertura del TAN al tránsito.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	EOP 2020			
0.0	TAN construido	Unidad	0.00	2016	P		1.00	1.00			
					P(a)		1.00	1.00			
					A						
Details											
Means of verification: Apertura del Tunel al tránsito											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 2. Capacidad del personal técnico de las vialidades de ambos países en temas de licitación y construcción de túneles y proyectos binacionales

Observation: Informes de realización de cursos y talleres de capacitación técnica de los funcionarios, aprobado por la EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
1.0	Número de funcionarios capacitados para trabajar en la licitación del Proyecto en cada una de las vialidades (DV y DNV)	unidad	0.00	2016	P	40.00	0.00	40.00
					P(a)	40.00	0.00	40.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes de realización de cursos y talleres de capacitación técnica de los funcionarios aprobado por el EBITAN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 0: Resultado 1. Licitación de diseño y construcción del TAN

Observation: Acta de adjudicación aprobada por el EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.0	Adjudicación de la licitación de diseño e inicio de construcción del TAN	unidad	0.00	2016	P	1.00	0.00	1.00
					P(a)	1.00	0.00	1.00
					A			
Details								
Means of verification: Acta de adjudicación aprobada por la EBITAN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a actividades conjuntas de estructuración y preparación del proyecto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Documentos de licitación del proyecto del túnel	unidad	P	0	1	0	8,200,000
			P(a)	0	1	0	8,200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Apoyo a actividades específicas a las autoridades y organismos estatales incluyendo asesorías legales, técnicas y de fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Cursos de capacitación en auditoría técnica en materia de ejecución de obra realizados	cursos	P	1	4	445,000	1,780,000
			P(a)	0	4	0	1,780,000
			A	0	0	0	0
2.2	Actividades de capacitación en temas de tunelería, socioambiental, hídrico, geología y en materia institucional, financiero y legal, ejecutadas	cursos	P	4	12	1,800,000	5,650,000
			P(a)	0	12	0	5,650,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Elaboración de los diseños de ingeniería finales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Diseños finales del TAN realizados	Nº	P	0	1	0	23,370,000
			P(a)	0	1	0	23,370,000
			A	0	0	0	0
3.2	Estudios ambientales, hídricos y geológicos realizados	Nº	P	4	8	500,000	1,000,000
			P(a)	0	8	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

Total Cost	P			2,745,000	40,000,000
	P(a)			0	40,000,000
	A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
