

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1344	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/30/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROCIDADES-CASCABEL Integrated Development Program	Loan Number	2999/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO	Sector/Subsector	DU-LAN - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN LAND PLANNING AND MANAGEMENT
Team Leader	CAMBLOR, ROBERTO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Perfeitura do Municipio de Cascavel		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O projeto no estágio atual, de 65% de desembolso, está parcialmente conforme com as Políticas do BID a ele aplicáveis. Em todas as missões de supervisão futuras efetuar uma verificação do cumprimento das salvaguardas socioambientais aplicáveis ao Programa.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1344	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0	57,500,000	28,750,000	24,001,314.12	83.48%	4,748,685.88
Aggregated	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0	57,500,000	28,750,000	24,001,314.12	83.48%	4,748,685.88

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

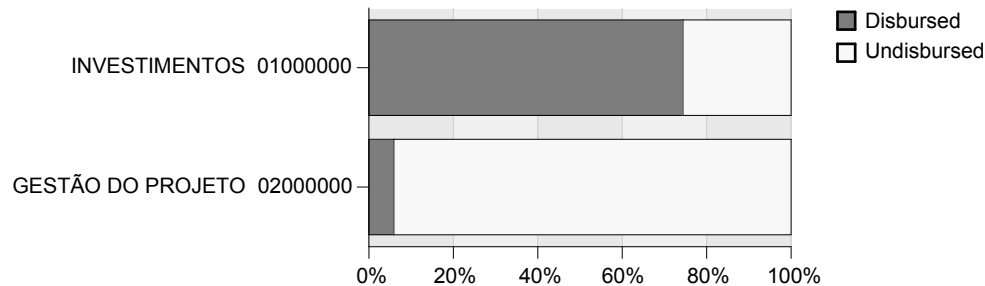

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: R1. Eficiência do sistema viário e do transporte público aumentada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	IR1.1 - Tempo de viagem nos ônibus entre os terminais Oeste e Leste do corredor da Av. Brasil.	Minutos	25.00	2014	P	20.84	20.84
					P(a)	20.84	20.84
					A	0.00	

Details

Means of verification: Controle de saída-chegada dos veículos nos terminais de ônibus. TP=P1+P2+P3+.../Quant. de percursos

Observations: Alteração na Linha de Base e na Meta realizada, conforme orientações da Missão de Arranque e em conformidade às orientações de SPD. A Prefeitura de Cascavel realizou nova pesquisa da Linha de Base (PO) e traçou novas Metas em acordo com a equipe do BID.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.2	IR1.2 - Fluxo de ciclistas na Av. Brasil.	Ciclistas/dia	407.00	2013	P	758.00	758.00
					P(a)	758.00	570.00
					A	856.00	856.00

Details

Means of verification: Controle de fluxo de ciclistas.

Observations: Alteração na Linha de Base e na Meta realizada, conforme orientações da Missão de Arranque e em conformidade às orientações de SPD. A Prefeitura de Cascavel realizou nova pesquisa da Linha de Base (PO) e traçou novas Metas em acordo com a equipe do BID.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: R2. Áreas verdes da cidade e acesso aos serviços sociais da população mais vulnerável aumentados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.1	IR2.1 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência do Morumbi.	R\$/m2	126.14	2010	P	138.75	138.75
					P(a)	138.75	138.75
					A	194.86	194.86

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2019
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
2.2	IR2.2 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Vitória.	R\$/m2	314.80	2010	P	346.28	346.28
					P(a)	346.28	346.28
					A	395.47	395.47

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.3	IR2.3 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Cruz.	R\$/m2	198.51	2010	P	218.37
					P(a)	218.37
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.6	IR2.6 - Frequência da utilização dos parques.	%	25.00	2012	P	35.00
					P(a)	35.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Estudo da frequência de utilização dos parques.

Observations: A Prefeitura de Cascavel realizou pesquisa de campo para identificação e ratificação da Linha de Base (PO) dos indicadores da Matriz de Resultado, em conformidade às orientações de SPD e da Missão de Arranque.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.7	IR2.7 - Famílias atendidas pela rede CRAS/PAIF.	Famílias/ano	9,603.00	2010	P	11,203.00
					P(a)	11,203.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - SEASO. Informe Gerencial IRSAS/UNIOESTE

Observations: Alteração proposta pela PMC para adequar a base de dados do município. A estimativa incremental permaneceu constante, sem alterações

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.7	IR2.8 - Número de famílias monoparentais do sexo feminino atendidas pelo CRAS/PAIF.	Famílias/ano	4,263.00	2013	P	4,973.00	4,973.00
					P(a)	4,973.00	4,973.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - SEASO. Informe Gerencial IRSAS/UNIOESTE

Observations: Indicador de Resultados incluído conforme acordado na Missão de Arranque IDBDocs #38659415 e anexo IDBDocs #38838147

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: R3. Gestão da Informação melhorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
3.1	IR3.1 - Tempo médio de emissão de consulta prévia para construção.	Dias	8.00	2012	P	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - GEOPROCESSAMENTO.

Observations: A meta prevista para esse indicador de resultados é 0 (zero), pois a emissão de consulta é on-line, imediata.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
3.2	IR3.2 - Gastos dos serviços de telecomunicação.	R\$/mês	242,962.64	2012	P	115,976.55	115,976.55
					P(a)	115,976.55	115,976.55
					A	0.00	

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - Cascavel Digital.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1 - Transporte e Mobilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Roads (km)	P		13		2,111,250
			P(a)	3	13	1,362,185.74	4,515,996.48
			A	3	13	1,067,109.19	4,515,996.48
1.2	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Terminais	P		4		4,950,000
			P(a)	3	4	3,822,846.04	5,847,158.09
			A	3	4	4,423,819.12	5,745,015.09
1.3	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Pontos	P		50		2,955,750
			P(a)	18	50	583,793.89	2,184,152.87
			A	16	48	409,397	1,722,271.87
1.4	1.4 - Calçadas construídas.	m2	P		100,000		2,000,000
			P(a)	80,000	63,359	879,078.73	1,391,727.49
			A	26,217	46,217	879,078.73	1,181,003.49
1.5	1.5 - Acessibilidade dos edifícios segundo a Lei 5744/2011 e a Norma NBR9050 implementada.	Ponto de acessibilidade	P	26	130		0
			P(a)	99	59	0	0
			A	14	45	0	0
1.6	1.6 - Ciclovias construídas.	Km	P		11		550,000
			P(a)	3	11	972,989.81	1,648,068.21
			A	0	11	972,989.81	1,499,199.21
1.7	1.7 - Novas vias implementadas.	Roads (km)	P		6.5		3,800,000
			P(a)	3	16.5	1,904,819.5	7,144,656.39
			A	0	14.5	1,904,819	6,411,799.39
1.8	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Viaduto	P		1		1,700,000
			P(a)	0	1	0	2,153,531.53
			A	0	1	0	2,153,531.53
1.9	1.9 - Sinalização Semafórica	Sistema	P		0		7,500,000
			P(a)	0.4	1	2,071,551.67	5,961,910.68
			A	0.4	1	2,071,551.67	5,961,910.68
1.10	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Unidade	P		0		1,508,000
			P(a)	0.1	1	2,115,881.51	14,234,147.7
			A	0.1	1	1,840,000	14,234,147.7
1.11	1.11 - Desapropriações	Unidade	P		0		4,700,000
			P(a)	4	9	1,182,560.32	3,641,028.22
			A	3	8	776,568.49	3,531,977.25

Component Nbr. 2 2 - Meio Ambiente e Serviços Sociais

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	2.1 - Parques Lineares implementados.	m2	P		1,130,000	1,394,250	13,750,000
			P(a)	86,000	456,872	2,126,474.57	4,598,590
			A	86,000	259,000	2,120,018.76	4,598,590
2.2	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Nº de CCI	P		4		4,950,000
			P(a)	2	0	2,468,982.58	1,050,330
			A	0	0	431,580	1,050,330

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3 - Fortalecimento Insitucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P		100		3,575,000
			P(a)	12	100	253,975.93	1,170,354.37
			A	12	75	15,036.56	916,378.44

Other Cost

	Gestão do Projeto	P				
		P(a)			30,235.23	102,026.52
		A			102,026.52	102,026.52

Total Cost

	Total Cost	P			1,394,250	57,500,000
		P(a)			21,610,285.12	57,500,000
		A			17,013,994.85	53,645,589.5

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	IR1.1 - Tempo de viagem nos ônibus entre os terminais Oeste e Leste do corredor da Av. Brasil.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR1.2 - Fluxo de ciclistas na Av. Brasil.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DANIELADO	03/12/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.1 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência do Morumbi.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.2 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Vitória.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.3 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Cruz.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	DANIELADO	03/12/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	DANIELADO	03/18/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.4 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Felicidade.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.5 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência Floresta/Interlagos.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.6 - Frequência da utilização dos parques.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR2.7 - Famílias atendidas pela rede CRAS/PAIF.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
	IR3.1 - Tempo médio de emissão de consulta prévia para construção.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	DANIELADO	03/12/2019
Output	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/13/2019
						03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/13/2019
	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
						03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	1.11 - Desapropriações	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
						03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	1.4 - Calçadas construídas.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/13/2019
	1.5 - Acessibilidade dos edifícios segundo a Lei 5744/2011 e a Norma NBR9050 implementada.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/20/2019
	1.6 - Ciclovias construídas.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
	1.7 - Novas vias implementadas.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/15/2019
						03/22/2019
	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	1.9 - Sinalização Semafórica	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração	Modify	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.9 - Sinalização Semafórica	contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Output	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.1 - Parques Lineares implementados.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
	2.1.1 - Parque Vitória implementado.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.1.2 - Parque Linear Morumbi implantado.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.1.3 - Parque Linear Santa Cruz implantado.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.1.4 - Parque Linear Santa Felicidade implantado.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.1.5 - Parque Linear Interlagos/Floresta implantado.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
	2.2.1 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Morumbi construído.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.2.2 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Cascavel Velho construído.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.2.3 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Santa Felicidade construído.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	2.2.4 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Interlagos/Floresta construído.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Alterações visando incorporar ajustes conforme alteração contratual e relatório semestral de progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	03/15/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity
