

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	RG-L1074	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/26/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/30/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Agua Negra Pass International Tunnel Structuring Program	<b>Loan Number</b>	3867/OC-RG, 3868/OC-RG
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Entidad Binacional Tunel de Agua Negra	<b>Sector/Subsector</b>	TR-FRA - TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
<b>Team Leader</b>	LEANO, JUAN MANUEL	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	REGIONAL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La operación no se ejecuta hasta el momento debido a que la operación todavía no es elegible.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1074	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

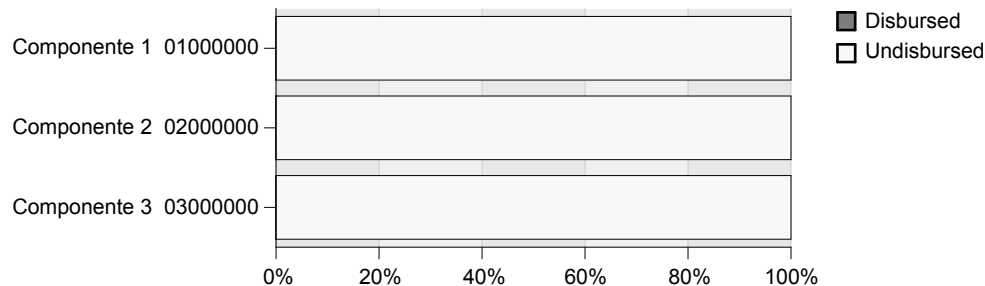

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Construcción del Túnel de Aguas Negras (TAN)

**Observation:** Medio de Verificación. Apertura del TAN al tránsito.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	EOP 2020
0.0	TAN construido	Unidad	0.00	2016	P		1.00	1.00
					P(a)		1.00	1.00
					A			
Details								
Means of verification: Apertura del Tunel al tránsito								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado 1. Licitación de diseño y construcción del TAN

**Observation:** Acta de adjudicación aprobada por el EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.0	Adjudicación de la licitación de diseño e inicio de construcción del TAN	unidad	0.00	2016	P	1.00	0.00	1.00
					P(a)	0.00	1.00	1.00
					A			
Details								
Means of verification: Acta de adjudicación aprobada por la EBITAN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 1:** Resultado 2. Capacidad del personal técnico de las vialidades de ambos países en temas de licitación y construcción de túneles y proyectos binacionales

**Observation:** Informes de realización de cursos y talleres de capacitación técnica de los funcionarios, aprobado por la EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
1.0	Número de funcionarios capacitados para trabajar en la licitación del Proyecto en cada una de las vialidades (DV y DNV)	unidad	0.00	2016	P	40.00	0.00	40.00
					P(a)		40.00	40.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes de realización de cursos y talleres de capacitación técnica de los funcionarios aprobado por el EBITAN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Apoyo a actividades conjuntas de estructuración y preparación del proyecto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Documentos de licitación del proyecto del túnel	unidad	P	0	1	0	8,200,000
			P(a)	0	1	0	8,200,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Apoyo a actividades específicas a las autoridades y organismos estatales incluyendo asesorías legales, técnicas y de fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Cursos de capacitación en auditoría técnica en materia de ejecución de obra realizados	cursos	P	1	4	445,000	1,780,000
			P(a)	0	4	0	1,780,000
			A	0	0	0	0
2.2	Actividades de capacitación en temas de tunelería, socioambiental, hídrico, geología y en materia institucional, financiero y legal, ejecutadas	cursos	P	4	12	1,800,000	5,650,000
			P(a)	0	12	0	5,650,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Elaboración de los diseños de ingeniería finales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Diseños finales del TAN realizados	Nº	P	0	1	0	23,370,000
			P(a)	0	1	0	23,370,000
			A	0	0	0	0
3.2	Estudios ambientales, hídricos y geológicos realizados	Nº	P	4	8	500,000	1,000,000
			P(a)	0	8	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

## Total Cost

Total Cost	P			2,745,000	40,000,000
	P(a)			0	40,000,000
	A			0	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
