

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1295	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile			
Operation Name	Environmental Sanitation Program for Ipojuca Basin	Loan Number	2901/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ESTADO DE PERNAMBUCO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	NERY, CLAUDIA REGINA BORGES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE PERNAMBUCO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O sistema de gestão ambiental e social apresentado pela UGP ao longo da missão demonstrou que o cliente tem dificuldades no gerenciamento dos requisitos ambientais da obra, além de questões relacionadas ao atendimento das políticas do Banco e da normativa ambiental nacional/local na supervisão de obras, que não está sendo cumprida de forma adequada. Além disso, os Planos Executivos de Reassentamento ainda não foram submetidos ao Banco para a aprovação, impossibilitando que se tenha uma informação assertiva sobre o quantitativo de famílias vulneráveis afetadas (as previsões iniciais de afetação indicavam 204 unidades em processo de avaliação e uma previsão de 94 novas unidades impactadas). O cronograma de obras já se encontra exíguo, colocando em risco a capacidade da Agência Executora cumprir a tempo as exigências da OP 710, incluindo a realização de atividades de pós reassentamento das famílias a serem impactadas pelo Programa.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1295	200,000,000	200,000,000	130,000,000	0	330,000,000	200,000,000	144,972,603.24	72.49%	55,027,396.76
Aggregated	200,000,000	200,000,000	130,000,000	0	330,000,000	200,000,000	144,972,603.24	72.49%	55,027,396.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

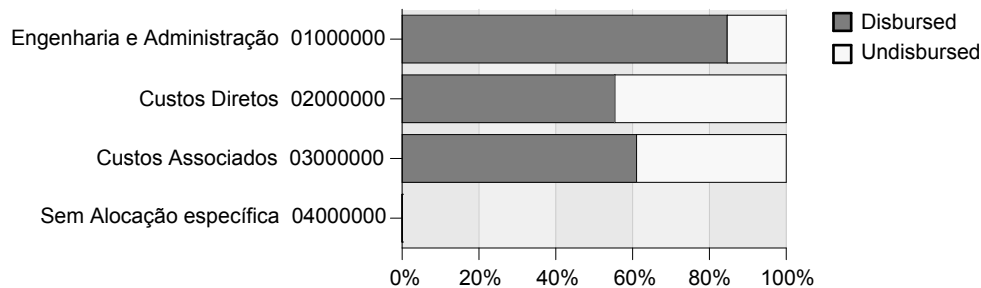

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Saneamento básico no Brasil melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das cidades de Caruaru e Gravatá.	mg/l	0.00	2010	P				3.00
					P(a)	3.00			3.00
					A	0.50	0.00		

Details

Means of verification: Informações oriundas da COMPESA e da SPRH - Agência Ambiental do Estado do Pernambuco.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca	kg/d	0.00	2012	P				21,000.00
					P(a)	21,000.00			21,000.00
					A	3,200.00	0.00		

Details

Means of verification: Unidade de Gerenciamento do Programa com base em informações da COMPESA.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficiência dos Serviços prestados pela COMPESA ampliada.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Habitacões com serviços contínuos de abastecimento de água.	Percentual	51.80	2010	P		80.00					100.00
					P(a)		80.00		100.00			100.00
					A	0.00	50.00		0.00	50.00		50.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à Unidade de Gerenciamento do Projeto.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Clientes satisfeitos com os serviços prestado pela COMPESA	Percentual	60.00	2011	P		65.00					75.00
					P(a)		65.00		75.00			75.00
					A	0.00	0.00		0.00			0.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas às UGP - IPOJUCA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.3	Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela COMPESA	reclamações/ 1000 usuários	80.00	2012	P		70.00					65.00
					P(a)		70.00		65.00			65.00
					A	0.00	69.46		0.00	36.45		65.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - Ipojuca

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Cobertura do saneamento na bacia do rio Ipojuca ampliada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos	# of households	0.00	2010	P	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00		143,000.00
					P(a)	0.00	4,107.00	17,737.00	7,737.00	94,202.00		105,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos	# of households	0.00	2010	A	0.00	1,860.00	1,201.00	6,519.00	1,227.00			10,807.00
-----	--	-----------------	------	------	---	------	----------	----------	----------	----------	--	--	-----------

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2010	P	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00		143,000.00
					P(a)	0.00	4,107.00	17,737.00	22,737.00	79,202.00		105,000.00
					A	0.00	1,860.00	1,201.00	6,519.00	1,227.00		10,807.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca	Litros por segundo	0.00	2012	P		150.00		250.00	461.00		461.00
					P(a)		48.70	253.70	300.00	380.00		380.00
					A	0.00	187.00	187.00	255.00	200.88		200.88

Details

Means of verification: Informações fornecidas à UGP pela COMPESA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Cobertura dos serviços de água potável na bacia do rio Ipojuca aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Volume de água consumida na cidade de Porto de Galinhas	l/hab/dia	80.00	2012	P		120.00					120.00
					P(a)			120.00	120.00			120.00
					A	0.00	0.00	97.60	120.00			217.60

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - IPOJUCA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.2	Amostras de água em Porto de Galinhas que cumprem com as normas nacionais de qualidade de água, segundo os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde - No 2914/2011.	Percentual	70.00	2012	P		80.00			90.00		90.00
					P(a)			80.00		90.00		90.00
					A	0.00	0.00	100.00	0.00	96.70		100.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP- Ipojuca

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.3	Lugares com serviço de abastecimento de água melhorado ou implantado	# of households	0.00	2013	P	15,000.00	15,000.00					30,000.00
					P(a)	0.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	90,000.00		120,000.00
					A	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	81,000.00		111,000.00

Details

Means of verification: Informações da COMPESA a UGP do Projeto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Qualidade socio ambiental na bacia do rio Ipojuca melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.1	Porcentagem de estações hidrometeorológicas reabilitadas e em funcionamento.	Percentual	0.00	2012	P		60.00					100.00
					P(a)		100.00					100.00
					A	0.00	100.00		0.00			100.00

Details

Means of verification: Informações fornecidas à UGP pela APAC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.2	Superfície às margens do rio Ipojuca e entorno de reservatórios reabilitados para proteção dos recursos hídricos.	hectares	0.00	2012	P		66.00					258.00
					P(a)			66.00	192.00			258.00
					A	0.00	0.00		0.00			0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informações da APAC transmitidas às UGP - Ipojuca

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.3	Porcentagem das cidades com permissão para lançamento de efluentes nos cursos d'água	Percentual	0.00	2012	P			20.00		60.00			60.00
					P(a)			20.00		60.00			60.00
					A	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			20.00
Details													
Means of verification: Informações da CPRH transmitidas às UGP - Ipojuca													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado.	Plano	P		1		4,912,000
			P(a)	0	1	136,557.11	6,520,464.91
			A	0	1	0	6,248,214.44
1.2	P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	Plano	P		1		13,402,000
			P(a)	0.1	4.96	568,366.36	12,891,582.29
			A	0.14	1	372,723.66	12,315,525.43

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Obras e Equipamentos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	Sistema	P		1		4,710,000
			P(a)	0	1	171,001.3	5,215,582.5
			A	0	1	8,314.4	4,945,877.57
2.2	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	Sistema	P		1		8,107,000
			P(a)	0	1	1,632,815.31	11,352,175.42
			A	0	0	759,264.47	6,236,941.57
2.3	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Sistema	P		1		24,808,000
			P(a)	0	1	2,006,673.74	14,598,740.04
			A	0	0	875,794.58	3,715,800.79
2.4	P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	Sistema	P		1		5,500,000
			P(a)	0	1	1,466,126.55	10,025,847.61
			A	0	0	644,239.52	1,958,466.38
2.5	P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	Sistema	P		1		17,779,000
			P(a)	0	1	497,405.14	5,869,835.11
			A	0	1	497,405.13	5,869,835.1
2.6	P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído	Sistema	P		1		14,256,000
			P(a)	0	1	0	9,409,229.28
			A	0	1	0	9,409,229.28
2.7	P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros concluído	Sistema	P		1		3,608,000
			P(a)	0	1	174,866.43	2,659,943.17
			A	0	1	174,866.43	2,659,943.17
2.8	P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravatá, Bezerro, Belo Jardim, Poção, Chá Grande, Primavera, Escada e Distrito de Mutuca (Pesqueira) elaborados elaborados	Projeto	P		7		4,450,000
			P(a)	4	7	638,947.17	3,893,780.42
			A	1	3	217,258.03	3,388,391.14
2.9	P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	Unidade	P		1		8,700,000
			P(a)	1	1	2,124,610.6	10,694,776.34
			A	0	0	287,538.74	8,033,767.56
2.10	P26: Adutora da Barragem de Serro Azul implantada	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	3,539,132.21	47,381,309.37
			A	0	0	1,947,023.53	31,444,085.68
2.11	P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	1,298,259.82	10,782,525.29
			A	0	0	508,217.76	610,768.76
2.12	P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	1,055,771.26	8,259,161.08
			A	1	1	996,054.06	8,199,443.88
2.13	P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	1,895,298.54	9,367,300.59
			A	0	0	572,095.82	2,988,085.68

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Melhoria Socioambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado	Estudo	P		1		1,000,000
			P(a)	1	1	137,003.58	232,902.39
			A	1	1	53,650.19	149,549
3.2	P17: Entorno de reservatórios recuperados	Hectares	P		250		5,160,000
			P(a)	24	66.6	309,830.79	959,939.14
			A	13	24.6	138,661.32	667,376.04
3.3	P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado	Estudo	P		1		1,000,000
			P(a)	0	1	380,450.98	777,249.23
			A	0	1	10,170.84	406,969.09
3.4	P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado.	Estudo	P		1		500,000
			P(a)	0	1	0	318,550.39
			A	0	1	0	318,550.39
3.5	P20: Telepluviômetros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos.	Equipamentos	P		140		970,000
			P(a)	0	140	0	970,266.72
			A	0	140	0	970,266.72
3.6	P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	Unidade de Gestão	P		1		350,000
			P(a)	2	2	37,787.91	166,784.66
			A	0	0	11,889.04	138,912.9
3.7	P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	Rede	P		1		950,000
			P(a)	0	1	1,422,000.81	2,659,058.93
			A	0	0	42,733.74	674,200.02
3.8	P24: Parques Urbanos Implantados	Parque	P		3		2,200,000
			P(a)	2	3	1,344,574.28	3,604,214.6
			A	0	0	224,354.9	855,735.07
3.9	P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado	Plano	P		1		2,340,000
			P(a)	0	1	71,102.76	1,064,771.3
			A	0	0	19,651.22	586,278.96

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Reconhecimento de Contrapartida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	P.29 Sistema de Saneamento da cidade de Tapetim concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	2,392,506.97
			A	0	1	54,962.21	2,447,469.18
4.2	P30: Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	5,025,096.13
			A	0	1	0	5,025,096.13
4.3	P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	3,284,685.87
			A	0	0	806,570.75	3,617,593.07
4.4	P.32: Adutora do Moxotó implantada	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	18,145,039.28
			A	0	1	0	18,145,039.28
4.5	P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 2a. etapa concluída	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	305,149.46
			A	0	1	16,638.77	321,788.23

Other Cost

	P26: Outros custos (Engenharia e Administração; Custos Concorrentes e Contingência)	P				31,000,000
		P(a)			1,279,012.23	109,527,601.86
		A			151,082.43	14,999,506.32
	Não Alocados	P				0
		P(a)			871,153.95	3,566,620.17
		A			481,981.11	1,318,833.03

Total Cost

	Total Cost	P				329,001,000
		P(a)			23,058,748.83	329,121,706.23
		A			9,873,142.65	165,866,555.57

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca	Ajuste de EOP A conforme orientação do ponto focal de WSA, não houve alteração da meta no Programa.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	WESNEYB	10/05/2020
	Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das cidades de Caruaru e Gravatá.	Ajuste de EOP A conforme orientação do ponto focal de WSA, não houve alteração da meta no Programa.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	WESNEYB	10/05/2020
Output	P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	WESNEYB	09/27/2020
	P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in	PAULAG	10/01/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output		condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.		the Financial P(a).		
	P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravatá, Bezerro, Belo Jardim, Poção, Chá Grande, Primavera, Escada e Distrito de Mutuca (Pesqueira) elaborados	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	WESNEYB	09/27/2020
	P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial	WESNEYB	09/27/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output		Objecção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.		P(a).		
	P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objecção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	WESNEYB	09/27/2020
	P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objecção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objecção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	WESNEYB	09/27/2020
	P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objecção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output		responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.				
	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	A reformulação do planejamento é resultado da suspensão das obras, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos, que impactam no mercado da construção civil, gerando dificuldades para as empresa no processo de retomada dos empreendimentos, pós paralisação. As contratadas estão encontrando dificuldades na remobilização de sua estrutura, além de ter que administrar o significativo aumento nos preços dos insumos. Como agravante, a proximidade do período eleitoral também tem gerado alguns inconvenientes com autoridades do poder municipal, que vêm dificultando a liberação de frentes de serviço em vias públicas. Adicionalmente informamos que como Acordo da Revisão de Carteira set/2020: Prorrogação do Prazo do último desembolso está condicionado à comprovação ao Banco até 10 de Janeiro de 2021: 1) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco até 18 de setembro de 2020 o Acordo firmado com a Empresa Saint-Gobain. 2) A Compesa se comprometeu apresentar ao Banco para Não Objeção, até 15 de outubro de 2020, o Distrato com o Consorcio Construtor da obra Adutora Serro Azul; 3) A nova licitação somente poderá ter início após a aprovação do Banco do Plano de Aquisições. 4) Contrato assinado e ordem de serviço para a Empresa responsável pela execução das obras remanescentes da Adutora Serro Azul; 5) Demonstração do alcance das metas físicas e financeiras para todas as ações e obras contidas no Replanejamento de 14 de julho de 2020, que correspondam a 70% da justificativa de gastos; e 6) Comprovação da contratação das aquisições para os meses de outubro e dezembro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/01/2020
	P8: Sistema de Saneamento da Cidade Arcoverde 2º Etapa concluído	Produto havia sido inativado em ciclo anteriores, mas não foi retidado. Para arrumar o check list colocamos o produto como inativo.	Modify Output	Inactivate Output	WESNEYB	10/07/2020
	P9: Sistema de Saneamento da Cidade de Arcoverde 1º Etapa concluído	Produto havia sido inativado em ciclo anteriores, mas não foi retidado. Para arrumar o check list colocamos o produto como inativo.	Modify Output	Inactivate Output	WESNEYB	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
