

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PN-L1109	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/22/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/08/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Panama City and Bay Sanitation Program II	<b>Loan Number</b>	3506/CH-PN, 3506/OC-PN
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
<b>Team Leader</b>	GARZONIO, OMAR DARIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Panama
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PANAMA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Se ha logrado mejorar satisfactoriamente el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las actividades previstas en la etapa de construcción. También se observa un buen nivel de desempeño y una adecuada capacidad gerencial por parte de la AE y de los contratistas involucrados en las obras (ambos Suez International S.A.S. como empresa constructora y Nippon Koei como firma supervisora). La AE ha sido certificada en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de estándares internacionales en las normas ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad) ISO 14001 (Gestión Ambiental), OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional). Ha realizado una satisfactoria gestión social con iniciativas exitosas innovadoras como el proyecto piloto denominado Mi Comunidad Saludable en donde han manejado satisfactoriamente a las partes interesadas y a las quejas y reclamos recibidos durante la construcción se han manejado satisfactoriamente y se encuentran las mismas cerradas y sin reporte de nuevas quejas y/o reclamos		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1109	110,000,000	110,000,000	71,370,000	0	181,370,000	110,000,000	45,441,163.7	41.31%	64,558,836.3
<b>Aggregated</b>	<b>110,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>71,370,000</b>	<b>0</b>	<b>181,370,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>45,441,163.7</b>	<b>41.31%</b>	<b>64,558,836.3</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

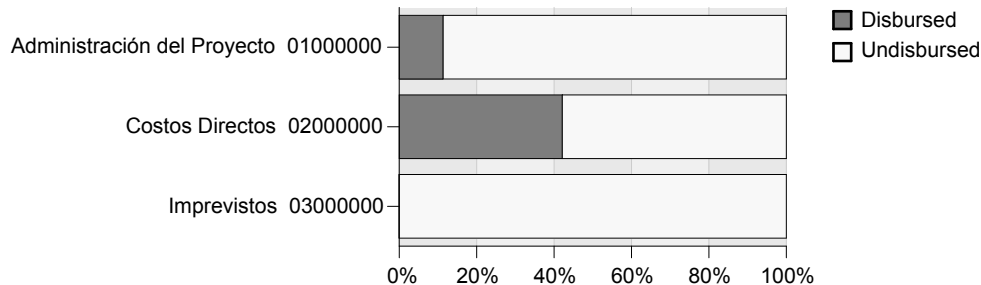

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Capacidad de tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá incrementada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
0.0	Caudal de aguas residuales tratado en el área metropolitana de la ciudad de Panamá	m3/s	1.90	2016	P				5.10	5.10
					P(a)				5.10	
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de gestion operacional de la UCP. Informe de evaluacion final.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
0.1	Hogares en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá cuyas aguas residuales son tratadas por la PTAR Juan Díaz	Households (#)	104,878.00	2016	P				235,018.00	235,018.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
0.2	Hogares en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá cuyas aguas residuales son tratadas por la PTAR Juan Díaz	%	25.70	2016	P				57.70	57.70
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
0.3	Calidad de agua de la Bahía de Panamá mejorada	Coliformes fecales (en UFC/100ml)	6,200.00	2016	P				200.00	200.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Valores en base al punto de muestreo No. S-3 (Paitilla) Línea base (Infraeco). Informe de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Calidad de agua de ríos y quebradas mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.0	Calidad de agua del río Matasnillo mejorada, según normas nacionales	ICA	15.00	2016	P				70.00	70.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Valores en base al punto de muestreo No. E-7, Línea Base (Infraeco). Informe de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.1	Calidad de agua del río Curundú mejorada, según normas nacionales	ICA	25.00	2016	P				70.00	70.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Valores en base al punto de muestreo No. E-6, Línea Base (Infraeco). Informe de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Sistema de saneamiento a cargo de la UCP operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.0	Obras complementarias del segundo módulo operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	%	0.00	2016	P				100.00	100.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de anual de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	Segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	Planta	0.00	2016	P					1.00	1.00
					P(a)						
					A			0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de anual de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.2	Principales procesos de gestión certificados con normas internacionales de calidad	Procesos	0.00	2016	P				3.00	3.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Normas ISO 9001:2008, 14001:2004 Y las OHSAS 18001:2007

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Efluente de entrada a la PTAR con mayor carga orgánica

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.0	Carga orgánica promedio de efluente de entrada a la PTAR incrementada	DBO (mg/l)	104.00	2016	P				114.00	114.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de anual de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 4:** Banco de datos de calidad del agua disponible

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
4.0	Banco de datos de calidad del agua de la Bahía de Panamá disponible en el sitio web del MINSA	Banco de datos	0.00	2016	P			1.00		1.00
					P(a)					
					A		0.00			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informe de anual de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 5:** Estrategia de gestión del sitio RAMSAR cumple con legislación nacional

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
5.0	Estrategia para la gestión del sitio RAMSAR de la Bahía de Panamá aprobada por el Ministerio de Ambiente de Panamá	Estrategia	0.00	2016	P					1.00	1.00
					P(a)						
					A			0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de anual de gestión operacional de la UCP. Informe de evaluación final.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Construcción del segundo módulo de tratamiento de la PTAR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	PTAR Juan Díaz ampliada - II módulo	Planta	P	1	1	91,437,479	160,285,000
			P(a)	0	1	207,226.81	144,901,856
			A	0	0	207,226.81	71,835,830.81
1.2	PTAR operando	Millones de US\$	P	50	50	50,000,000	50,000,000
			P(a)	50	100	1,338,082.36	56,484,680
			A	0	0	1,338,082.36	17,276,764.59

## Component Nbr. 2 Obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Sistema de colectoras Paitilla y Punta Pacifica construidos	Sistema	P		2		19,599,999
			P(a)	0	2	8,269,517	27,869,516
			A	0	2	8,220,983.31	27,820,982.31
2.2	Sistema de colectoras Matasnillo construido	Sistema	P	1	1	26,627,253	36,300,000
			P(a)	0	1	512,708.79	78,838,846
			A	0	0	512,708.79	2,552,635.54
2.3	Sistema de colectoras Bella Vista y Calidonia, Estudios Realizados	Estudios	P	1	1	35,241,030	36,200,000
			P(a)	0	1	0	2,600,100
			A	0	0	0	0
2.4	Rehabilitación de Colectora Lajas	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		15,883,451
			A		0		0
2.5	Construcción de la Colectora del Río Juan Díaz	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		7,900,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Manuales, procedimientos e instructivos para la UCP desarrollados e implementados	Documento	P	2	77	216,000	1,500,000
			P(a)	0	68	23,074.55	438,340
			A	0	65	0	81,597.57
3.2	Actividades de capacitación e implantación del SIG desarrolladas	Actividad	P	1	7	899,600	2,000,000
			P(a)	0	7	0	400,000
			A	0	6	0	269,824.06
3.3	Estrategia para la reducción del consumo de agua elaborada	Estrategia	P		1		200,000
			P(a)	0	1	0	540,000
			A	0	0	0	0
3.4	Actividades de implementación de la estrategia de reducción de consumo de agua y la protección de ríos y quebradas a cargo de la UCP ejecutadas	Actividad	P	3	3	1,500,000	2,000,000
			P(a)	0	3	0	360,000
			A	0	0	0	0
3.5	Programa de monitoreo de calidad de agua de ríos, quebradas y Bahía de Panamá, implementado	Programa	P	1	1	903,784	2,000,000
			P(a)	1	2	313,522	2,000,000
			A	1	1	59,821.98	1,072,188.15
3.6	Estrategia para la gestión del sitio RAMSAR de la Bahía de Panamá implementada	Plan	P	1	1	1,700,000	1,700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A	0	0	0	0
3.7	Programa de comunicación y sensibilización para el uso racional de agua implementado	Programa	P	1	1	2,137,853	2,200,000
			P(a)	0	1	0	1,410,359
			A	0	0	2,054.4	186,749.96

## Other Cost

Administración	P			4,905,700	13,300,000
	P(a)			18,284.98	759,217
	A				604,260.3
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera / Contable	P			146,000	365,000
	P(a)			55,442.37	229,930.37
	A			28,350	79,650
Monitoreo del Programa	P			225,000	225,000
	P(a)			0	0
	A			0	0
Evaluación Intermedia del Programa	P				20,000
	P(a)			13,704.63	13,704.63
	A			13,704.63	13,704.63
Evaluación Final del Programa	P			40,000	40,000
	P(a)			0	40,000
	A			0	0
Imprevistos	P			7,135,000	7,135,000
	P(a)			0	0
	A			0	0

## Total Cost

Total Cost	P			228,413,652	341,370,000
	P(a)			10,751,563.49	341,370,000
	A			10,382,932.28	121,794,187.92



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades de capacitación e implantación del SIG desarrolladas	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó la meta de avance financiero porque las actividades de capacitación finalizarán en 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Actividades de implementación de la estrategia de reducción de consumo de agua y la protección de ríos y quebradas a cargo de la UCP ejecutadas	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó la meta de avance financiero porque el producto se culminará al final del proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Construcción de la Colectora del Río Juan Díaz	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, donde se acordó que debido al cambio de prioridades y disponibilidad de fondos por la cancelación de otros productos, se solicitó al Banco incluir este producto en el alcance del programa y aprobar su financiamiento. Este contrato inició su construcción bajo el programa 1719/OC-PN-1 y está actualmente en ejecución.  Esta decisión está debidamente documentada en la minuta de la reunión, la cual adjuntamos.	Create Output	N/A	ARACELISA	10/07/2020
	Estrategia para la gestión del sitio RAMSAR de la Bahía de Panamá implementada	Se modificó la meta de avance financiero porque recién se están preparando los documentos para iniciar el proceso de contratación; se espera tener el producto completado al final del proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Estrategia para la reducción del consumo de agua elaborada	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó la meta de avance físico y financiero porque el producto se culminará al final del proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARACELISA	10/06/2020
	Manuales, procedimientos e instructivos para la UCP desarrollados e implementados	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  En cuanto a la información histórica, en ese mismo ejercicio de revisión se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.  Se modificó la meta de avance financiero porque se reprogramó la entrega del producto para 2021, corresponde al proceso de recertificación de ISO.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
				Modify Physical Historical Actual	ARACELISA	10/07/2020
PTAR	PTAR Juan Díaz ampliada - II módulo	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se ajustó el monto del producto al valor actual del contrato USD 144.9 millones. Se ajustó el monto 2020 ya que, debido a las restricciones presupuestarias por la crisis del Covid-19, solo se ha pagado este año USD 207,226; no se esperan pagos adicionales durante el año. Se reprogramaron los pagos 2021-2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	PTAR operando	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se incluyó en el alcance el monto de la supervisión de la obra, por lo que el nuevo monto estimado del producto es de USD 56.5 millones. En 2020, el P(a) actualizado corresponde al monto se ha pagado USD 1.3 millones; no se proyectan pagos adicionales debido a las restricciones presupuestarias. Se	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	PTAR operando	reprogramaron los pagos de los próximos años.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARACELISA	10/06/2020
	Programa de comunicación y sensibilización para el uso racional de agua implementado	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó la meta de avance financiero porque el producto se culminará al final del proyecto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Programa de monitoreo de calidad de agua de ríos, quebradas y Bahía de Panamá, implementado	Se modificó la meta de avance físico porque se harán monitoreos de calidad de agua cada año hasta el final del proyecto.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARACELISA	10/06/2020
	Rehabilitación de Colectora Lajas	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, donde se acordó que debido al cambio de prioridades de las autoridades gubernamentales, este producto se incorpora a la Matriz de Resultados del Programa. Se incluyen los "Estudios Topográficos, Pruebas de Laboratorio y Seguimiento Socio Ambiental para el Proyecto de Rehabilitación de la Colectora Lajas" y las obras para la "Rehabilitación de la Colectora Lajas". Esta decisión está debidamente documentada en la minuta de la reunión, la cual adjuntamos.	Create Output	N/A	ARACELISA	10/07/2020
	Sistema de colectora Matasnillo construido	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó la meta de avance financiero porque se reprogramó la entrega del producto para 2022. Este producto incluye la construcción de la colectora principal de Matasnillo y la construcción de las subcolectoras de Matasnillo y áreas aledañas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Sistema de colectoras Bella Vista y Calidonia, Estudios Realizados	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, para armonizar el PMR con el avance real del programa que se vio afectado por el contexto del COVID-19.  Se modificó el nombre del producto así como la unidad de medida porque solo se realizarán estudios por USD 2.6 millones. Se modificó la meta de avance financiero conforme a la nueva proyección de pagos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/07/2020
				Modify Output name	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Unit of Measure	ARACELISA	10/06/2020
	Sistema de colectoras Paitilla y Punta Pacifica construidos	La meta de avance financiero para 2020 fue ajustada luego de un ejercicio de revisión efectuado entre el Banco y la Unidad Ejecutora el 30-sept-20. Se actualizó el monto programado para 2020 para incluir los pagos pendientes del contrato. El presupuesto total del producto (obra y supervisión) es de USD 27.9 millones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/06/2020
	Sistema de colectoras de Chanis construido	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, donde se indicó que este producto no se realizará con el programa, por lo que se procedió a inactivarlo. Esta decisión está debidamente documentada en la minuta de la reunión, la cual adjuntamos.	Modify Output	Inactivate Output	ARACELISA	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARACELISA	10/07/2020
	Sistema de colectoras de Curundú construido	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, donde se indicó que este producto no se realizará con el programa, por lo que se procedió a inactivarlo. Esta decisión está debidamente documentada en la minuta de la reunión, la cual adjuntamos.	Modify Output	Inactivate Output	ARACELISA	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a	ARACELISA	10/07/2020

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de colectoras de Curundú construido	El 30-sept-2020 se realizó un ejercicio de revisión entre el Banco y la Unidad Ejecutora, donde se indicó que este producto no se realizará con el programa, por lo que se procedió a inactivarlo. Esta decisión está debidamente documentada en la minuta de la reunión, la cual adjuntamos.	Modify Output	change in the Physical P(a).		

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Project Monitoring & Evaluation
