

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PN-G1003	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/22/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/07/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Rural and Indigenous Water and Sanitation Program in Panama	<b>Loan Number</b>	GRT/WS-13329-PN
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
<b>Team Leader</b>	GARZONIO, OMAR DARIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Investment Grants	<b>Country</b>	Panama
<b>Lending Instrument</b>		<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>			


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	El programa sigue con clasificación Insatisfactoria hasta que haya una resolución del caso judicial en curso.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-G1003	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	15,000,000	7,500,000	6,746,834.89	89.96%	753,165.11
<b>Aggregated</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>6,746,834.89</b>	<b>89.96%</b>	<b>753,165.11</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

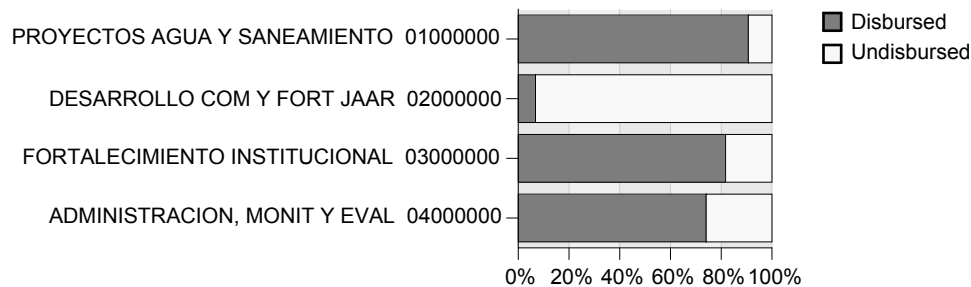

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incremento del acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas de la región de Panamá Este, la Provincia de Darién y la Comarca Guna Yala.

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
1.1	Cobertura de agua potable a nivel nacional	%	92.90	2012	P			93.30
					P(a)			93.30
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
1.2	Cobertura de saneamiento a nivel nacional	%	94.50	2012	P			94.90
					P(a)			94.90
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.1	Hogares indígenas con acceso domiciliar a agua potable en zona de intervención	# of households	4,681.00	2012	P	0.00	0.00	876.00	2,139.00				3,015.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	781.00	1,690.00	500.00	1,756.00	3,015.00
					A		0.00	0.00	277.00	514.00	468.00	475.00	1,734.00

#### Details

Means of verification: Informes semestrales del MINSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Indigenous				P									0.00
					P(a)									0.00
					A				277.00	514.00	468.00			0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.2	Hogares indígenas con solución de saneamiento en zona de intervención	# of households	1,560.00	2012	P	0.00	0.00	876.00	2,139.00				3,015.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	781.00	1,690.00	1,000.00	1,847.00	3,015.00
					A		0.00	0.00	0.00	773.00	395.00	184.00	1,352.00

#### Details

Means of verification: Informes semestrales del MINSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Indigenous				P									0.00
					P(a)									0.00
					A					773.00	395.00			0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.3	Hogares no indígenas con acceso domiciliar a agua potable en zona de intervención	# of households	411.00	2012	P	0.00	0.00	146.00	372.00				518.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	319.00	518.00
					A		0.00	0.00	0.00	94.00	105.00	75.00	274.00

#### Details

Means of verification: Informes Semestrales del MINSA

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No										
		African descendant				P									0.00	
						P(a)									0.00	
						A						94.00	105.00			0.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021		
1.4	Hogares no indígenas con solución de saneamiento en zona de intervención	# of households	538.00	2012	P	0.00	0.00	146.00	372.00					518.00		
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	440.00	365.00	518.00		
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	75.00		153.00		
Details																
Means of verification: Informes Semestrales del MINSA																
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No										
		African descendant				P									0.00	
						P(a)										0.00
						A						0.00	78.00			0.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021		
1.5	Consumo de agua (litros/persona/día) en comunidades rurales (zona de intervención)	litros/persona/día	16.00	2012	P	0.00	0.00	120.00	120.00					240.00		
					P(a)	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	174.00	240.00		
					A		0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	50.00		66.00		
Details																
Means of verification: Evaluación Económica Ex-post																
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No										
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021		
1.6	Costo de provisión de agua a un hogar típico (US\$/m3) en zona de intervención	US\$/m3	6.19	2012	P	0.00	0.00	0.00	0.50					0.50		
					P(a)				0.00	0.50	0.50	0.00		0.50		
					A		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		0.50		
Details																
Means of verification: Evaluación Económica Ex-post																
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No										

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.7	Cobertura de agua potable en zona de intervención	%	58.80	2012	P	0.00	0.00	69.00	99.00				168.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	26.00	74.00	99.00	0.00	58.80
					A		0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	58.80

#### Details

**Means of verification:** Informe MINSA sobre datos censales.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.8	Cobertura de Saneamiento en zona de intervención	%	24.20	2013	P	0.00	0.00	36.00	65.00				101.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	65.00	0.00	38.20
					A		0.00	0.00	0.00	24.20	14.00		38.20

#### Details

**Means of verification:** Informe MINSA sobre la base de datos censales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.9	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	2013	P	0.00	0.00	1,022.00	2,511.00					3,533.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	781.00	2,335.00	1,000.00	2,287.00	1,812.00	3,533.00
				A		0.00	0.00	0.00	773.00	473.00	475.00		1,721.00

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales del MINSA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indigenous				P								0.00
					P(a)					1,954.00	798.00		798.00
					A				0.00	0.00	395.00		0.00

**Outcome Nbr. 2:** Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de JAAR y CCAS

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
2.1	% de sistemas construidos operando según	%	47.10	2012	P	0.00	0.00	75.00	75.00				150.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	especificaciones técnicas de diseño	%	47.10	2012	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	17.00	12.00	75.00
					A		0.00	0.00	0.00	53.00	5.00	5.00		63.00

#### Details

**Means of verification:** Informes Semestrales del MINSA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
2.2	% de sistemas contruidos financieramente sostenibles	%	47.10	2012	P	0.00	0.00	75.00	75.00					150.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	14.00	4.00	75.00
					A		0.00	0.00	0.00	53.00	8.00	10.00		71.00

#### Details

**Means of verification:** Informes Semestrales del MINSA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
2.3	% de JAARs con al menos una mujer en su junta directiva	%	0.00	2012	P	0.00	0.00	66.00	66.00					66.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	22.00	66.00	66.00	0.00		66.00
					A		0.00	0.00	66.00	66.00				

#### Details

**Means of verification:** Informes Semestrales del MINSA.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Fortalecimiento Institucional del MINSA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
3.1	Sistemas de agua en zona de intervencion monitoreados en tiempo real a traves del sistema SIASAR	%	0.00	2012	P	0.00	0.00	25.00	75.00					100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00		100.00
					A		0.00	0.00	25.00	75.00	0.00			100.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes SIASAR

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Sistema de agua potable construidos nuevos	Sistemas	P		44		5,736,000
			P(a)	2	23	575,457.37	5,601,644.95
			A	0	18	340,922.36	4,535,263.95
1.2	Soluciones de saneamiento construidas nuevas	Soluciones (caseta sanitaria)	P		3,847		6,397,000
			P(a)	74	1,755	1,022,041.12	6,230,340.42
			A	0	1,454	776,618.7	4,441,915.79

## Component Nbr. 2 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de JAAR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	JAAR's constituidas	JAAR	P		44		34,000
			P(a)		44		28,913.3
			A		44		28,913.3
2.2	Miembros de las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento capacitados	Personas	P		15		38,000
			P(a)		20		35,045.35
			A		20		14,658.35
2.3	Miembros de las JAAR's capacitados en operación, mantenimiento y gestión empresarial	Personas	P		1,100		501,000
			P(a)		1,100		288,628.63
			A		1,100		86,449.71
2.4	Miembros de las JAAR's capacitados en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		1,100		40,000
			P(a)		1,261		70,000
			A	0	1,100		0

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento Institucional del MINSA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) constituidos	Departamentos	P		3		377,000
			P(a)		3	36,940	612,002.5
			A		3	21,740	574,002.5
3.2	Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) equipados	Departamentos	P		3		616,000
			P(a)		3	5,958	285,848.35
			A		3		279,890.35
3.3	Plan de Comunicación del Programa elaborado	Plan	P		1		57,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0		0
3.4	SIASAR en operación	Sistema	P		1		278,000
			P(a)		1	11,650.32	115,518.93
			A		1	2,427.35	67,295.96
3.5	Técnicos de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) capacitados en gestión de proyectos y aspectos técnicos de APS	Persona	P		0		0
			P(a)		100	154,700	781,461.2
			A		100	103,500	660,661.2

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Administración, monitoreo y evaluación, auditoría

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación, auditoría	P				926,000
		P(a)			163,963.02	950,596.37
		A			85,670.26	814,618.78

Total Cost

	Total Cost	P				15,000,000
		P(a)			1,970,709.83	15,000,000
		A			1,330,878.67	11,503,669.89



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) constituidos	El producto está físicamente culminado, no obstante se tienen pagos pendientes de algunos contratos y cuentas que están en revisión. Por esta razón se tuvieron que revisar las metas. En cuanto a la información histórica, luego de hacer un ejercicio de revisión con la unidad ejecutora en octubre 2020, se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) equipados	El producto está físicamente culminado, no obstante se tienen pagos pendientes de algunos contratos y cuentas que están en revisión. Por esta razón se tuvieron que revisar las metas. En cuanto a la información histórica, luego de hacer un ejercicio de revisión con la unidad ejecutora en octubre 2020, se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	JAAR's constituidas	La meta de avance financiero para 2020 fue ajustada luego de un ejercicio de revisión efectuado entre el Banco y la Unidad Ejecutora el 2-oct-20, para armonizar el PMR con la ejecución real del programa que se vio afectada por el contexto del COVID-19. En cuanto a la información histórica, en ese mismo ejercicio de revisión se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	Miembros de las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento capacitados	La meta de avance financiero para 2020 fue ajustada luego de un ejercicio de revisión efectuado entre el Banco y la Unidad Ejecutora el 2-oct-20, para armonizar el PMR con la ejecución real del programa que se vio afectada por el contexto del COVID-19. En cuanto a la información histórica, en ese mismo ejercicio de revisión se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	Miembros de las JAAR's capacitados en educación sanitaria y ambiental	El producto había sido completado en su totalidad en 2018; sin embargo, debido a la crisis sanitaria como resultado de la pandemia por Covid-19 se ha ampliado el alcance del producto 2.4 con lo cual se capacitarán 161 miembros directivos de las JAARs en 2021. La nueva meta EOP del producto 2.4 será 12161 personas capacitadas.  El producto 2.4 se completó inicialmente con aporte del presupuesto de inversiones del MINSA; por ello no se registran pagos en el avance real. Sin embargo, se ha estimado un presupuesto de USD 70mil de aporte externo para las capacitaciones del producto 2.4 en 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARACELISA	10/06/2020
	Miembros de las JAAR's capacitados en operación, mantenimiento y gestión empresarial	En cuanto a la información histórica, luego de hacer un ejercicio de revisión con la unidad ejecutora en octubre 2020, se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	SIASAR en operación	El producto está físicamente culminado, no obstante se tienen pagos pendientes de algunos contratos y cuentas que están en revisión. Por esta razón se tuvieron que revisar las metas.  En cuanto a la información histórica, luego de hacer un ejercicio de revisión con la unidad ejecutora en	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial	PAULAG	10/07/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	SIASAR en operación	octubre 2020, se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.	Modify Output	P(a).		
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
	Sistema de agua potable construidos nuevos	<p>La meta original del producto eran 44 sistemas al final del proyecto (EOP); sin embargo, debido al incremento de costos, dicha meta se tuvo que reducir. La meta actualizada EOP será de 23 sistemas. Actualmente, se cuenta con 18 sistemas culminados y cinco (5) en ejecución, de los cuales estarán culminados dos (2) en 2020 (Isla Pino y Mamitupu) y los otros tres (3) en 2021 (Navagandi, Cangandi, Mandiyala)</p> <p>El sistema de Isla Máquina ya fue concluido y registrado en el avance del producto; sin embargo, en el 2021 se ejecutarán algunas mejoras. Físicamente, no cuenta como un sistema adicional, pero financieramente sí se considerarán los pagos adicionales.</p> <p>La meta de avance financiero para 2020 fue ajustada luego de un ejercicio de revisión efectuado entre el Banco y la Unidad Ejecutora el 2-oct-20, para armonizar el PMR con la ejecución real del programa que se vio afectada por el contexto del COVID-19.</p> <p>En cuanto a la información histórica, en ese mismo ejercicio de revisión se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/07/2020
	Soluciones de saneamiento construidas nuevas	<p>La meta EOP original del producto eran 3847 soluciones (casetas sanitarias); sin embargo, ya que estas soluciones guardan relación con la cantidad de sistemas de agua potable que se construyeran en el Producto 1.1 se vio afectada reduciendo la cantidad a 1755.</p> <p>Actualmente, se trabaja en 301 soluciones sanitarias distribuidas de la siguiente manera: para entrega en 2020, 60 en Isla Pino y 14 en Mamitupu; para entrega en 20201, 80 en Navagandi, 93 en Cangandi y Mandiyala, 54 en Wacuco Colonia).</p> <p>La meta de avance financiero para 2020 fue ajustada luego de un ejercicio de revisión efectuado entre el Banco y la Unidad Ejecutora el 2-oct-20, para armonizar el PMR con la ejecución real del programa que se vio afectada por el contexto del COVID-19.</p> <p>En cuanto a la información histórica, en ese mismo ejercicio de revisión se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/07/2020
	Técnicos de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R) capacitados en gestión de proyectos y aspectos técnicos de APS	<p>El producto está físicamente culminado, no obstante se tienen pagos pendientes de algunos contratos y cuentas que están en revisión. Por esta razón se tuvieron que revisar las metas.</p> <p>En cuanto a la información histórica, luego de hacer un ejercicio de revisión con la unidad ejecutora en octubre 2020, se reveló que había inconsistencias en el reporte de la información histórica, por lo tanto se procedió a hacer el ajuste en el sistema. Estos ajustes fueron debidamente documentados mediante Minuta de Reunión entre el Banco y la Unidad Ejecutora.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
				Modify Financial Historical Actual	ARACELISA	10/06/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Project Monitoring & Evaluation
