


ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Capital Ordinario	Capital Chino	TOTAL BID	Aporte Local	Costo Total	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Contratación	Método de Adquisición Nacional	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente
0		PEP Componente 1			1089 days	Mon 1/4/16	Tue 4/7/20	\$20,000,003.25	\$39,999,999.21	\$60,000,002.46	\$7,200,000.30	\$67,200,002.76						
1	1	Componente 1. Expansión y reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión			1089 days	Mon 1/4/16	Tue 4/7/20	\$20,000,003.25	\$39,999,999.21	\$60,000,002.46	\$7,200,000.30	\$67,200,002.76						
2	1.6	Sistema de Transmisión Milagro Babahoyo Energizado	1		949 days	Mon 1/4/16	Tue 9/24/19	\$17,586,501.60	\$0.00	\$17,586,501.60	\$2,110,380.19	\$19,696,881.79						
69	1.7	Sistema de Transmisión Quevedo - San Gregorio - San Juan Energizado	1		1088 days	Mon 1/4/16	Mon 4/6/20	\$0.00	\$33,384,550.51	\$33,384,550.51	\$4,006,146.06	\$37,390,696.57						
160	1.8	Ampliación Subestación Posorja 138/69 kV, 33 MVA Energizado	1		1028 days	Mon 1/4/16	Mon 1/13/20	\$2,413,501.65	\$6,615,448.70	\$9,028,950.35	\$1,083,474.04	\$10,112,424.39						
239		Fin de Componente	238,159,68		1 day	Tue 4/7/20	Tue 4/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
240	3	Administración			953 days	Fri 7/15/16	Tue 4/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
241	3.10	Firma de Contrato			0 days	Fri 7/15/16	Fri 7/15/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
242	3.11	Elegibilidad Total	241		40 days	Fri 7/15/16	Fri 9/9/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
243	3.3	Fin de Componente 1	239		0 days	Tue 4/7/20	Tue 4/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR	Duration	Start	Finish	Fondo Coreano	Aporte Local	Costo Total	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Contratación	Método de Adquisición Nacional	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente
0		PROGRAMA PLAN DE INVERSIONES EN APOYO AL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR				1178.13 days?	Thu 12/12/13	Mon 8/13/18	\$9,439,000.00	\$1,132,680.60	\$10,571,680.60						
1	2	Componente II. Expansión y modernización del SND				1178.13 days	Thu 12/12/13	Mon 8/13/18	\$9,439,000.00	\$1,132,680.60	\$10,571,680.60						
768	3	Administración				94.13 days?	Mon 4/4/16	Mon 8/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
769	3.10	Inicio				0 days	Mon 4/4/16	Mon 4/4/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
770	3.14	Firma de Contrato				1 day?	Fri 7/15/16	Fri 7/15/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
771	3.11	Elegibilidad Total	770			10 days	Mon 7/18/16	Fri 7/29/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
772	3.12	Equipo de Gestión	771			20 days	Mon 8/1/16	Mon 8/29/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
773	3.13	Fin Proyecto	767			0 days	Mon 8/13/18	Mon 8/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

[illegible]

[illegible]

Page 2

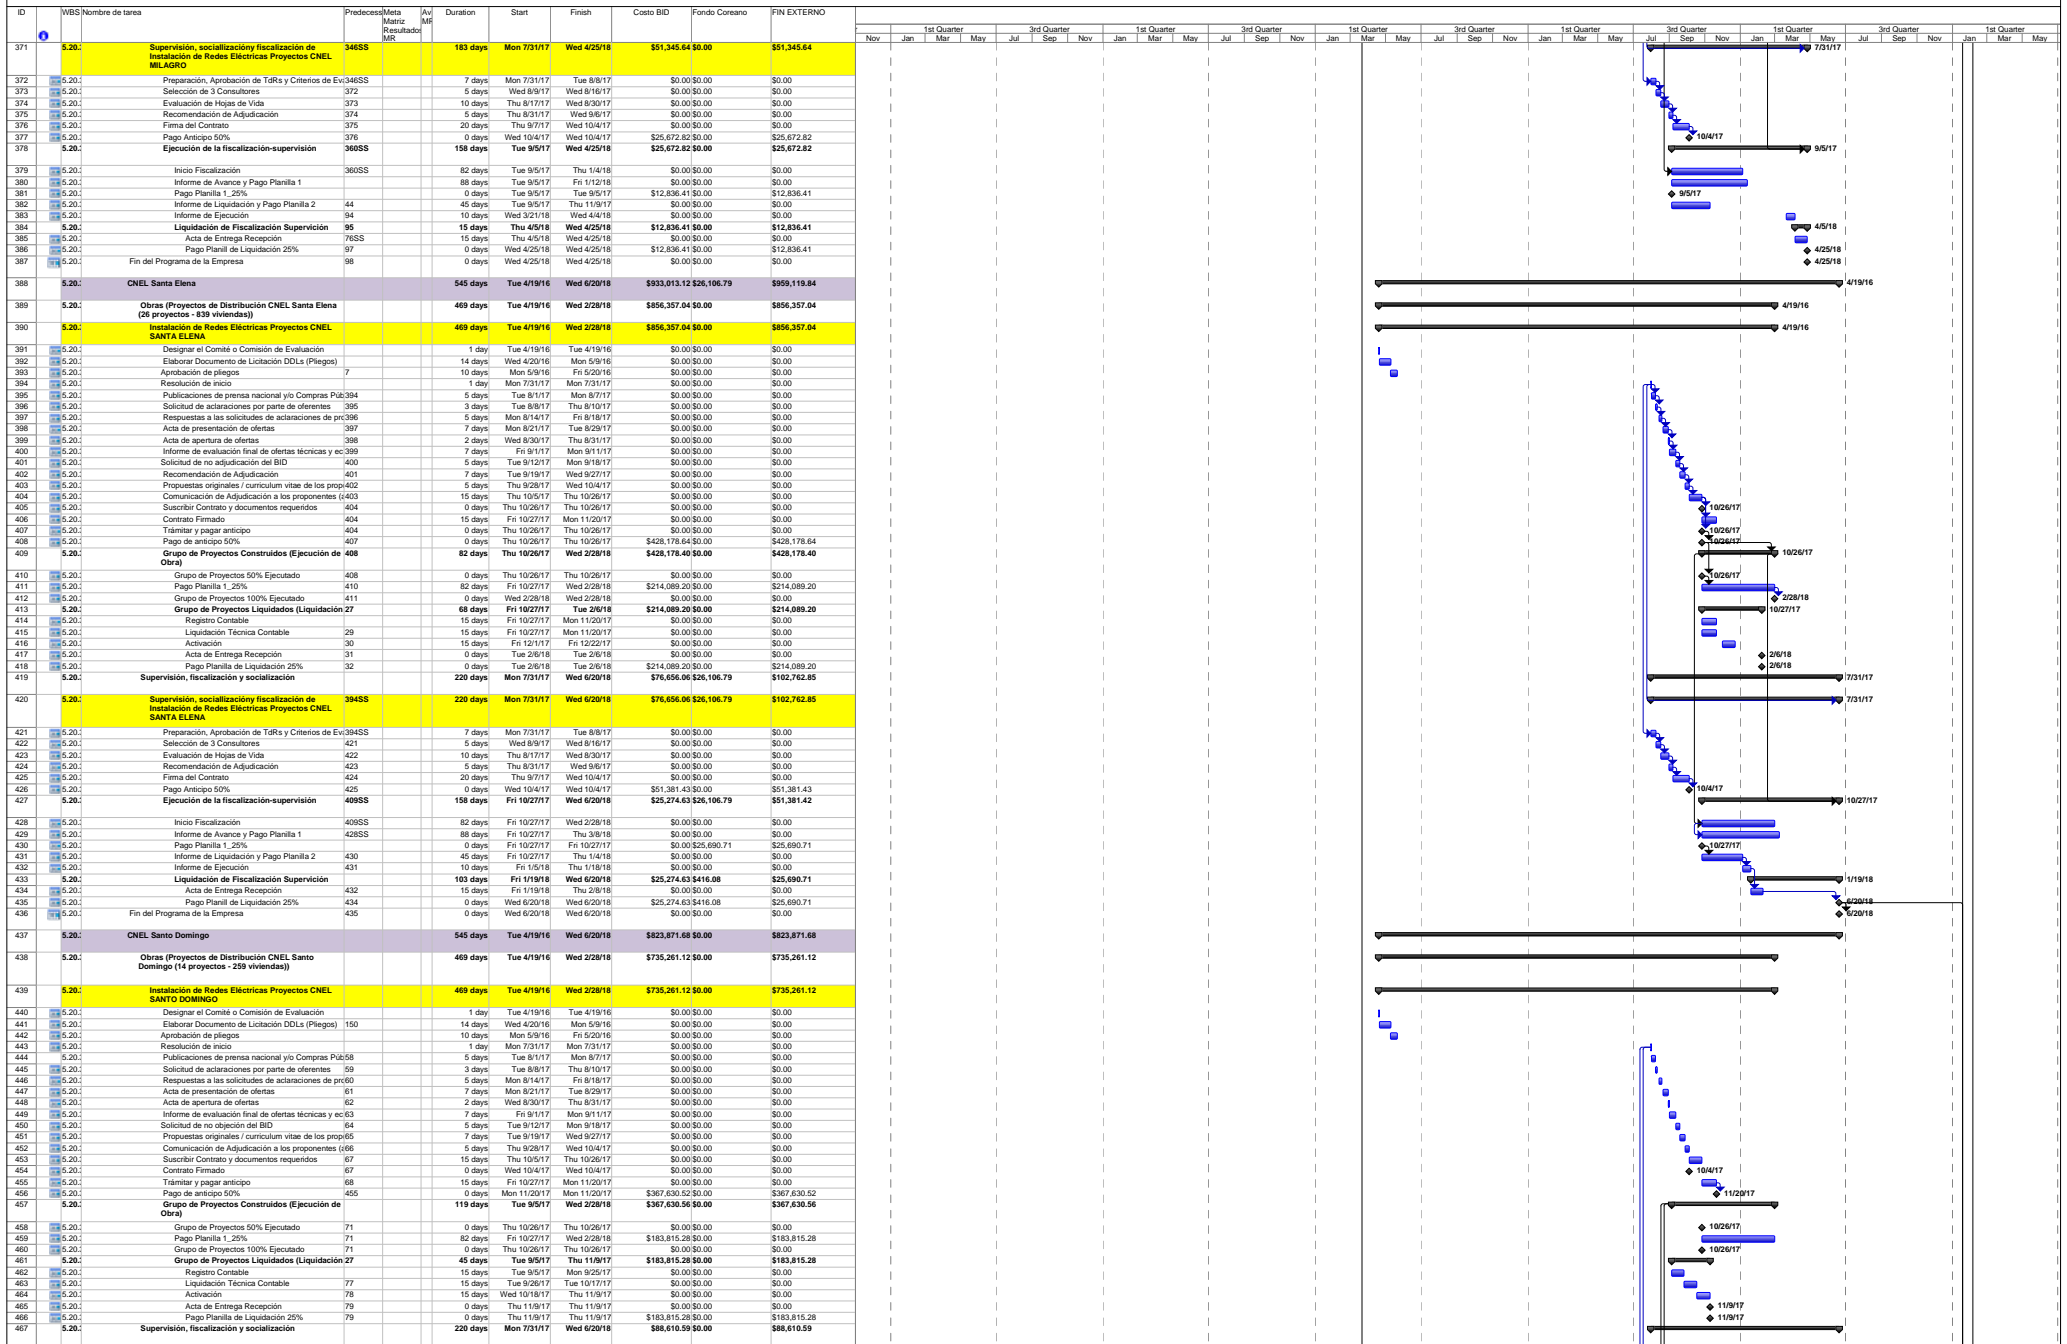

[illegible]

[illegible]

[illegible]


WBS/Nombre de tarea		Predecesor/ Meta Matriz Resultado/ MR	Av MS	Duration	Start	Finish	Costo BID	Fondo Coreano	FIN EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										1st Quarter				3rd Quarter				1st Quarter				3rd Quarter				1st Quarter				3rd Quarter				1st Quarter				3rd Quarter				1st Quarter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
852	5.20. Supervisión, socialización y fiscalización de instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE SUR	827SS		306 days	Mon 7/31/17	Wed 10/17/18	\$46,449.71 \$0.00		\$46,449.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Método de Adquisición Nacional	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente
0		NUMERO Y NOMBRE DE PROYECTO				948 days	Thu 12/12/13	Thu 9/7/17	\$993,214.24	\$119,185.71	\$1,112,400.00						
1	2	C II.3 Electrificación Rural y Urbano marginal - FERUM				948 days	Thu 12/12/13	Thu 9/7/17	\$993,214.24	\$119,185.71	\$1,112,400.00						
2	2.8	Producto 1 Proyectos de Electrificación rural sin extensión de red EEASA / CNEL Sucumbios	1			948 days	Thu 12/12/13	Thu 9/7/17	\$993,214.24	\$119,185.71	\$1,112,400.00						
3	2.8.13	Inicio BID 3				0 days	Mon 4/4/16	Mon 4/4/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
4	2.8.11	Especificaciones Técnicas para implementación de sistemas PV elaboradas para EEA SA / EEQ - CNEL Sucumbios				3 days	Mon 4/4/16	Wed 4/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
5	2.8.11.2	Taller para la revisión y actualización de especificaciones técnicas homologadas con las empresas distribuidoras	3			3 days	Mon 4/4/16	Wed 4/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
6	2.8.11.4	Consecución de documento preliminar acordado con las Eds	5			0 days	Wed 4/6/16	Wed 4/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
7	2.8.14	Adquisición de Materiales para sistemas aislados fotovoltaicos				813 days	Thu 12/12/13	Thu 2/23/17	\$772,055.92	\$92,646.71	\$864,702.64 BI		LPI		EX ANTE	BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-BI-001	
8	2.8.14.47	Convenio EEA SA - EEQ	6			22 days	Thu 4/7/16	Fri 5/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
9	2.8.14.49	Actualización convenio de administración EEQ/CNEL Sucumbios	8			22 days	Mon 5/9/16	Wed 6/8/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
10	2.8.14.33	Elaboración de pliegos de licitación para compra de equipamiento	9			10 days	Thu 6/9/16	Wed 6/22/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
11	2.8.14.34	Entrega de términos y pliegos de referencia para no objeción del BID	10			10 days	Thu 6/23/16	Wed 7/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
12	2.8.14.35	Recibida la no objeción del BID a términos de referencia y pliegos	11			5 days	Thu 7/7/16	Wed 7/13/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
13	2.8.14.36	Transferencia de la documentación revisada para publicación a las distribuidoras	12			5 days	Thu 7/14/16	Wed 7/20/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
14	2.8.14.37	Convocatoria a proceso de licitación, publicación en la UNDB	13			3 days	Thu 7/21/16	Mon 7/25/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
15	2.8.14.38	Proceso de Licitación				149 days	Tue 7/26/16	Thu 2/23/17	\$308,822.40	\$0.00	\$308,822.40						
16	2.8.14.38.12	Proceso de Licitación (tiempo de preguntas)	14			10 days	Tue 7/26/16	Mon 8/8/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
17	2.8.14.38.13	Proceso de Licitación (tiempo de contestación de preguntas)	16			5 days	Tue 8/9/16	Tue 8/16/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
18	2.8.14.38.14	Tiempo para preparación de las ofertas (no se permite preguntas)	17			15 days	Wed 8/17/16	Tue 9/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
19	2.8.14.38.15	Fecha tope de presentación de las ofertas	18			2 days	Wed 9/7/16	Thu 9/8/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
20	2.8.14.38.16	Evaluación técnica económica de ofertas	19			10 days	Fri 9/9/16	Thu 9/22/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
21	2.8.14.38.17	Evaluación y comparación de ofertas remitida al BID para no objeción previo a la adjudicación del contrato	20			5 days	Fri 9/23/16	Thu 9/29/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
22	2.8.14.38.18	Adjudicación de los contratos	21			5 days	Fri 9/30/16	Thu 10/6/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
23	2.8.14.38.21	Suscripción de Contratos de suministro	22			20 days	Fri 10/7/16	Mon 11/7/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
24	2.8.14.38.22	Tiempo para la entrega del primer pago	23			10 days	Tue 11/8/16	Mon 11/21/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
25	2.8.14.38.24	Pago del anticipo	24			1 day	Tue 11/22/16	Tue 11/22/16	\$308,822.40	\$0.00	\$308,822.40						
26	2.8.14.38.23	Recepción de bienes	25			66 days	Wed 11/23/16	Thu 2/23/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
27	2.8.14.43	Taller de capacitación y certificación para instalación dirigido a técnicos de las empresas distribuidoras				1 day	Thu 12/12/13	Thu 12/12/13	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
28	2.8.14.44	Suscripción de acta entrega recepción	27			10 days	Fri 12/13/13	Thu 12/26/13	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
29	2.8.14.45	Proceso de Pago	28			15 days	Fri 12/27/13	Thu 1/16/14	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
30	2.8.14.46	Pago y cierre de contrato de suministros	29			1 day	Fri 1/17/14	Fri 1/17/14	\$463,233.52	\$92,646.71	\$555,880.23						
31	2.8.15	Instalación y puesta en funcionamiento de sistemas aislados fotovoltaicos para 2 empresas distribuidoras				212 days	Tue 11/8/16	Thu 9/7/17	\$221,158.36	\$26,539.00	\$247,697.36 OB		LPN		EX POST	BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-OB-001	
32	2.8.15.23	Elaboración de TDRs para la contratación de los servicios de instalación en 7 comunidades	23			10 days	Tue 11/8/16	Mon 11/21/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesores	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Método de Adquisición Nacional	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente
33	2.8.15.24	Elaboración de pliegos de licitación para la contratación del servicio	32			10 days	Tue 11/22/16	Mon 12/5/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
34	2.8.15.25	Consecución de no objeción por parte del BID a TDRs y pliegos elaborados	33			5 days	Wed 12/7/16	Tue 12/13/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
35	2.8.15.26	Transferencia a las empresas distribuidoras de los pliegos para su publicación	34			5 days	Wed 12/14/16	Tue 12/20/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
36	2.8.15.27	Convocatoria a proceso de licitación para instalación y puesta en funcionamiento	35			3 days	Wed 12/21/16	Fri 12/23/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
37	2.8.15.28	Proceso de licitación				62 days	Mon 12/26/16	Thu 3/23/17	\$88,463.34	\$0.00	\$88,463.34						
38	2.8.15.28.21	Proceso de Licitación (tiempo de preguntas)	36			5 days	Mon 12/26/16	Fri 12/30/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
39	2.8.15.28.22	Proceso de Licitación (tiempo de contestación de preguntas)	38			5 days	Mon 1/2/17	Fri 1/6/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
40	2.8.15.28.23	Tiempo previo a presentación de las ofertas (no se permite preguntas)	39			10 days	Mon 1/9/17	Fri 1/20/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
41	2.8.15.28.24	Presentación de las ofertas	40			1 day	Mon 1/23/17	Mon 1/23/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
42	2.8.15.28.25	Evaluación técnica económica de ofertas	41			10 days	Tue 1/24/17	Mon 2/6/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
43	2.8.15.28.26	Adjudicación del contrato	42			5 days	Tue 2/7/17	Mon 2/13/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
44	2.8.15.28.28	Suscripción de Contratos	43			20 days	Tue 2/14/17	Wed 3/15/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
45	2.8.15.28.29	Tiempo para la entrega del primer pago para servicios de instalación	44			5 days	Thu 3/16/17	Wed 3/22/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
46	2.8.15.28.30	Pago del anticipo	45			1 day	Thu 3/23/17	Thu 3/23/17	\$88,463.34	\$0.00	\$88,463.34						
47	2.8.15.29	Proceso de instalación de Sistemas Fotovoltaicos para 7 comunidades				118 days	Thu 3/23/17	Thu 9/7/17	\$132,695.02	\$26,539.00	\$159,234.02						
48	2.8.15.29.13	Ejecución de la instalación de sistemas FV				96 days	Thu 3/23/17	Mon 8/7/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
49	2.8.15.29.13.6	Instalación y capacitación de Sistemas Fotovoltaicos Grupo EEASA				96 days	Thu 3/23/17	Mon 8/7/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
50	2.8.15.29.13.6	COMUNIDAD WIRIRIMA	28,45			22 days	Thu 3/23/17	Mon 4/24/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
51	2.8.15.29.13.6	COMUNIDAD JUYINTSA	50			22 days	Tue 4/25/17	Thu 5/25/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
52	2.8.15.29.13.6	COMUNIDAD MANKU URKU	51			32 days	Fri 5/26/17	Mon 7/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
53	2.8.15.29.13.6	COMUNIDAD SANTO TOMAS	28,45			70 days	Thu 3/23/17	Fri 6/30/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
54	2.8.15.29.13.6	COMUNIDAD MARUPISHI	53			26 days	Mon 7/3/17	Mon 8/7/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
55	2.8.15.29.13.7	Instalación de Sistemas Fotovoltaicos Grupo EEQ / CNEL Sucumbios				58 days	Thu 3/23/17	Wed 6/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
56	2.8.15.29.13.7	Alto Punino	28,45			32 days	Thu 3/23/17	Tue 5/9/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
57	2.8.15.29.13.7	Apaika - Nenquepare	56			26 days	Wed 5/10/17	Wed 6/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
58	2.8.15.29.14	Proceso de Cierre de los contratos de instalación				117 days	Fri 3/24/17	Thu 9/7/17	\$132,695.02	\$26,539.00	\$159,234.02						
59	2.8.15.29.14.7	Cierre EEA SA				117 days	Fri 3/24/17	Thu 9/7/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
60	2.8.15.29.14.7	Fiscalización de los sistemas EEA SA	46			96 days	Fri 3/24/17	Tue 8/8/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
61	2.8.15.29.14.7	Entrega de documentación de cierre (manuales, fichas técnicas, otros)	60			1 day	Wed 8/9/17	Wed 8/9/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
62	2.8.15.29.14.7	Suscripción de actas entrega - recepción	61			5 days	Thu 8/10/17	Thu 8/17/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
63	2.8.15.29.14.7	Proceso de pago	62			15 days	Fri 8/18/17	Thu 9/7/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
64	2.8.15.29.14.8	Cierre EEQ - CNEL Sucumbios				78 days	Fri 3/24/17	Thu 7/13/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
65	2.8.15.29.14.8	Fiscalización de los sistemas EEQ - CNEL Sucumbios	46			57 days	Fri 3/24/17	Wed 6/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
66	2.8.15.29.14.8	Entrega de documentación de cierre (manuales, fichas técnicas, otros)	65			1 day	Thu 6/15/17	Thu 6/15/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
67	2.8.15.29.14.8	Suscripción de actas entrega - recepción	66			5 days	Fri 6/16/17	Thu 6/22/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
68	2.8.15.29.14.8	Proceso de pago	67			15 days	Fri 6/23/17	Thu 7/13/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
69	2.8.15.29.14.9	Pago y cierre de Contrato EEQ	68			1 day	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17	\$132,695.02	\$26,539.00	\$159,234.02						
70	2.9	Fin componente 2	69			0 days	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
71	3	Administración				253 days	Fri 7/15/16	Fri 7/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Método de Adquisición Nacional	Tipo de Revisión	Código del Proceso	Responsables del Componente
72	3.10	Firma de Contrato				0 days	Fri 7/15/16	Fri 7/15/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
73	3.11	Elegibilidad Total	72			40 days	Fri 7/15/16	Fri 9/9/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
74	3.13	Fin Proyecto	70			0 days	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Unidad de medida	Meta MR	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR	Duration	Start	Finish	Costo BID						
												March 1		February 11		January 21	
												4/13	9/28	3/14	8/29	2/13	7/31
0		NUMERO Y NOMBRE DE PROYECTO			450000			252 days	Wed 4/6/16	Mon 4/3/17	\$130,000,000.00						
1	5	Componente 3. Implementación del PNCE (Plan Nacional de Cocción Eficiente)			450000			252 days	Wed 4/6/16	Mon 4/3/17	\$130,000,000.00						
2	5.9	Producto 1 Cocinas de Inducción Financiadas con crédito del Programa	Cocinas		225000	1		141 days	Mon 9/12/16	Mon 4/3/17	\$130,000,000.00						
3	5.9.7	E: Clientes residenciales del programa PNCE con cocinas de inducción financiadas			225000			141 days	Mon 9/12/16	Mon 4/3/17	\$130,000,000.00						
18	5.12	Producto 2 Circuitos expresos, instalados	Circuito		225000	1		138 days	Wed 4/6/16	Tue 10/18/16	\$0.00						
19	5.12.8	E: Clientes residenciales del programa PNCE con circuitos internos instalados			225000			138 days	Wed 4/6/16	Tue 10/18/16	\$0.00						
20	5.12.8.9	Financiamiento para circuitos internos Mes 1			52000			10 days	Wed 4/6/16	Tue 4/19/16	\$0.00						
21	5.12.8.10	Financiamiento para circuitos internos Mes 2			52000			10 days	Wed 6/8/16	Tue 6/21/16	\$0.00						
22	5.12.8.11	Financiamiento para circuitos internos Mes 3			52000			10 days	Wed 8/3/16	Wed 8/17/16	\$0.00						
23	5.12.8.12	Financiamiento para circuitos internos Mes 4			52000			10 days	Wed 9/7/16	Tue 9/20/16	\$0.00						
24	5.12.8.13	Financiamiento para circuitos internos Mes 5			17000			10 days	Wed 10/5/16	Tue 10/18/16	\$0.00						
25	5.10	Fin componente 2	17,24		0			0 days	Mon 4/3/17	Mon 4/3/17	\$0.00						
26	3	Administración			0			181 days	Fri 7/15/16	Mon 4/3/17	\$0.00						
27	3.10	Firma de Contrato			0			0 days	Fri 7/15/16	Fri 7/15/16	\$0.00						
28	3.11	Elegibilidad Total	27		0			40 days	Fri 7/15/16	Fri 9/9/16	\$0.00						
29	3.13	Fin Proyecto	25		0			0 days	Mon 4/3/17	Mon 4/3/17	\$0.00						

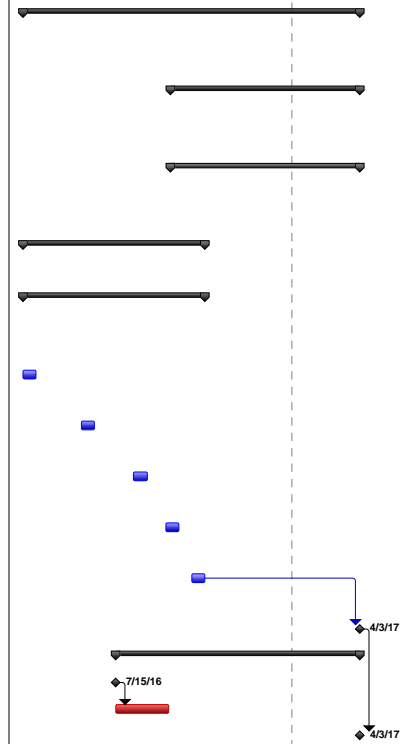

Ecuador - EC - L1160
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesores	Meta Matriz Resultados MR	Avance MR												
						Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half	1st Half
						Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
0		NUMERO Y NOMBRE DE PROYECTO															
1	1	Componente 4. Desarrollo de capacidades institucionales															
2	1.19	Producto 1 : Estudios para el apoyo al fortalecimiento institucional en el sector eléctrico en base a la LOSPEE y para la integración eléctrica regional															
89	1.20	Fin de Producto 2	88														
90	1.9	Producto 2 : Talleres de capacitación en fortalecimiento institucional		1													
155	1.15	Fin de Producto 1	154														
156	4	Administración															
