
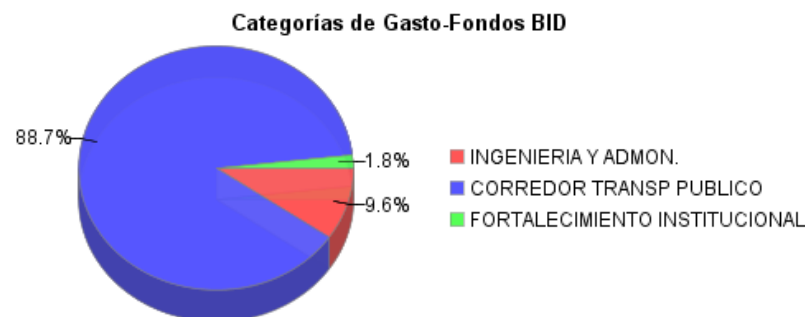
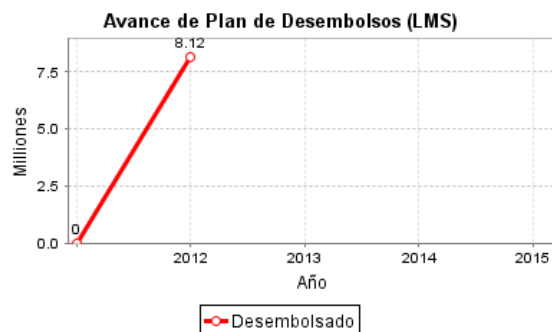



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		
Sector:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número(s) de Préstamo:	2572/OC-ES	Monto Aprobado Actual: 45.000.000,00	BID Original: 45.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 45.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	ES-T1159, RG-P1442	Saldo: 45.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 45.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 245

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012

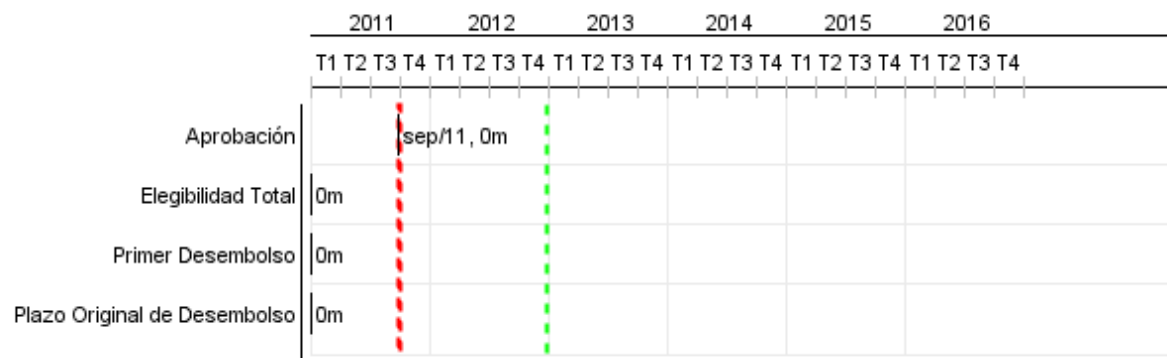

Progreso Acumulado al 2012

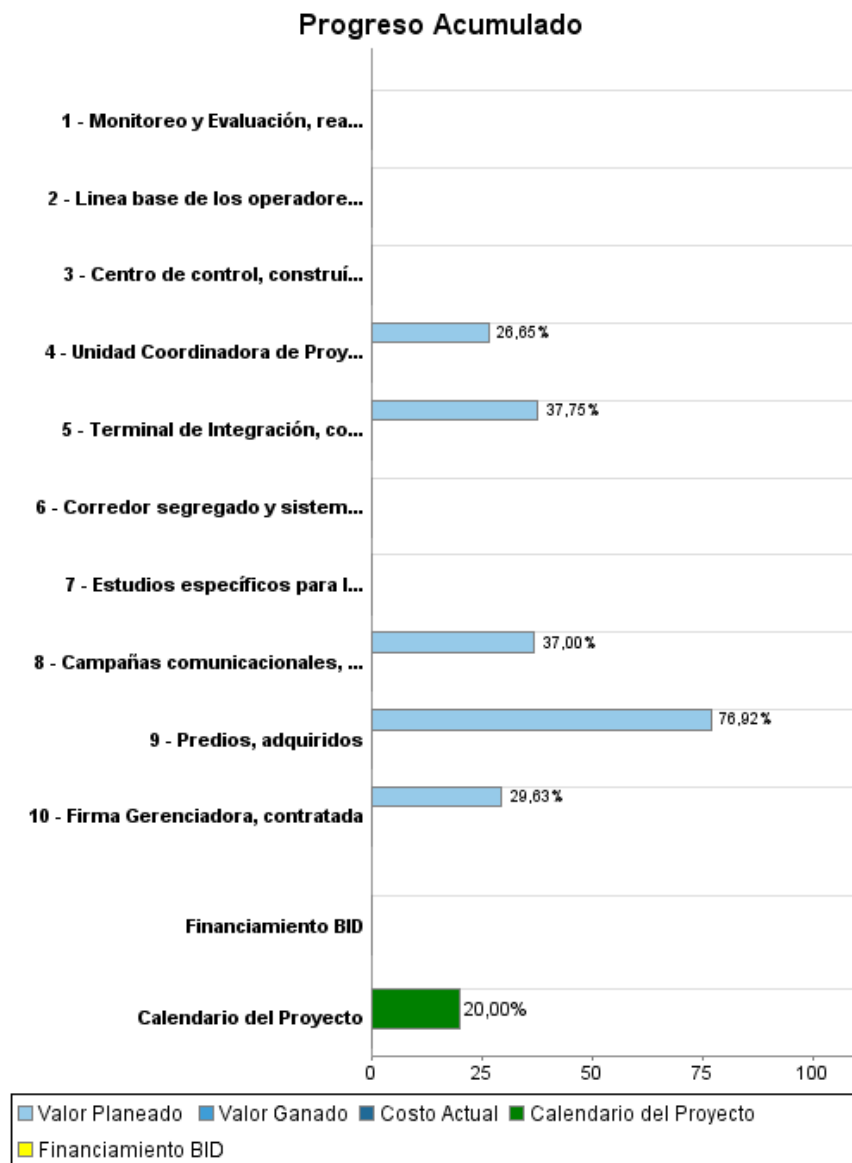

Resultados

Resultado:	Condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito mejoradas
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de Satisfacción del público usuario	Indice	10.00	2011	P A	20.00
Tiempo de viaje de un usuario de transporte público de pasajeros en el corredor entre Soyapango y Metrocentro	Minutos	50.00	2011	P A	40.00
Costos de operación de los vehículos de transporte público en el corredor	US\$ Millones	54.00	2011	P A	
Número de pasajeros transportados a través del sistema	Pasajeros	160,000.00	2011	P A	200,000.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. INGENIERIA Y ADMINISTRACION									
Firma Gerenciadora, contratada	Unidad	1,00			1,00	355.556,00			1.200.000,00
Unidad Coordinadora de Proyecto, constituida	Unidad Conformada	1,00			1,00	133.259,00			500.000,00
Monitoreo y Evaluación, realizadas	Informes				3,00				50.000,00
Equipamiento y Mobiliario	N/A					150.000,00			150.000,00
Gasto de Pre Operación	N/A								200.000,00
Auditorías, realizadas	N/A								200.000,00
Supervisión	N/A					90.000,00			2.000.000,00
2. CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO									
Terminal de Integración, construída	Unidad				1,00	1.510.000,00			4.000.000,00
Corredor segregado y sistemas peatonales, construídos	Personas				7,70				30.050.000,00
Predios, adquiridos	Unidad	6,00			6,00	2.000.000,00			2.600.000,00
Centro de control, construído y equipado	Unidad				1,00				2.750.000,00
Campañas comunicacionales, implementadas	Campaña	1,00			3,00	92.500,00			250.000,00
Línea base de los operadores afectados de las rutas del sistema, realizada	Línea de base				1,00				250.000,00
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
Estudios específicos para la construcción del SITRAMSS, realizados	Estudios				5,00				800.000,00
TOTAL						4.331.315,00			45.000.000,00
