


























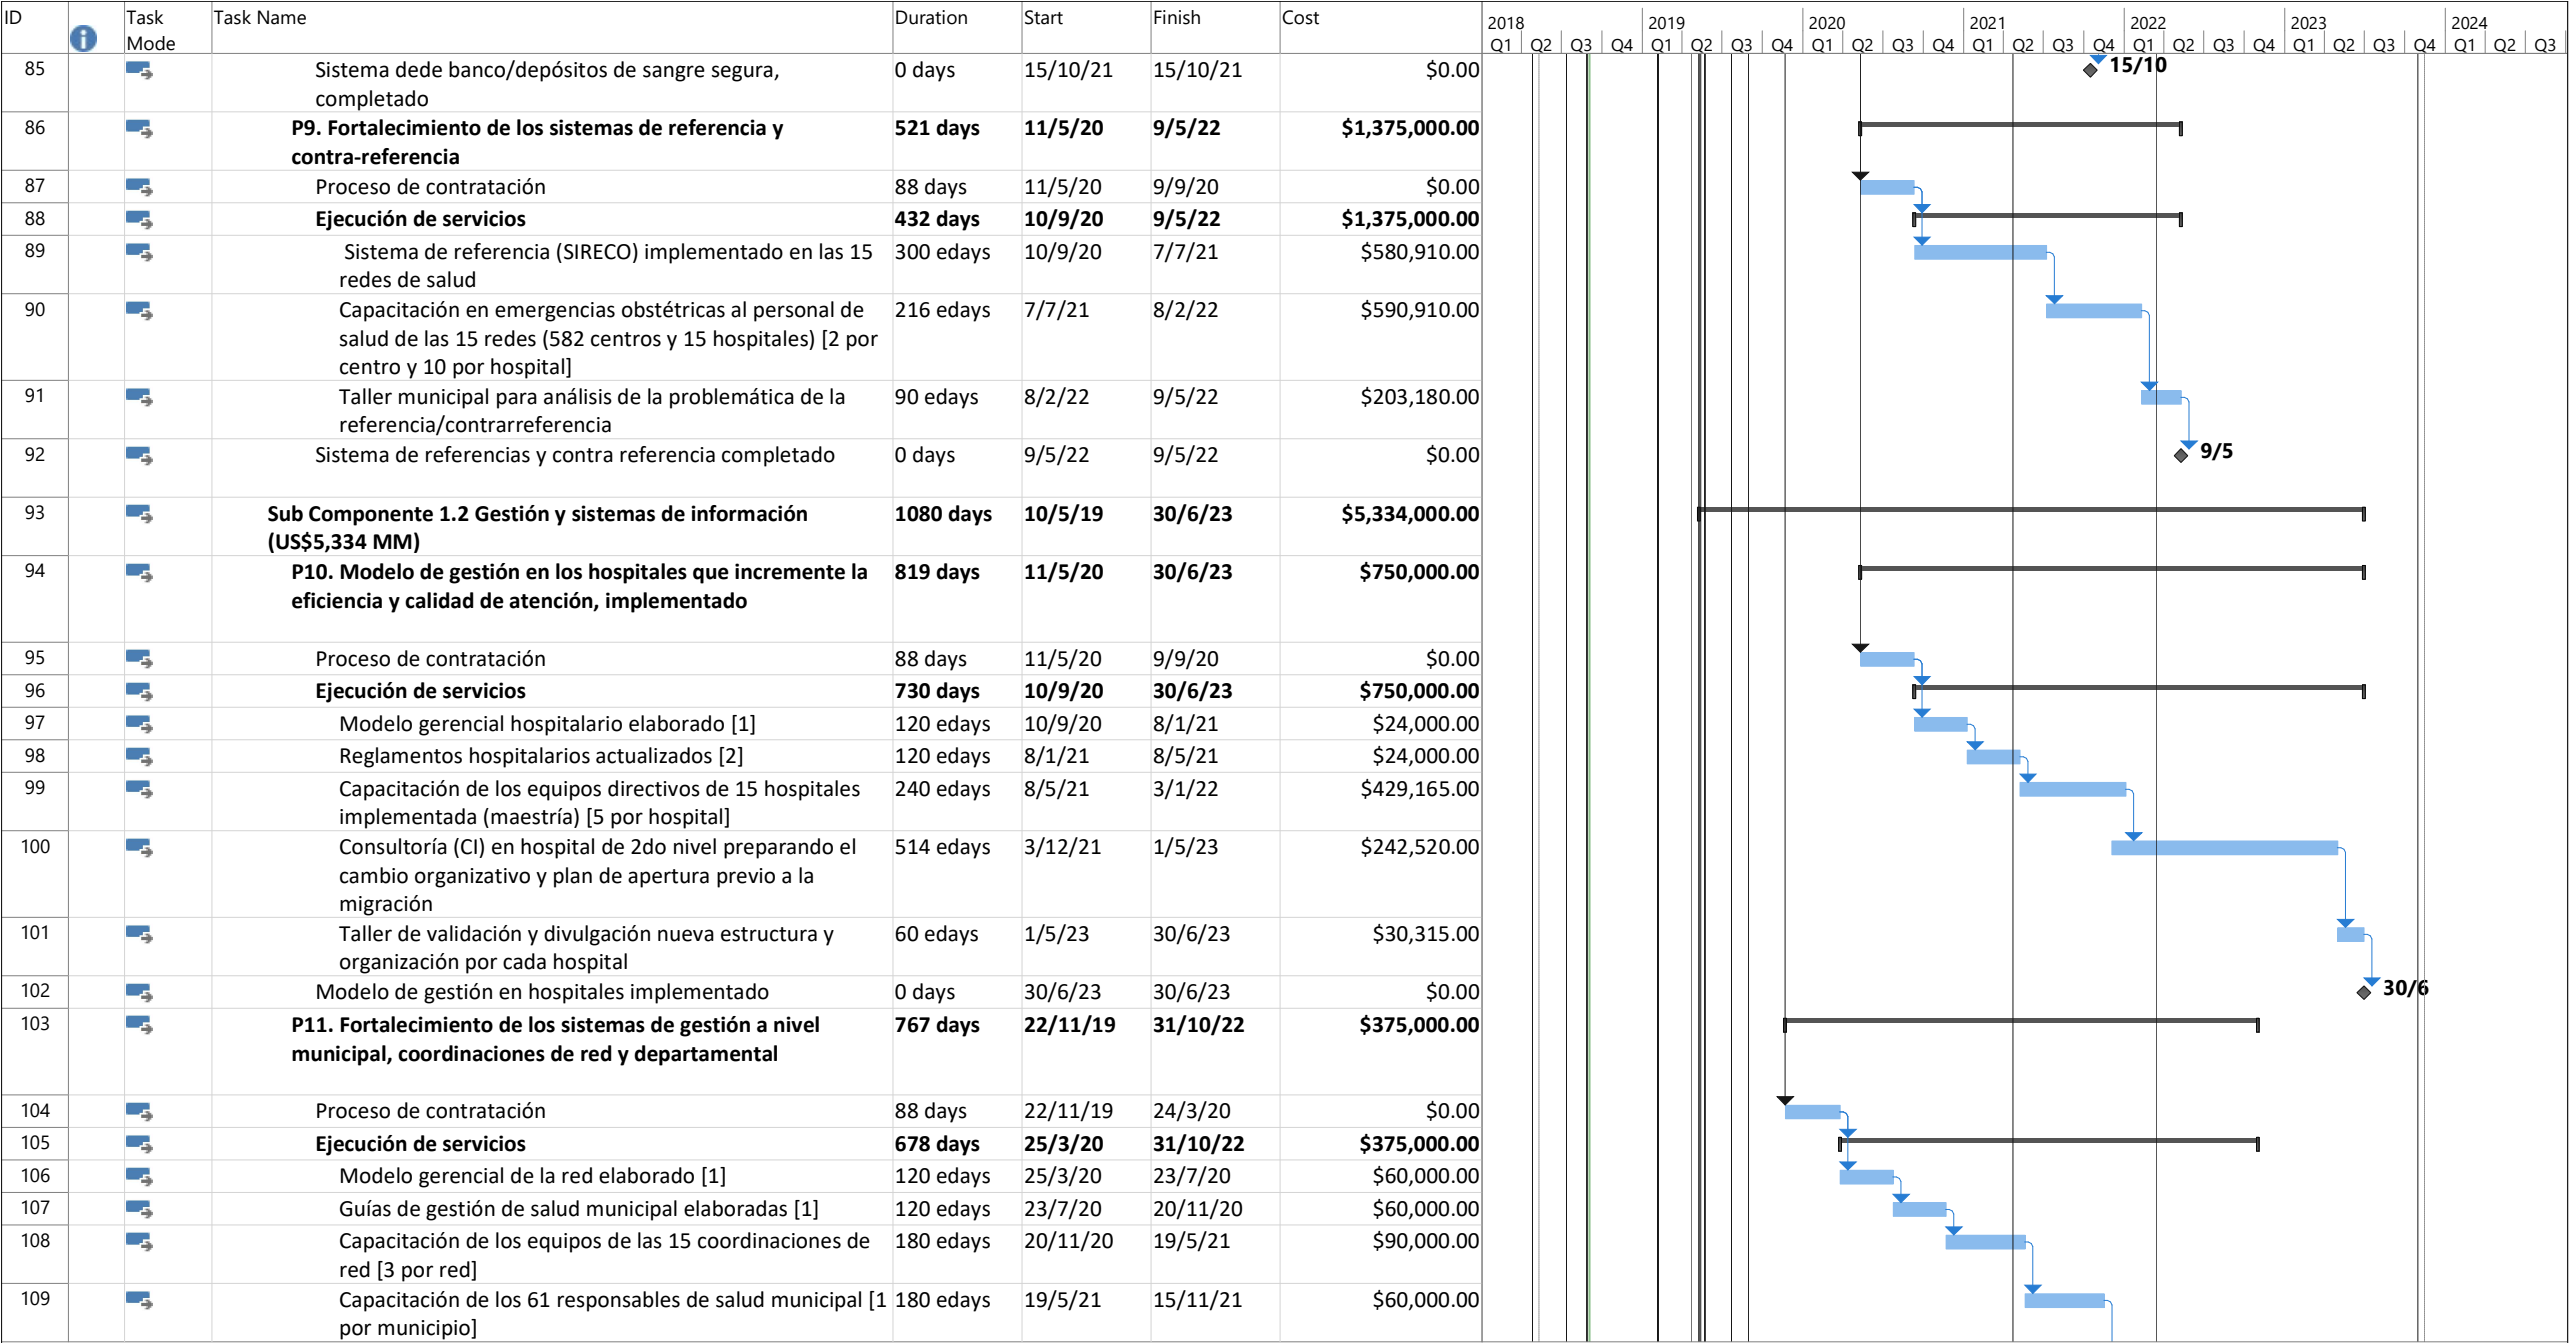









































ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
31			Grupo Redes 1	228 days	12/2/20	25/12/20	\$240,852.00																											
32			Grupo Redes 2	244 days	11/1/21	16/12/21	\$240,852.00																											
33			Grupo Redes 3	244 days	22/12/21	28/11/22	\$240,851.00																											
34			Modelo CONE implementado	0 days	28/11/22	28/11/22	\$0.00																											
35			P2. Programa de mejora continua de la calidad en CONE, elaborado e implementado	932 days	10/5/19	5/12/22	\$1,500,000.00																											
36			Proceso de contratación	88 days	10/5/19	10/9/19	\$0.00																											
37			Ejecución de servicios de implementación del programa de mejora continua	844 days	10/9/19	5/12/22	\$1,500,000.00																											
38			Preparar y elaborar el programa	90 edays	10/9/19	9/12/19	\$0.00																											
39			Círculos de mejora continua de la calidad creados en todos los establecimientos de las 15 redes (582 centros y 15 hospitales)	60 edays	9/12/19	7/2/20	\$409,091.00																											
40			Capacitación en la metodología de la mejora continua, realizada	90 edays	9/1/20	8/4/20	\$200,726.00																											
41			Metas de calidad definidas	60 edays	9/3/20	8/5/20	\$72,000.00																											
42			Grupo Redes 1	237 edays	8/5/20	31/12/20	\$272,727.00																											
43			Grupo Redes 2	330 edays	13/1/21	9/12/21	\$272,728.00																											
44			Grupo Redes 3	340 edays	30/12/21	5/12/22	\$272,728.00																											
45			Programa de mejora continua de la calidad en CONE implementado	0 days	5/12/22	5/12/22	\$0.00																											
46			P3. Plataformas comunitarias de captación y control de embarazadas, desarrolladas y funcionando	938 days	10/5/19	13/12/22	\$1,500,000.00																											
47			Proceso de contratación	66 days	10/5/19	9/8/19	\$0.00																											
48			Ejecución de servicios de plataformas comunitarias	872 days	9/8/19	13/12/22	\$1,500,000.00																											
49			Preparación para desarrollo de plataformas	60 edays	9/8/19	8/10/19	\$0.00																											
50			Agentes o plataformas comunitarias constituidas en las comunidades de los 61 municipios	90 edays	8/10/19	6/1/20	\$294,420.00																											
51			Agentes comunitarios de salud capacitados para actividades de educación y promoción	90 edays	6/1/20	5/4/20	\$250,600.00																											
52			Taller municipal con responsables salud y líderes comunarios para explicar y configurar plataformas	40 edays	5/4/20	15/5/20	\$203,180.00																											
53			Implementación y monitoreo del programa en Grupo I - 5 Redes	230 edays	15/5/20	31/12/20	\$250,600.00																											
54			Implementación y monitoreo del programa en Grupo II - 5 Redes	330 edays	14/1/21	10/12/21	\$250,600.00																											
55			Implementación y monitoreo del programa en Grupo III - 5 Redes	340 edays	7/1/22	13/12/22	\$250,600.00																											
56			Plataformas comunitarias funcionando	0 days	13/12/22	13/12/22	\$0.00																											


































ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
57			P4. Programas de Información, Educación y Comunicación (IEC) para el cambio de comportamiento en relación con la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, implementados	543 days	10/5/19	8/6/21	\$250,000.00																											
58			Proceso de contratación	88 days	10/5/19	10/9/19	\$0.00																											
59			Ejecución de servicios	455 days	10/9/19	8/6/21	\$250,000.00																											
60			Preparación del programa	90 edays	10/9/19	9/12/19	\$0.00																											
61			Material de eduación elaborado y entregado	240 edays	9/12/19	5/8/20	\$96,000.00																											
62			Capacitación de capacitadores para cada municipio (61)	307 edays	5/8/20	8/6/21	\$154,000.00																											
63			Programa de información, educación y comunicación implementado	0 days	8/6/21	8/6/21	\$0.00																											
64			P5. Intervenciones de mejora de situación nutricional de mujeres embarazadas y neonatos, implementadas	550 days	12/2/20	22/3/22	\$250,000.00																											
65			Proceso de contratación	66 days	12/2/20	13/5/20	\$0.00																											
66			Ejecución de servicios	484 days	14/5/20	22/3/22	\$250,000.00																											
67			P6. Licenciadas en enfermería obstétrica incorporadas en las redes	921 days	21/6/19	31/12/22	\$2,160,000.00																											
68			Proceso de contratación de servicios de capacitación	66 days	23/7/19	22/10/19	\$0.00																											
69			Capacitación de 61 enfermeras a nivel municipal	70 edays	22/10/19	31/12/19	\$110,400.00																											
70			Proceso de contratación de Licenciadas en enfermería obstétrica	88 days	21/6/19	22/10/19	\$0.00																											
71			Licenciadas incorporadas año 2020	364 edays	2/1/20	31/12/20	\$683,200.00																											
72			Licenciadas incorporadas año 2021	361 edays	4/1/21	31/12/21	\$683,200.00																											
73			Licenciadas incorporados año 2022	362 edays	3/1/22	31/12/22	\$683,200.00																											
74			Licenciadas incorporadas en redes	0 days	31/12/22	31/12/22	\$0.00																											
75			P7. Mejoramiento y actualización Sistema de compras centralizada de insumos y medicamentos del sector, completado	430 days	10/5/19	31/12/20	\$200,000.00																											
76			Proceso de contratación	88 days	10/5/19	10/9/19	\$0.00																											
77			Ejecución de servicios	341 days	11/9/19	31/12/20	\$200,000.00																											
78			Metodología para la cuantificación implementada en las 15 redes (582 centros y 15 hospitales) y el CEAS	120 edays	11/9/19	9/1/20	\$90,000.00																											
79			Capacitación a los responsables de farmacia de 61 municipios y 15 hospitales	180 edays	9/1/20	7/7/20	\$50,000.00																											
80			Sistemas de gestión de medicamentos mejorados en 61 municipios, 15 hospitales y CEAS	177 edays	7/7/20	31/12/20	\$60,000.00																											
81			Sistema de compras actualizado y mejorado	0 days	31/12/20	31/12/20	\$0.00																											
82			P8. Fortalecimiento del sistema de Bancos/depósitos de Sangre Segura, completado	556 days	30/8/19	15/10/21	\$1,221,000.00																											
83			Proceso de contratación	88 days	30/8/19	31/12/19	\$0.00																											
84			Ejecución de servicios	640 edays	14/1/20	15/10/21	\$1,221,000.00																											




ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
110			Sistema de control de gestión municipal y de la red implementado (61 GAMs y 15 coordinaciones de red)	350 edays	15/11/21	31/10/22	\$105,000.00																											
111			Fortalecimiento de los sistemas de gestión completado	0 days	31/10/22	31/10/22	\$0.00																											
112			P12. Sistemas de información para gestión clínica, implementados	1066 days	10/5/19	9/6/23	\$4,000,000.00																											
113			Proceso de contratación	132 days	10/5/19	11/11/19	\$0.00																											
114			Ejecución de servicios	922 days	27/11/19	9/6/23	\$4,000,000.00																											
115			Preparación y tareas preliminares	90 edays	27/11/19	25/2/20	\$0.00																											
116			Sistemas de información gerencial y de expediente clínico digital implementado en hospitales - Grupo I	400 edays	25/2/20	31/3/21	\$1,333,333.45																											
117			Sistemas de información gerencial y de expediente clínico digital implementado en hospitales - Grupo II	400 edays	31/3/21	5/5/22	\$1,333,333.45																											
118			Sistemas de información gerencial y de expediente clínico digital implementado en hospitales - Grupo III	400 edays	5/5/22	9/6/23	\$1,333,333.10																											
119			Sistema para gestión clínica implementado	0 days	9/6/23	9/6/23	\$0.00																											
120			Producto 13: Metodología RAMOS (o similar) de vigilancia de mortalidad materna, implementada	783 days	10/5/19	10/5/22	\$209,000.00																											
121			Proceso de contratación	88 days	10/5/19	10/9/19	\$0.00																											
122			Ejecución de servicios	695 days	11/9/19	10/5/22	\$209,000.00																											
123			Metodología RAMOS implementada	0 days	10/5/22	10/5/22	\$0.00																											
124			Sub-componente 1.3: Formación de RHS (US\$1,61 MM	1136 days	24/5/19	29/9/23	\$1,610,000.00																											
125			P14. Fortalecimiento de capacidades clínico-diagnósticas y terapéuticas del personal de salud a través de programas de formación	924 days	24/5/19	7/12/22	\$1,257,500.00																											
126			Proceso de contratación	132 days	24/5/19	25/11/19	\$0.00																											
127			Ejecución de servicios	764 days	3/1/20	7/12/22	\$1,257,500.00																											
128			Programa de formación completado	0 days	7/12/22	7/12/22	\$0.00																											
129			P15. Formación en gestión hospitalaria destinada a los cuadros directivos de los hospitales, las redes de salud y los SEDES	1136 days	24/5/19	29/9/23	\$352,500.00																											
130			Proceso de contratación	132 days	24/5/19	25/11/19	\$0.00																											
131			Ejecución de servicios	1354 edays	14/1/20	29/9/23	\$352,500.00																											
132			Programa de formación completado	0 days	29/9/23	29/9/23	\$0.00																											
133			Componente 2. Infraestructura y equipamiento (US\$249,7 MM)	1428 days	11/5/18	31/10/23	\$249,700,000.00																											
134			Sub-componente 2.1. Cobertura de brechas de equipamiento (US\$49,5 MM	534 days	11/5/18	27/5/20	\$49,500,000.00																											
135			P16. Equipamiento del Hospital El Alto Norte completado	271 days	1/6/18	14/6/19	\$1,302,362.00																											

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
136			Equipamiento Paquete I adquirido e instalado	271 days	1/6/18	14/6/19	\$1,000,000.00																												
137			Proceso de contratación	184 days	1/6/18	13/2/19	\$0.00																												
138			Equipos entregados e instalados	121 edays	13/2/19	14/6/19	\$1,000,000.00																												
139			Equipamiento Paquete II adquirido e instalado	174 days	17/8/18	17/4/19	\$193,032.00																												
140			Estaciones de trabajo instaladas	174 days	17/8/18	17/4/19	\$36,443.00																												
141			Proceso de contratación	88 days	17/8/18	18/12/18	\$0.00																												
142			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/12/18	17/4/19	\$36,443.00																												
143			Mobiliario adquirido	174 days	17/8/18	17/4/19	\$61,808.00																												
144			Proceso de contratación	88 days	17/8/18	18/12/18	\$0.00																												
145			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/12/18	17/4/19	\$61,808.00																												
146			Equipamiento y maquinaria para mantenimiento adquirido	174 days	17/8/18	17/4/19	\$94,781.00																												
147			Proceso de contratación	88 days	17/8/18	18/12/18	\$0.00																												
148			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/12/18	17/4/19	\$94,781.00																												
149			Esterilizador a vapor instalado y operando	174 days	17/8/18	17/4/19	\$109,330.00																												
150			Proceso de contratación	88 days	17/8/18	18/12/18	\$0.00																												
151			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/12/18	17/4/19	\$109,330.00																												
152			P17. Equipamiento del Hospital El Alto Sur completado	288 days	11/5/18	18/6/19	\$1,019,619.00																												
153			Sala de servidores completada (Data Center HEAS)	218 days	17/8/18	18/6/19	\$583,090.38																												
154			Diseño y dimensionamiento del data center del HEAS	174 days	17/8/18	17/4/19	\$58,309.04																												
155			Proceso de contratación	88 days	17/8/18	18/12/18	\$0.00																												
156			Ejecución de los servicios	120 edays	18/12/18	17/4/19	\$58,309.04																												
157			Equipamiento del Datacenter adquirido, instalado y operando	218 days	17/8/18	18/6/19	\$524,781.34																												
158			Proceso de contratación	132 days	17/8/18	18/2/19	\$0.00																												
159			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/2/19	18/6/19	\$524,781.34																												
160			Equipos de ofimática adquiridos e instalados	218 days	17/8/18	18/6/19	\$294,169.10																												
161			Estaciones de trabajo instaladas	218 days	17/8/18	18/6/19	\$218,658.89																												
162			Proceso de contratación	132 days	17/8/18	18/2/19	\$0.00																												
163			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/2/19	18/6/19	\$218,658.89																												
164			Equipo de impresión de alto tráfico LaserJet	86 days	18/2/19	18/6/19	\$33,673.47																												
165			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/2/19	18/6/19	\$33,673.47																												
166			Equipamiento pantalla TV pared adquirido	86 days	18/2/19	18/6/19	\$35,422.74																												
167			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/2/19	18/6/19	\$35,422.74																												
168			Equipamiento TV digital sobremesa 32"	86 days	18/2/19	18/6/19	\$6,414.00																												
169			Ejecución de la adquisición	120 edays	18/2/19	18/6/19	\$6,414.00																												
170			Sin asignación específica	1 day	11/5/18	11/5/18	\$142,359.52																												
171			P18. Equipamiento del Hospital de Ocurí completado	278 days	1/6/18	25/6/19	\$5,669,759.00																												
172			Proceso de contratación	184 days	1/6/18	13/2/19	\$0.00																												
173			Equipos entregados e instalados	132 edays	13/2/19	25/6/19	\$5,439,759.00																												

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
174			Equipamiento adicional para mitigaciones ambientales	219 days	1/6/18	3/4/19	\$230,000.00																												
175			Proceso de contratación	132 days	1/6/18	3/12/18	\$0.00																												
176			Equipos entregados e instalados	121 edays	3/12/18	3/4/19	\$230,000.00																												
177			P19. Equipamiento del Hospital de Llallagua completado	278 days	1/6/18	25/6/19	\$10,343,860.00																												
178			Proceso de contratación	184 days	1/6/18	13/2/19	\$0.00																												
179			Equipos entregados e instalados	132 edays	13/2/19	25/6/19	\$10,113,860.00																												
180			Equipamiento adicional para mitigaciones ambientales	219 days	1/6/18	3/4/19	\$230,000.00																												
181			Proceso de contratación	132 days	1/6/18	3/12/18	\$0.00																												
182			Equipos entregados e instalados	121 edays	3/12/18	3/4/19	\$230,000.00																												
183			P20. Equipamiento de Hospital Tercer Nivel de Potosí completado	519 days	1/6/18	27/5/20	\$31,164,400.00																												
184			Proceso de contratación	154 days	24/5/19	25/12/19	\$0.00																												
185			Equipos entregados e instalados	154 edays	25/12/19	27/5/20	\$30,000,000.00																												
186			Equipamiento adicional y materiales adquiridos, instalados y funcionando	218 days	1/6/18	2/4/19	\$1,004,050.00																												
187			Data Center del HP instalado y funcionando	218 days	1/6/18	2/4/19	\$655,977.00																												
188			Proceso de contratación	132 days	1/6/18	3/12/18	\$0.00																												
189			Ejecución de la adquisición	120 edays	3/12/18	2/4/19	\$655,977.00																												
190			Estaciones de Trabajo adquiridas y operando	86 days	3/12/18	2/4/19	\$109,329.00																												
191			Ejecución de la adquisición	120 edays	3/12/18	2/4/19	\$109,329.00																												
192			Lencería hospitalaria adquirida y distribuida	172 days	1/6/18	28/1/19	\$212,592.00																												
193			Proceso de contratación	110 days	1/6/18	1/11/18	\$0.00																												
194			Ejecución de la adquisición	88 edays	1/11/18	28/1/19	\$212,592.00																												
195			Vajilla hospitalaria adquirida y entregada	128 days	1/6/18	27/11/18	\$26,152.00																												
196			Proceso de contratación	66 days	1/6/18	31/8/18	\$0.00																												
197			Ejecución de la adquisición	88 edays	31/8/18	27/11/18	\$26,152.00																												
198			Equipamiento para medio ambiente adquiridos e instalados	151 days	1/6/18	29/12/18	\$160,350.00																												
199			Esterilizador a vapor instalado y operando	151 days	1/6/18	29/12/18	\$109,330.00																												
200			Proceso de contratación	88 days	1/6/18	2/10/18	\$0.00																												
201			Equipos entregados e instalados	88 edays	2/10/18	29/12/18	\$109,330.00																												
202			Trituradora de desechos	63 days	2/10/18	29/12/18	\$51,020.00																												
203			Equipos entregados e instalados	88 edays	2/10/18	29/12/18	\$51,020.00																												
204			Sub-componente 2.2. Fortalecimiento del segundo nivel de atención en redes prioritizadas (US\$128,5MM)	1143 days	18/10/18	6/3/23	\$128,500,000.00																												
205			P21. Hospitales de segundo nivel, construidos, equipados y operando	1143 days	18/10/18	6/3/23	\$120,688,000.00																												
206			E1. Hospital de segundo nivel Palos Blancos, construido, equipado y operando	860 days	17/1/19	5/5/22	\$15,086,000.00																												
207			Terreno adquirido y saneado	0 days	17/1/19	17/1/19	\$0.00																												



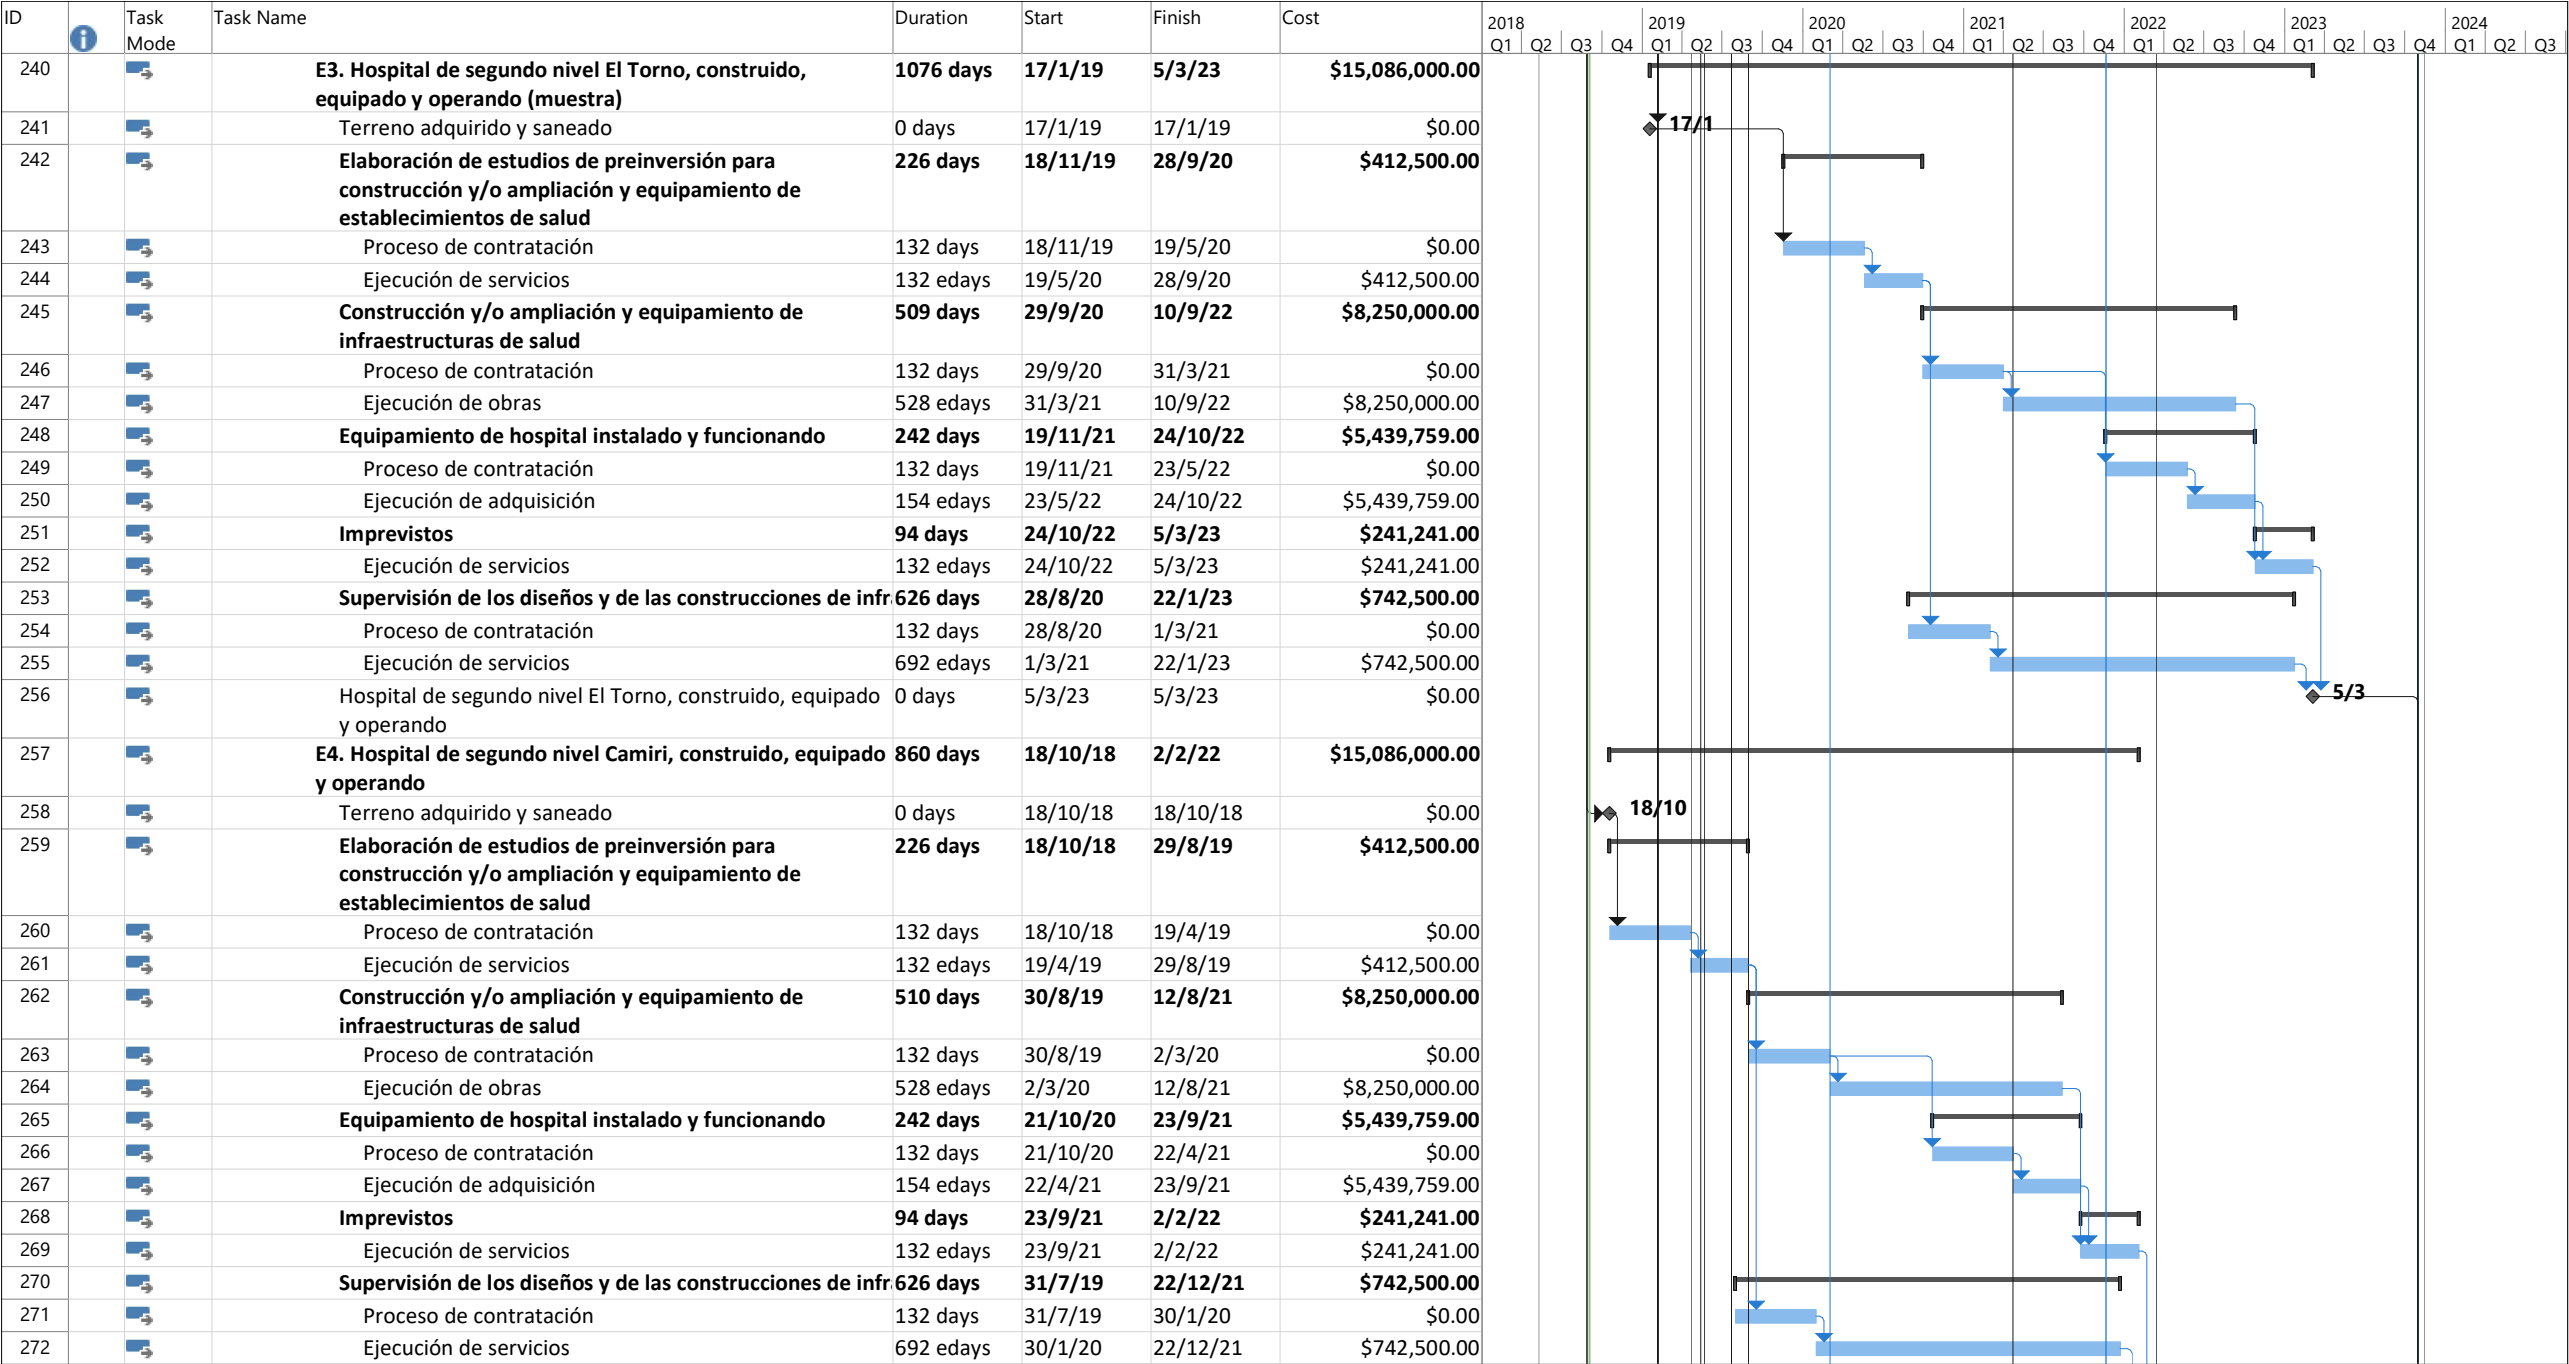

































ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
208			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/1/19	1/12/19	\$412,500.00																											
209			Proceso de contratación	132 days	18/1/19	22/7/19	\$0.00																											
210			Ejecución de servicios	132 edays	22/7/19	1/12/19	\$412,500.00																											
211			Construcción y/o ampliación y equipamiento de infraestructuras de salud	510 days	2/12/19	12/11/21	\$8,250,000.00																											
212			Proceso de contratación	132 days	2/12/19	2/6/20	\$0.00																											
213			Ejecución de obras	528 edays	2/6/20	12/11/21	\$8,250,000.00																											
214			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	21/1/21	24/12/21	\$5,439,759.00																											
215			Proceso de contratación	132 days	21/1/21	23/7/21	\$0.00																											
216			Ejecución de servicios	154 edays	23/7/21	24/12/21	\$5,439,759.00																											
217			Imprevistos	94 days	24/12/21	5/5/22	\$241,241.00																											
218			Ejecución de servicios	132 edays	24/12/21	5/5/22	\$241,241.00																											
219			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infraestructuras	626 days	31/10/19	24/3/22	\$742,500.00																											
220			Proceso de contratación	132 days	31/10/19	1/5/20	\$0.00																											
221			Ejecución de servicios	692 edays	1/5/20	24/3/22	\$742,500.00																											
222			Hospital de segundo nivel Palos Blancos, construido, equipado y operando	0 days	5/5/22	5/5/22	\$0.00																											
223			E2. Hospital de segundo nivel Ixiamas, construido, equipado y operando	860 days	17/1/19	5/5/22	\$15,086,000.00																											
224			Terreno adquirido y saneado	0 days	17/1/19	17/1/19	\$0.00																											
225			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/1/19	1/12/19	\$412,500.00																											
226			Proceso de contratación	132 days	18/1/19	22/7/19	\$0.00																											
227			Ejecución de servicios	132 edays	22/7/19	1/12/19	\$412,500.00																											
228			Construcción y/o ampliación y equipamiento de infraestructuras de salud	510 days	2/12/19	12/11/21	\$8,250,000.00																											
229			Proceso de contratación	132 days	2/12/19	2/6/20	\$0.00																											
230			Ejecución de obras	528 edays	2/6/20	12/11/21	\$8,250,000.00																											
231			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	21/1/21	24/12/21	\$5,439,759.00																											
232			Proceso de contratación	132 days	21/1/21	23/7/21	\$0.00																											
233			Ejecución de adquisición	154 edays	23/7/21	24/12/21	\$5,439,759.00																											
234			Imprevistos	94 days	24/12/21	5/5/22	\$241,241.00																											
235			Ejecución de servicios	132 edays	24/12/21	5/5/22	\$241,241.00																											
236			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infr	626 days	31/10/19	24/3/22	\$742,500.00																											
237			Proceso de contratación	132 days	31/10/19	1/5/20	\$0.00																											
238			Ejecución de servicios	692 edays	1/5/20	24/3/22	\$742,500.00																											
239			Hospital de segundo nivel Ixiamas, construido, equipado y operando	0 days	5/5/22	5/5/22	\$0.00																											



ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3				
273			Hospital de segundo nivel Camirí, construido, equipado y operando	0 days	2/2/22	2/2/22	\$0.00																											
274			E5. Hospital de segundo nivel San Borja, construido, equipado y operando	1076 days	17/1/19	5/3/23	\$15,086,000.00																											
275			Terreno adquirido y saneado	0 days	17/1/19	17/1/19	\$0.00																											
276			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/11/19	28/9/20	\$412,500.00																											
277			Proceso de contratación	132 days	18/11/19	19/5/20	\$0.00																											
278			Ejecución de servicios	132 edays	19/5/20	28/9/20	\$412,500.00																											
279			Construcción y/o ampliación y equipamiento de infraestructuras de salud	509 days	29/9/20	10/9/22	\$8,250,000.00																											
280			Proceso de contratación	132 days	29/9/20	31/3/21	\$0.00																											
281			Ejecución de obras	528 edays	31/3/21	10/9/22	\$8,250,000.00																											
282			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	19/11/21	24/10/22	\$5,439,759.00																											
283			Proceso de contratación	132 days	19/11/21	23/5/22	\$0.00																											
284			Ejecución de adquisición	154 edays	23/5/22	24/10/22	\$5,439,759.00																											
285			Imprevistos	94 days	24/10/22	5/3/23	\$241,241.00																											
286			Ejecución de servicios	132 edays	24/10/22	5/3/23	\$241,241.00																											
287			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infraestructuras de salud	626 days	28/8/20	22/1/23	\$742,500.00																											
288			Proceso de contratación	132 days	28/8/20	1/3/21	\$0.00																											
289			Ejecución de servicios	692 edays	1/3/21	22/1/23	\$742,500.00																											
290			Hospital de segundo nivel San Borja, construido, equipado y operando	0 days	5/3/23	5/3/23	\$0.00																											
291			E6. Hospital de segundo nivel Monteagudo, construido, equipado y operando	1077 days	17/1/19	6/3/23	\$15,086,000.00																											
292			Terreno adquirido y saneado	0 days	17/1/19	17/1/19	\$0.00																											
293			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/11/19	28/9/20	\$412,500.00																											
294			Proceso de contratación	132 days	18/11/19	19/5/20	\$0.00																											
295			Ejecución de servicios	132 edays	19/5/20	28/9/20	\$412,500.00																											
296			Construcción y/o ampliación y equipamiento de infraestructuras de salud	509 days	29/9/20	10/9/22	\$8,250,000.00																											
297			Proceso de contratación	132 days	29/9/20	31/3/21	\$0.00																											
298			Ejecución de obras	528 edays	31/3/21	10/9/22	\$8,250,000.00																											
299			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	19/11/21	24/10/22	\$5,439,759.00																											
300			Proceso de contratación	132 days	19/11/21	23/5/22	\$0.00																											
301			Ejecución de adquisición	154 edays	23/5/22	24/10/22	\$5,439,759.00																											
302			Imprevistos	94 days	24/10/22	5/3/23	\$241,241.00																											
303			Ejecución de servicios	132 edays	24/10/22	5/3/23	\$241,241.00																											
304			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infraestructuras de salud	626 days	28/8/20	22/1/23	\$742,500.00																											
305			Proceso de contratación	132 days	28/8/20	1/3/21	\$0.00																											

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost																												
306			Ejecución de servicios	692 edays	1/3/21	22/1/23	\$742,500.00																												
307			Hospital de segundo nivel Monteagudo, construido, equipado y operando	0 days	6/3/23	6/3/23	\$0.00	◆ 6/3																											
308			E7. Hospital de segundo nivel Villazón, construido, equipado y operando	860 days	18/10/18	2/2/22	\$15,086,000.00																												
309			Terreno adquirido y saneado	0 days	18/10/18	18/10/18	\$0.00	▶ 18/10																											
310			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/10/18	29/8/19	\$412,500.00																												
311			Proceso de contratación	132 days	18/10/18	19/4/19	\$0.00																												
312			Ejecución de servicios	132 edays	19/4/19	29/8/19	\$412,500.00																												
313			Construcción y/o ampliación de infraestructuras de salud	510 days	30/8/19	12/8/21	\$8,250,000.00																												
314			Proceso de contratación	132 days	30/8/19	2/3/20	\$0.00																												
315			Ejecución de obras	528 edays	2/3/20	12/8/21	\$8,250,000.00																												
316			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	21/10/20	23/9/21	\$5,439,759.00																												
317			Proceso de contratación	132 days	21/10/20	22/4/21	\$0.00																												
318			Ejecución de adquisición	154 edays	22/4/21	23/9/21	\$5,439,759.00																												
319			Imprevistos	94 days	23/9/21	2/2/22	\$241,241.00																												
320			Ejecución de servicios	132 edays	23/9/21	2/2/22	\$241,241.00																												
321			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infr	626 days	31/7/19	22/12/21	\$742,500.00																												
322			Proceso de contratación	132 days	31/7/19	30/1/20	\$0.00																												
323			Ejecución de servicios	692 edays	30/1/20	22/12/21	\$742,500.00																												
324			Hospital de segundo nivel Camirí, construido, equipado y operando	0 days	2/2/22	2/2/22	\$0.00	◆ 2/2																											
325			E8. Hospital de segundo nivel Tupiza, construido, equipado y operando	860 days	18/10/18	2/2/22	\$15,086,000.00																												
326			Terreno adquirido y saneado	0 days	18/10/18	18/10/18	\$0.00	▶ 18/10																											
327			Elaboración de estudios de preinversión para construcción y/o ampliación y equipamiento de establecimientos de salud	226 days	18/10/18	29/8/19	\$412,500.00																												
328			Proceso de contratación	132 days	18/10/18	19/4/19	\$0.00																												
329			Ejecución de servicios	132 edays	19/4/19	29/8/19	\$412,500.00																												
330			Construcción y/o ampliación de infraestructuras de salud	510 days	30/8/19	12/8/21	\$8,250,000.00																												
331			Proceso de contratación	132 days	30/8/19	2/3/20	\$0.00																												
332			Ejecución de obras	528 edays	2/3/20	12/8/21	\$8,250,000.00																												
333			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	21/10/20	23/9/21	\$5,439,759.00																												
334			Proceso de contratación	132 days	21/10/20	22/4/21	\$0.00																												
335			Ejecución de adquisición	154 edays	22/4/21	23/9/21	\$5,439,759.00																												
336			Imprevistos	94 days	23/9/21	2/2/22	\$241,241.00																												
337			Ejecución de servicios	132 edays	23/9/21	2/2/22	\$241,241.00																												
338			Supervisión de los diseños y de las construcciones de infr	626 days	31/7/19	22/12/21	\$742,500.00																												
339			Proceso de contratación	132 days	31/7/19	30/1/20	\$0.00																												

Page 11

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
340			Ejecución de servicios	692 edays	30/1/20	22/12/21	\$742,500.00																											
341			Hospital de segundo nivel Tupiza, construido, equipado y operando	0 days	2/2/22	2/2/22	\$0.00																											
342			P22. Hospital de segundo nivel Puerto Suarez, equipado y operando	242 days	15/3/22	15/2/23	\$5,439,759.00																											
343			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	242 days	15/3/22	15/2/23	\$5,439,759.00																											
344			Proceso de contratación	132 days	15/3/22	14/9/22	\$0.00																											
345			Ejecución de adquisición	154 edays	14/9/22	15/2/23	\$5,439,759.00																											
346			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	0 days	15/2/23	15/2/23	\$0.00																											
347			P23. Equipamiento en centros de salud de las redes	242 days	23/7/19	24/6/20	\$2,372,241.00																											
348			Proceso de contratación	132 days	23/7/19	22/1/20	\$0.00																											
349			Ejecución de adquisición	154 edays	22/1/20	24/6/20	\$0.00																											
350			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	0 days	24/6/20	24/6/20	\$2,372,241.00																											
351			Sub-componente 2.3. Fortalecimiento del tercer nivel en el municipio El Alto (US\$69 MM)	1182 days	22/4/19	31/10/23	\$69,000,000.00																											
352			Hospital Pediátrico de 3er. nivel, construido, equipado y operando	1182 days	22/4/19	31/10/23	\$69,000,000.00																											
353			P24. Estudios de preinversión elaborados y completados	352 days	22/4/19	25/8/20	\$902,520.00																											
354			Proceso de contratación	132 days	22/4/19	22/10/19	\$0.00																											
355			Ejecución de servicios	220 days	23/10/19	25/8/20	\$902,520.00																											
356			Estudios de preinversión completados	0 days	25/8/20	25/8/20	\$0.00																											
357			P25. Construcción del hospital completado	830 days	26/8/20	31/10/23	\$39,747,880.00																											
358			Proceso de contratación	132 days	26/8/20	25/2/21	\$0.00																											
359			Ejecución de obras	792 edays	25/2/21	28/4/23	\$39,240,000.00																											
360			Construcción completada	0 days	28/4/23	28/4/23	\$0.00																											
361			Sin Asignación Específica	0 days	28/4/23	28/4/23	\$35,000.00																											
362			Imprevistos	132 days	1/5/23	31/10/23	\$472,880.00																											
363			Ejecución de servicios	132 days	1/5/23	31/10/23	\$472,880.00																											
364			Puesta en marcha del hospital completada	0 days	31/10/23	31/10/23	\$0.00																											
365			P26. Equipamiento del hospital instalado y funcionando	390 days	1/12/21	30/5/23	\$26,780,000.00																											
366			Proceso de contratación	132 days	1/12/21	2/6/22	\$0.00																											
367			Ejecución de adquisición	198 days	26/8/22	30/5/23	\$26,780,000.00																											
368			Equipamiento de hospital instalado y funcionando	0 days	30/5/23	30/5/23	\$0.00																											
369			P27. Supervisión de los diseños, construcción y equipamiento, realizado	852 days	27/7/20	31/10/23	\$1,569,600.00																											
370			Proceso de contratación	132 days	27/7/20	26/1/21	\$0.00																											
371			Ejecución de servicios	1008 edays	26/1/21	31/10/23	\$0.00																											
372			Supervisión completada	0 days	31/10/23	31/10/23	\$1,569,600.00																											
373			Hospital Pediátrico de 3er. Nivel, construido, equipado y operando	0 days	31/10/23	31/10/23	\$0.00																											
374			Sub-componente 2.4. Puesta en marcha de los nuevos hospitales (US\$2,7MM)	859 days	3/3/20	17/6/23	\$2,700,000.00																											

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
375			P28. Planes de apertura y/o migración de los nuevos hospitales, elaborados	242 days	3/3/20	3/2/21	\$100,000.00																											
376			Proceso de contratación	88 days	3/3/20	2/7/20	\$0.00																											
377			Ejecución de servicios	154 days	3/7/20	3/2/21	\$100,000.00																											
378			Planes de apertura y/o migración elaborados	0 days	3/2/21	3/2/21	\$0.00																											
379			P29. Asistencia técnica para puesta en marcha y acompañamiento de hospitales 2do y 3er nivel, completada	605 days	22/2/21	17/6/23	\$2,600,000.00																											
380			Plan para puesta en marcha de hospitales de 2do nivel, completado	605 days	22/2/21	17/6/23	\$1,700,000.00																											
381			Proceso de contratación	132 days	22/2/21	24/8/21	\$0.00																											
382			Ejecución de servicios	540 edays	24/12/21	17/6/23	\$1,700,000.00																											
383			Puesta en marcha hospitales 2do. Nivele completado	0 days	17/6/23	17/6/23	\$0.00																											
384			Plan para puesta en marcha de hospital de 3er nivel, completado	531 days	22/2/21	6/3/23	\$900,000.00																											
385			Proceso de contratación	132 days	22/2/21	24/8/21	\$0.00																											
386			Ejecución de servicios	311 days	27/12/21	6/3/23	\$900,000.00																											
387			Puesta en marcha hospital 3er. Nivele completado	0 days	6/3/23	6/3/23	\$0.00																											
388			Componente 3: Auditorías, administración, y monitoreo y evaluación (US\$8,7 MM)	1258 days	18/1/19	14/11/23	\$8,700,000.00																											
389			Sub Componente 3.1 Auditoría, administracion, monitoreo y evaluación - UEP	1258 days	18/1/19	14/11/23	\$3,600,000.00																											
390			Equipos ejecutores del programa contratados (Especialistas técnicos, sociales y ambientales, contratados)	1130 days	18/1/19	18/5/23	\$2,150,000.00																											
391			UEP conformada y operando	1130 days	18/1/19	18/5/23	\$2,150,000.00																											
392			Proceso de contratación personal	66 days	18/1/19	19/4/19	\$0.00																											
393			UEP operando	1490 edays	19/4/19	18/5/23	\$1,616,650.00																											
394			Operacion y Equipamiento UEP	1490 edays	19/4/19	18/5/23	\$533,350.00																											
395			Auditorías (anuales y finales) UEP	1098 days	30/8/19	14/11/23	\$250,000.00																											
396			Proceso de contratacion	88 days	30/8/19	31/12/19	\$0.00																											
397			Ejecución año 1	76 days	1/1/20	15/4/20	\$50,000.00																											
398			Ejecución año 2	76 days	1/1/21	16/4/21	\$50,000.00																											
399			Ejecución año 3	76 days	3/1/22	18/4/22	\$50,000.00																											
400			Ejecución año 4	76 days	3/1/23	18/4/23	\$50,000.00																											
401			Ejecución año final	66 days	15/8/23	14/11/23	\$50,000.00																											
402			Estudios de evaluación y monitoreo	176 days	23/4/21	24/12/21	\$300,000.00																											
403			Proceso de contratación	88 days	23/4/21	24/8/21	\$0.00																											
404			Ejecución de los servicios	88 days	25/8/21	24/12/21	\$300,000.00																											
405			Evaluación de Impacto	264 days	29/6/22	3/7/23	\$900,000.00																											
406			Proceso de contratación	132 days	29/6/22	29/12/22	\$0.00																											

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
407			Ejecución de los servicios	132 days	30/12/22	3/7/23	\$900,000.00																											
408			Sub Componente 3.2 Auditoría, administracion, monitoreo y evaluación - AISEM	1258 days	18/1/19	14/11/23	\$5,100,000.00																											
409			Equipos ejecutores del programa contratados (Especialistas técnicos, sociales y ambientales, contratados)	1258 days	18/1/19	14/11/23	\$4,550,000.00																											
410			AISEM - UEP conformada y operando	1258 days	18/1/19	14/11/23	\$4,550,000.00																											
411			Proceso de contratación personal	66 days	18/1/19	19/4/19	\$0.00																											
412			UEP operando	1670 edays	19/4/19	14/11/23	\$3,750,000.00																											
413			Operacion y Equipamiento UEP	1670 edays	19/4/19	14/11/23	\$800,000.00																											
414			Fortalecimiento de la AISEM	653 days	22/5/19	20/11/21	\$300,000.00																											
415			Asistencia para incrementar capacidades técnicas de la AISEM	653 days	22/5/19	20/11/21	\$300,000.00																											
416			Proceso de contratación	132 days	22/5/19	21/11/19	\$0.00																											
417			Ejecución de servicios	730 edays	21/11/19	20/11/21	\$300,000.00																											
418			Auditorías (anuales y finales) AISEM	1098 days	30/8/19	14/11/23	\$250,000.00																											
419			Proceso de contratacion	88 days	30/8/19	31/12/19	\$0.00																											
420			Ejecución año 1	76 days	1/1/20	15/4/20	\$50,000.00																											
421			Ejecución año 2	76 days	1/1/21	16/4/21	\$50,000.00																											
422			Ejecución año 3	76 days	3/1/22	18/4/22	\$50,000.00																											
423			Ejecución año 4	76 days	3/1/23	18/4/23	\$50,000.00																											
424			Ejecución año final	66 days	15/8/23	14/11/23	\$50,000.00																											
425			Fin del programa	0 days	14/11/23	14/11/23	\$0.00																									14/11		

14/11
