

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Número(s) de Préstamo: 2121/OC-BR
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): BR-L1043, BR-T1225
Subtipo de Operación: GCR - Operación Global de Crédito

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 13.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:
% Desembolsado:
Saldo: 13.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 13.000.000,00
Actual BID: 13.000.000,00
Pari-passu: 50,00
Co-financiamiento/País: 13.000.000,00
Estimado Original: 26.000.000,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013
Validado por Representante de País: 09-oct-2013

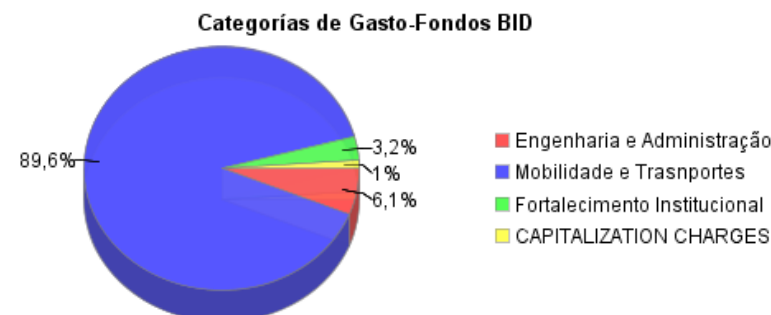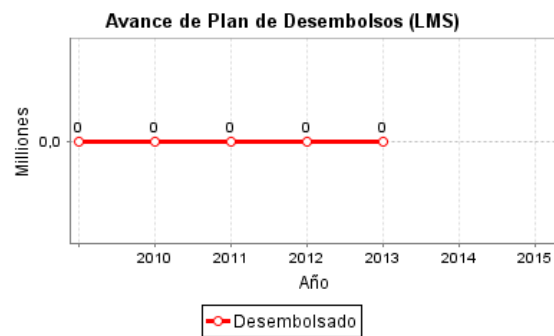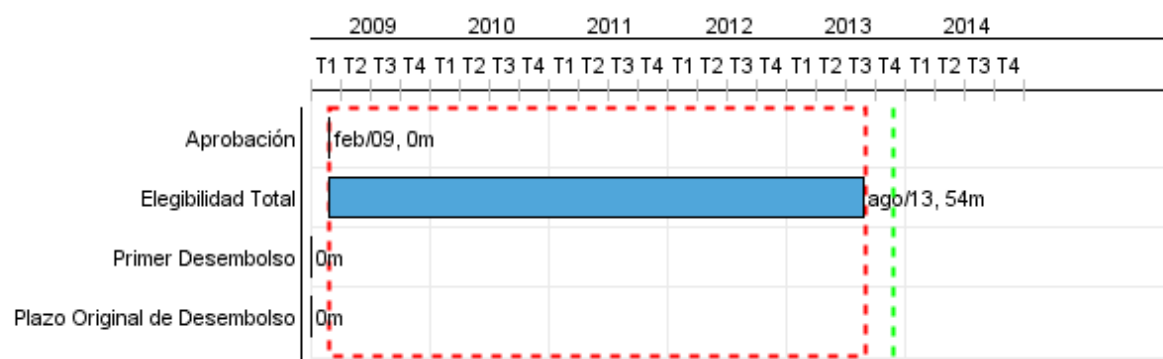

Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Percepción del transporte público mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de transporte urbano y tránsito en el Municipio de Maringá.	Porcentaje	35,00	2007	P						60,00
				A						

Resultado: Transporte Público: BRT implantado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
2.1.1 - Tiempo promedio de viaje en el corredor BRT (Este-Oeste) en la hora pico de la mañana.	Minutos	103,00	2007	P						92,70
				A						
2.1.2 - Costo operacional de la flota de autobuses de Maringá.	Veh-km	1.137.152,00	2007	P						981.875,00
				A						
2.1.3 - Nivel de saturación del Terminal Central.	Viajes/hora	220,00	2007	P						119,00
				A						

Resultado: Transporte por vehículo privado mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
2.2.1 - Tiempo promedio de viaje por automóviles en las vías principales (en los tramos de control).	Viajes/hora	17,50	2007	P						10,40
				A						
2.2.2 - Costos de operación de los automóviles en las vías del centro de la ciudad.	Lt/km	0,15	2007	P						0,12
				A						

Resultado: Fortalecimiento Institucional mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
3.1 - Recaudación de los tributos municipales.	Millones de dólares/año	3.521,13	2007	P						2.992,72
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 2. Transporte y Movilidad									
2.1.a - Corredor BRT Este-Oeste construido.	Km				6,00				7.749.000,00
2.1.b - Terminales de integración del corredor BRT construidos.	Unidad				2,00				1.701.000,00
2.2.a - Binarios en el eje Norte-Sur construidos.	Km				12,20				1.680.000,00
2.2.b - Anillo Oeste del campus de la Universidad Estatal de Maringá construido.	Km				4,60				3.310.000,00
2.2.c - Modernización del Sistema de Semáforos en el centro de la ciudad implantada.	Unidad				1,00				900.000,00
2.3 - Paso subterráneo del Ferrocarril por el centro de la ciudad construido.	Km				5,00				4.760.000,00
Componente 3. Fortalecimiento Institucional									
3.1.1 - Catastro IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) desarrollado.	Unidad				1,00				149.000,00
3.1.2 - Base Digital actualizada.	Unidad				1,00				44.000,00
3.1.3 - Equipos de cómputo adquiridos.	Unidad				1,00				151.000,00
3.1.4 - Software de gestión tributaria implantado.	Unidad				1,00				172.000,00
3.2 - Plan de Expansión Urbana de Maringá desarrollado.	Unidad				1,00				199.000,00
3.3 - Capacitación realizada y software de gestión de tránsito implantado.	Personas				10,00				14.000,00
Otros									
Gastos Concorrentes	N/A								3.795.000,00
Engenharia e Administração	N/A								1.376.000,00
TOTAL									26.000.000,00
