

Matriz de planificación física y financiera en la última página

ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	Gantt Chart															
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
0	PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL II (Operación NI-L1097)	70.9	1430.75 days	Nov 23 '16	May 18 '22	\$ 89,839,000.00	\$ 87,000,000.00	\$ 2,839,000.00	<div></div>															
1	Componente 1. Mejoramiento de Caminos Rurales	70.9	1227.75 days	Jun 2 '17	Feb 15 '22	\$ 74,177,000.00	\$ 72,870,000.00	\$ 1,307,000.00	<div></div>															
2	Productos 1: Mejoramiento del Tramo de Camino El Comejen – Waslala (30.90 Km.)	30.9	1172 days	Jun 2 '17	Nov 29 '21	\$ 29,189,000.00	\$ 28,697,000.00	\$ 492,000.00	<div></div>															
3	Procesos de Adquisiciones	0	134 days	Jun 2 '17	Dec 6 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
4	Licitación y contratación de las obras (LPI – Revisión Ex Ante)	0	129 days	Jun 9 '17	Dec 6 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
5	Presentación del Cronograma del Proceso de Licitación	0	10 days	Jul 14 '17	Jul 28 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
6	Aval Técnico de los Diseños y Especificaciones Técnicas	0	1 day	Jul 28 '17	Jul 28 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
7	Elaboración de DDL	0	50 days	Jun 9 '17	Aug 17 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
8	Solicitud de No Objeción al BID	0	1 day	Aug 18 '17	Aug 18 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
9	No Objeción del BID	0	5 days	Aug 21 '17	Aug 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
10	Publicación al llamado de licitación	0	8 days	Aug 28 '17	Sep 6 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
11	Presentación de ofertas	0	45 days	Aug 29 '17	Oct 13 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
									<div></div>															
12	Evaluación de propuestas técnicas	0	15 days	Oct 13 '17	Nov 2 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
13	Solicitud de No Objeción al BID al Informe de Evaluación	0	1 day	Nov 3 '17	Nov 3 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															
14	No Objeción del BID	0	5 days	Nov 6 '17	Nov 10 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<div></div>															





[illegible]











PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
75	Programa mês 12	0	22 days	ov 23 '18	Dec 24 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
76	Tramite de Pago facturación mes 12	0	10 days	Dec 25 '18	Jan 7 '19	\$ 787,000.00	\$ 775,900.00	\$ 11,100.00														
77	Contrato de Supervisión 2018	0	271 days	Jan 15 '18	Jan 28 '19	\$ 415,200.00	\$ 345,600.00	\$ 69,600.00														
78	Programa mes 2	0	21 days	Jan 15 '18	Feb 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
79	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	Feb 13 '18	Feb 26 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
80	Programa mes 3	0	22 days	Feb 13 '18	Mar 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
81	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	Mar 15 '18	Mar 28 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
82	Programa mes 4	0	21 days	Mar 15 '18	Apr 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
83	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	Apr 13 '18	Apr 26 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
84	Programa mes 5	0	22 days	Apr 13 '18	May 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
85	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	ay 15 '18	May 28 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
86	Programa mes 6	0	22 days	ay 15 '18	Jun 13 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
87	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	Jun 14 '18	Jun 27 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
88	Programa mes 7	0	21 days	Jun 14 '18	Jul 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
89	Tramite de Pago facturación me	0	10 days	Jul 13 '18	Jul 26 '18	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														









PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
135	Programa mes 16	0	20 days	Mar 18 '19	Apr 12 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
136	Tramite de Pago facturación mes 16	0	10 days	Apr 15 '19	Apr 26 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
137	Programa mes 17	0	22 days	Apr 15 '19	May 14 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
138	Tramite de Pago facturación mes 17	0	10 days	May 15 '19	May 28 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
139	Programa mes 18	0	22 days	ay 15 '19	Jun 13 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
140	Tramite de Pago facturación mes 18	0	10 days	Jun 14 '19	Jun 27 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
141	Programa mes 19	0	22 days	Jun 14 '19	Jul 15 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
142	Tramite de Pago facturación mes 19	0	10 days	Jul 16 '19	Jul 29 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
143	Programa mes 20	0	22 days	Jul 16 '19	Aug 14 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
144	Tramite de Pago facturación mes 20	0	10 days	Aug 15 '19	Aug 28 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
145	Programa mes 21	0	22 days	Aug 15 '19	Sep 13 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
146	Tramite de Pago facturación mes 21	0	10 days	Sep 16 '19	Sep 27 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
147	Programa mes 22	0	21 days	Sep 16 '19	Oct 14 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
148	Tramite de Pago facturación mes 22	0	10 days	Oct 15 '19	Oct 28 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
149	Programa mes 23	0	22 days	Oct 15 '19	Nov 13 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 10																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016 H1   H2		2017 H1   H2		2018 H1   H2		2019 H1   H2		2020 H1   H2		2021 H1   H2		2022 H1   H2	
150	Tramite de Pago facturación mes 23	0	10 days	Nov 14 '19	Nov 27 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
151	Programa mes 24	0	22 days	ov 14 '19	Dec 13 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
152	Tramite de Pago facturación mes 24	0	9 days	Dec 16 '19	Dec 26 '19	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
153	Programa mes 25	0	20 days	Dec 16 '19	Jan 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
154			0	Jan 13 '20	Jan 24 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00														
155			15.9	2/24 '19	Dec 28 '20	\$ 8,569,100.00	\$ 8,409,100.00	\$ 160,000.00														
156	Contrato de Obras 2020	15.9	265 days	Dec 24 '19	Dec 28 '20	\$ 8,188,500.00	\$ 8,092,300.00	\$ 96,200.00														
157	Meta Física 2020	15.9	255 days	Jan 7 '20	Dec 28 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
158	Ejecución Financiera 2020	0	250 days	Dec 24 '19	Dec 7 '20	\$ 8,188,500.00	\$ 8,092,300.00	\$ 96,200.00														
159	Programa mes 25	0	21 days	Dec 24 '19	Jan 21 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
160	Tramite de Pago facturación mes 25	0	10 days	Jan 22 '20	Feb 4 '20	\$ 1,171,200.00	\$ 1,154,700.00	\$ 16,500.00														
161	Programa mes 26	0	22 days	Jan 22 '20	Feb 20 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
162	Tramite de Pago facturación mes 26	0	10 days	Feb 21 '20	Mar 5 '20	\$ 904,400.00	\$ 891,700.00	\$ 12,700.00														
163	Programa mes 27	0	22 days	Feb 21 '20	Mar 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
164	Tramite de Pago facturación mes 27	0	10 days	Mar 24 '20	Apr 6 '20	\$ 520,000.00	\$ 512,700.00	\$ 7,300.00														
				0																		






PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
165	Programa mes 28	0	22 days	Mar 24 '20	Apr 22 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
166	Tramite de Pago facturación mes 28	0	10 days	Apr 23 '20	May 6 '20	\$ 368,800.00	\$ 363,600.00	\$ 5,200.00														
167	Programa mes 29	0	22 days	Apr 23 '20	May 22 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
168	Tramite de Pago facturación mes 29	0	10 days	May 25 '20	Jun 5 '20	\$ 335,500.00	\$ 330,800.00	\$ 4,700.00														
169	Programa mes 30	0	22 days	ay 25 '20	Jun 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
170	Tramite de Pago facturación mes 30	0	10 days	Jun 24 '20	Jul 7 '20	\$ 322,200.00	\$ 317,700.00	\$ 4,500.00														
171	Programa mes 31	0	22 days	Jun 24 '20	Jul 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
172	Tramite de Pago facturación mes 31	0	10 days	Jul 24 '20	Aug 6 '20	\$ 282,900.00	\$ 278,900.00	\$ 4,000.00														
173	Programa mes 32	0	22 days	Jul 24 '20	Aug 24 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
174	Tramite de Pago facturación mes 32	0	10 days	Aug 25 '20	Sep 7 '20	\$ 279,000.00	\$ 275,100.00	\$ 3,900.00														
175	Programa mes 33	0	22 days	Aug 25 '20	Sep 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
176	Tramite de Pago facturación mes 33	0	10 days	Sep 24 '20	Oct 7 '20	\$ 1,050,800.00	\$ 1,036,000.00	\$ 14,800.00														
177	Programa mes 34	0	22 days	Sep 24 '20	Oct 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
178	Tramite de Pago facturación mes 34	0	10 days	Oct 26 '20	Nov 6 '20	\$ 752,500.00	\$ 741,900.00	\$ 10,600.00														
179	Programa mes 35	0	21 days	Oct 26 '20	Nov 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 12																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB								
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
180	Tramite de Pago facturación mes 35	0	10 days	Nov 24 '20	Dec 7 '20	\$ 2,201,200.00	\$ 2,189,200.00	\$ 12,000.00								
181	Contrato de Supervisión 2020	0	251 days	Jan 13 '20	Dec 28 '20	\$ 380,600.00	\$ 316,800.00	\$ 63,800.00								
182	Programa mes 26	0	23 days	Jan 13 '20	Feb 12 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
183	Tramite de Pago facturación mes 26	0	10 days	Feb 13 '20	Feb 26 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								
184	Programa mes 27	0	22 days	Feb 13 '20	Mar 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
185	Tramite de Pago facturación mes 27	0	10 days	Mar 16 '20	Mar 27 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								
186	Programa mes 28	0	21 days	Mar 16 '20	Apr 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
187	Tramite de Pago facturación mes 28	0	10 days	Apr 14 '20	Apr 27 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								
188	Programa mes 29	0	22 days	Apr 14 '20	May 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
189	Tramite de Pago facturación mes 29	0	10 days	May 14 '20	May 27 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								
190	Programa mes 30	0	22 days	May 14 '20	Jun 12 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
191	Tramite de Pago facturación mes 30	0	10 days	Jun 15 '20	Jun 26 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								
192	Programa mes 31	0	22 days	Jun 15 '20	Jul 14 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
193	Tramite de Pago facturación mes 31	0	10 days	Jul 15 '20	Jul 28 '20	\$ 34,600.00	\$ 28,800.00	\$ 5,800.00								

Página 13

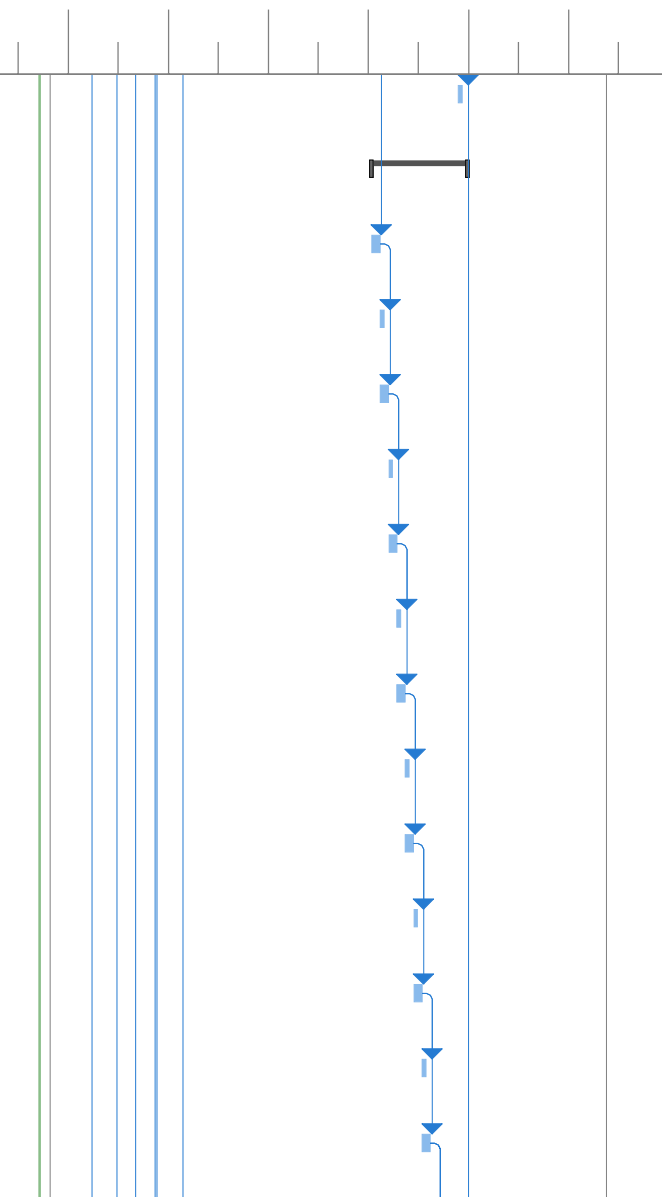





PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II																						
OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
210	Tramite de Pago Cierre y Finiqu	0	10 days	ov 16 '21	Nov 29 '21	\$ 66,200.00	\$ 56,000.00	\$ 10,200.00														
211	Producto 2: Mejoramiento de Caminos Rurales (proyecto por confirmar)	40	1147.75 days	Sep 22 '17	Feb 15 '22	\$ 44,908,000.00	\$ 44,093,000.00	\$ 815,000.00														
212	Procesos de Adquisiciones	0	149 days	Sep 22 '17	Apr 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
213	Licitación y contratación de las Obras (LPI – Revisión Ex Ante)	0	129 days	Oct 20 '17	Apr 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
214	Presentación del Cronograma del Proceso de Licitación	0	10 days	Nov 3 '17	Nov 17 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
215	Aval Técnico de los Diseños y Especificaciones Técnicas	0	1 day	Nov 17 '17	Nov 17 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
216	Elaboración de DDL	0	50 days	Oct 20 '17	Dec 28 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
217	Solicitud de No Objeción al BID	0	1 day	Dec 29 '17	Dec 29 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
218	No Objeción del BID	0	5 days	Jan 1 '18	Jan 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
219	Publicación al llamado de licitació	0	8 days	Jan 8 '18	Jan 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
220	Presentación de ofertas	0	45 days	Jan 9 '18	Feb 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
221	Evaluación de propuestas técnicas	0	15 days	Feb 23 '18	Mar 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
222	Solicitud de No Objeción al BID al Informe de Evaluación	0	1 day	Mar 16 '18	Mar 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
223	No Objeción del BID	0	5 days	Mar 19 '18	Mar 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
224	Adjudicación del contrato	0	8 days	Mar 26 '18	Apr 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 15																						



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
240	Evaluación combinada técnica – económica	0	8 days	Jan 24 ‘18	Feb 5 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	 													
241	Negociación con la empresa consultora	0	5 days	Feb 5 ‘18	Feb 12 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
242	Solicitud de No Objeción del BID al Informe de Evaluación y Borrador del Contrato	0	1 day	Feb 12 ‘18	Feb 13 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
243	No Objeción del BID	0	5 days	Feb 13 ‘18	Feb 20 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
244	Adjudicación del contrato	0	8 days	Feb 20 ‘18	Mar 2 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
245	Suscripción del contrato	0	5 days	Mar 2 ‘18	Mar 9 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
246	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Mar 9 ‘18	Mar 13 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
	Ejecución de Obras	40	1007 days	Apr 6 ‘18	Feb 15 ‘22	\$ 44,908,000.00	\$ 44,093,000.00	\$ 815,000.00														
248	Ejecución Año 2018	0	211 days	Apr 6 ‘18	Jan 28 ‘19	\$ 12,415,100.00	\$ 12,287,300.00	\$ 127,800.00														
249	Contrato de Obras 2018	0	189 days	May 8 ‘18	Jan 28 ‘19	\$ 11,409,500.00	\$ 11,365,700.00	\$ 43,800.00														
250	Entrega de Adelanto	0	10 days	May 10 ‘18	May 23 ‘18	\$ 8,319,400.00	\$ 8,319,400.00	\$ 0.00														
251	Orden de Inicio	0	1 day	Jun 4 ‘18	Jun 5 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
252	Meta Física 2018	0	167 days	May 8 ‘18	Dec 27 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
253	Ejecución Financiera	0	170 days	Jun 4 ‘18	Jan 28 ‘19	\$ 3,090,100.00	\$ 3,046,300.00	\$ 43,800.00														
254	Programa mes 1	0	29 days	Jun 4 ‘18	Jul 13 ‘18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														








269	Entrega de Adelanto	0	20 days	Apr 6 '18	May 4 '18	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	\$ 0.00
-----	---------------------	---	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016 H1H2		2017 H1H2		2018 H1H2		2019 H1H2		2020 H1H2		2021 H1H2		2022 H1H2	
270	Orden de Inicio	0	1 day	May 4 '18	May 7 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
271	Ejecución Financiera	0	187 days	May 7 '18	Jan 23 '19	\$ 506,400.00	\$ 422,400.00	\$ 84,000.00														
272	Programa mes 1	0	26 days	May 7 '18	Jun 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
273	Tramite de Pago facturación mes 1	0	10 days	Jun 12 '18	Jun 26 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
274	Programa mes 2	0	21 days	Jun 12 '18	Jul 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
275	Tramite de Pago facturación mes 2	0	10 days	Jul 11 '18	Jul 25 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
276	Programa mes 3	0	22 days	Jul 11 '18	Aug 10 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
277	Tramite de Pago facturación mes 3	0	10 days	Aug 10 '18	Aug 24 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
278	Programa mes 4	0	22 days	Aug 10 '18	Sep 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
279	Tramite de Pago facturación mes 4	0	10 days	Sep 11 '18	Sep 25 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
280	Programa mes 5	0	20 days	Sep 11 '18	Oct 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
281	Tramite de Pago facturación mes 5	0	10 days	Oct 9 '18	Oct 23 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
282	Programa mes 6	0	22 days	Oct 9 '18	Nov 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
283	Tramite de Pago facturación mes 6	0	10 days	Nov 8 '18	Nov 22 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00														
284	Programa mes 7	0	23 days	Nov 8 '18	Dec 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 19																						

ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097							
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
285	Tramite de Pago facturación mes 7	0	10 days	Dec 11 '18	Dec 25 '18	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00								
286	Programa mes 8	0	21 days	Dec 11 '18	Jan 9 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
287	Tramite de Pago facturación mes 8	0	10 days	Jan 9 '19	Jan 23 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00								
288	<b>Ejecución año 2019</b>	<b>5</b>	<b>76.75 days</b>	<b>Jan 3 '19</b>	<b>Jan 24 '20</b>	<b>\$ 9,902,200.00</b>	<b>\$ 9,647,400.00</b>	<b>\$ 254,800.00</b>								
289	<b>Contrato de Obras 2019</b>	<b>5</b>	<b>76.75 days</b>	<b>Jan 3 '19</b>	<b>Jan 24 '20</b>	<b>\$ 9,142,600.00</b>	<b>\$ 9,013,800.00</b>	<b>\$ 128,800.00</b>								
290	Meta Física 2019	5	255 days	Jan 3 '19	Dec 25 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
291	<b>Ejecución Financiera</b>	<b>0</b>	<b>270 days</b>	<b>Jan 11 '19</b>	<b>Jan 24 '20</b>	<b>\$ 9,142,600.00</b>	<b>\$ 9,013,800.00</b>	<b>\$ 128,800.00</b>								
292	Programa mes 8	0	22 days	Jan 11 '19	Feb 12 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
293	Tramite de Pago facturación mes 8	0	10 days	Feb 12 '19	Feb 26 '19	\$ 327,200.00	\$ 322,600.00	\$ 4,600.00								
294	Programa mes 9	0	22 days	Feb 12 '19	Mar 14 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
295	Tramite de Pago facturación mes 9	0	10 days	Mar 14 '19	Mar 28 '19	\$ 297,400.00	\$ 293,200.00	\$ 4,200.00								
296	Programa mes 10	0	21 days	Mar 14 '19	Apr 12 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
297	Tramite de Pago facturación mes 10	0	10 days	Apr 12 '19	Apr 26 '19	\$ 1,169,400.00	\$ 1,153,000.00	\$ 16,400.00								
298	Programa mes 11	0	21 days	Apr 12 '19	May 13 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
299	Tramite de Pago facturación mes 11	0	8 days	May 13 '1												

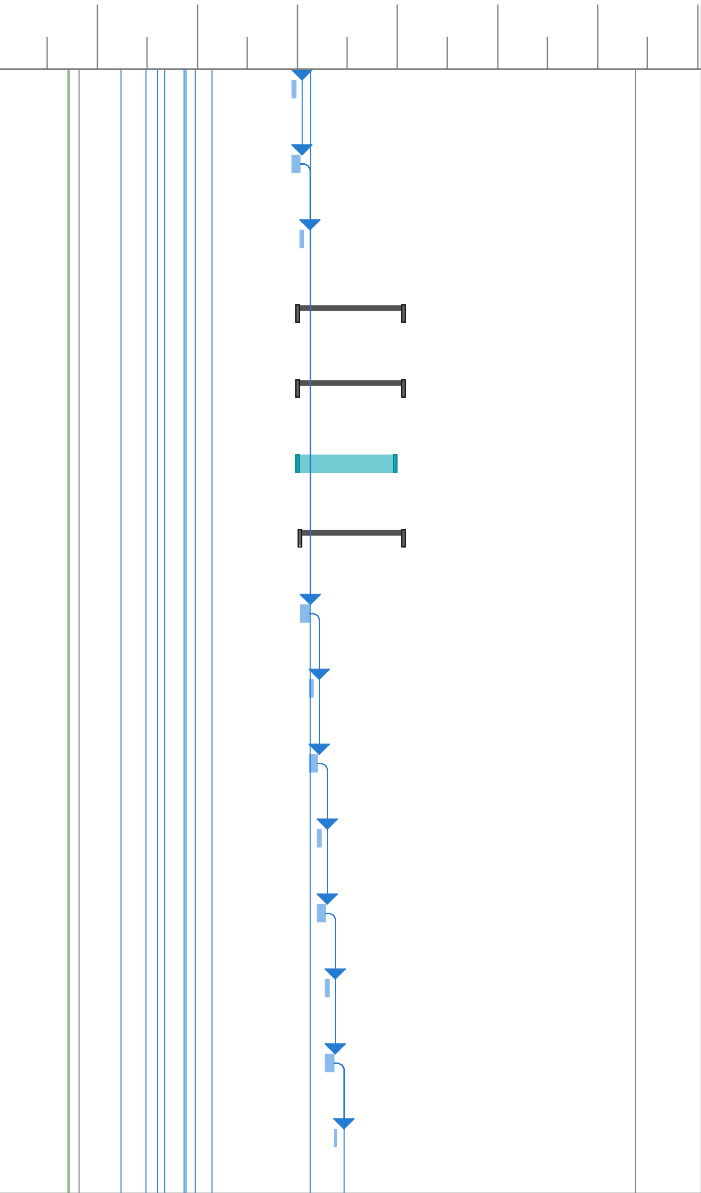

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016 H1H2		2017 H1H2		2018 H1H2		2019 H1H2		2020 H1H2		2021 H1H2		2022 H1H2	
300	Programa mes 12	0	21 days	ay 13 '19	Jun 11 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
301	Tramite de Pago facturación mes 12	0	10 days	Jun 11 '19	Jun 25 '19	\$ 1,217,500.00	\$ 1,200,300.00	\$ 17,200.00														
302	Programa mes 13	0	22 days	Jun 11 '19	Jul 11 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
303	Tramite de Pago facturación mes 13	0	10 days	Jul 11 '19	Jul 25 '19	\$ 1,353,900.00	\$ 1,334,800.00	\$ 19,100.00														
304	Programa mes 14	0	21 days	Jul 11 '19	Aug 9 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
305	Tramite de Pago facturación mes 14	0	10 days	Aug 9 '19	Aug 23 '19	\$ 916,200.00	\$ 903,300.00	\$ 12,900.00														
306	Programa mes 15	0	22 days	Aug 9 '19	Sep 10 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
307	Tramite de Pago facturación mes 15	0	10 days	Sep 10 '19	Sep 24 '19	\$ 663,900.00	\$ 654,500.00	\$ 9,400.00														
308	Programa mes 16	0	21 days	Sep 10 '19	Oct 9 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
309	Tramite de Pago facturación mes 16	0	10 days	Oct 9 '19	Oct 23 '19	\$ 577,600.00	\$ 569,500.00	\$ 8,100.00														
310	Programa mes 17	0	22 days	Oct 9 '19	Nov 8 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
311	Tramite de Pago facturación mes 17	0	10 days	Nov 8 '19	Nov 22 '19	\$ 512,500.00	\$ 505,300.00	\$ 7,200.00														
312	Programa mes 18	0	22 days	Nov 8 '19	Dec 10 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
313	Tramite de Pago facturación mes 18	0	10 days	Dec 10 '19	Dec 24 '19	\$ 475,000.00	\$ 468,300.00	\$ 6,700.00														
314	Programa mes 19	0	23 days	Dec 10 '19	Jan 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 21																						






PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																				
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB												
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
330	Tramite de Pago facturación mes 15	0	10 days	Aug 12 '19	Aug 26 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
331	Programa mes 16	0	21 days	Aug 12 '19	Sep 10 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
332	Tramite de Pago facturación mes 16	0	10 days	Sep 10 '19	Sep 24 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
333	Programa mes 17	0	21 days	Sep 10 '19	Oct 9 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
334	Tramite de Pago facturación mes 17	0	10 days	Oct 9 '19	Oct 23 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
335	Programa mes 18	0	22 days	Oct 9 '19	Nov 8 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
336	Tramite de Pago facturación mes 18	0	10 days	Nov 8 '19	Nov 22 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
337	Programa mes 19	0	22 days	Nov 8 '19	Dec 10 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
338	Tramite de Pago facturación mes 19	0	10 days	Dec 10 '19	Dec 24 '19	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
339	Programa mes 20	0	22 days	Dec 10 '19	Jan 9 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
340	Tramite de Pago facturación mes 20	0	10 days	Jan 9 '20	Jan 23 '20	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00												
341	Ejecución año 2020	18	75.75 days	Jan 7 '20	Jan 26 '21	\$ 12,134,000.00	\$ 11,848,000.00	\$ 286,000.00												
342	Contrato de Obras 2020	18	75.75 days	Jan 7 '20	Jan 26 '21	\$ 11,374,400.00	\$ 11,214,400.00	\$ 160,000.00												
343	Meta Física 2020	18	255 days	Jan 7 '20	Dec 28 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
344	Ejecución Financiera	0	272 days	Jan 10 '20	Jan 26 '21	\$ 11,374,400.00	\$ 11,214,400.00	\$ 160,000.00												



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016 H1H2		2017 H1H2		2018 H1H2		2019 H1H2		2020 H1H2		2021 H1H2		2022 H1H2	
345	Programa mes 20	0	23 days	Jan 10 '20	Feb 12 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
346	Tramite de Pago facturación mes 20	0	10 days	Feb 12 '20	Feb 26 '20	\$ 475,000.00	\$ 468,300.00	\$ 6,700.00														
347	Programa mes 21	0	22 days	Feb 12 '20	Mar 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
348	Tramite de Pago facturación mes 21	0	10 days	Mar 13 '20	Mar 27 '20	\$ 478,700.00	\$ 472,000.00	\$ 6,700.00														
349	Programa mes 22	0	21 days	Mar 13 '20	Apr 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
350	Tramite de Pago facturación mes 22	0	10 days	Apr 13 '20	Apr 27 '20	\$ 1,164,000.00	\$ 1,147,700.00	\$ 16,300.00														
351	Programa mes 23	0	22 days	Apr 13 '20	May 13 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
352	Tramite de Pago facturación mes 23	0	10 days	May 13 '20	May 27 '20	\$ 1,335,100.00	\$ 1,316,300.00	\$ 18,800.00														
353	Programa mes 24	0	21 days	ay 13 '20	Jun 11 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
354	Tramite de Pago facturación mes 24	0	10 days	Jun 11 '20	Jun 25 '20	\$ 1,880,800.00	\$ 1,854,400.00	\$ 26,400.00														
355	Programa mes 25	0	21 days	Jun 11 '20	Jul 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
356	Tramite de Pago facturación mes 25	0	10 days	Jul 10 '20	Jul 24 '20	\$ 1,811,800.00	\$ 1,786,300.00	\$ 25,500.00														
357	Programa mes 26	0	22 days	Jul 10 '20	Aug 11 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
358	Tramite de Pago facturación mes 26	0	10 days	Aug 11 '20	Aug 25 '20	\$ 1,399,100.00	\$ 1,379,400.00	\$ 19,700.00														
359	Programa mes 27	0	22 days	Aug 11 '20	Sep 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 24																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB								
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
360	Tramite de Pago facturación mes 27	0	10 days	Sep 10 '20	Sep 24 '20	\$ 804,500.00	\$ 793,100.00	\$ 11,400.00								
361	Programa mes 28	0	21 days	Sep 10 '20	Oct 9 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
362	Tramite de Pago facturación mes 28	0	10 days	Oct 9 '20	Oct 23 '20	\$ 570,400.00	\$ 562,400.00	\$ 8,000.00								
363	Programa mes 29	0	22 days	Oct 9 '20	Nov 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
364	Tramite de Pago facturación mes 29	0	10 days	Nov 10 '20	Nov 24 '20	\$ 519,000.00	\$ 511,700.00	\$ 7,300.00								
365	Programa mes 30	0	22 days	Nov 10 '20	Dec 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
366	Tramite de Pago facturación mes 30	0	10 days	Dec 10 '20	Dec 24 '20	\$ 498,400.00	\$ 491,400.00	\$ 7,000.00								
367	Programa mes 31	0	23 days	Dec 10 '20	Jan 12 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
368	Tramite de Pago facturación mes 31	0	10 days	Jan 12 '21	Jan 26 '21	\$ 437,600.00	\$ 431,400.00	\$ 6,200.00								
369	Contrato de Supervisión 2020	0	272 days	Jan 9 '20	Jan 25 '21	\$ 759,600.00	\$ 633,600.00	\$ 126,000.00								
370	Programa mes 21	0	22 days	Jan 9 '20	Feb 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
371	Tramite de Pago facturación mes 21	0	10 days	Feb 10 '20	Feb 24 '20	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00								
372	Programa mes 22	0	21 days	Feb 10 '20	Mar 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
373	Tramite de Pago facturación mes 22	0	10 days	Mar 10 '20	Mar 24 '20	\$ 63,300.00	\$ 52,800.00	\$ 10,500.00								

Página 25

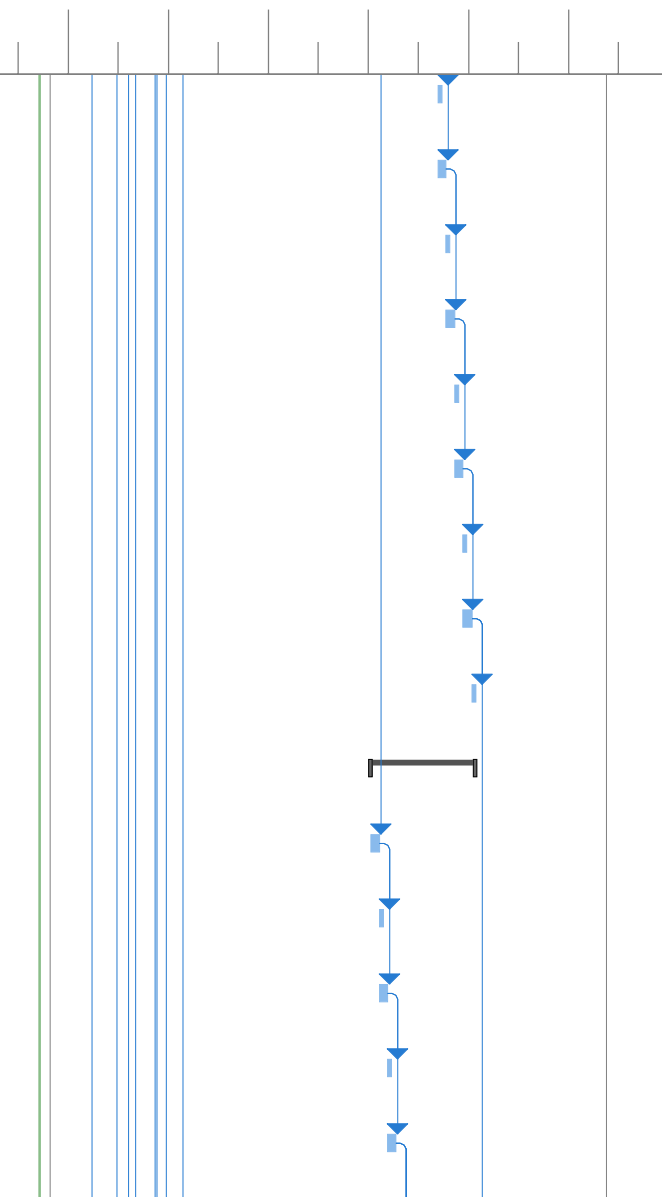



[illegible]







PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II																		
OPERACIÓN NI-L1097																		
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB										
									2016		2017		2018		2019		2020	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
420	Tramite de Pago Cierre y Finiqu	0	8 days	Feb 3 '22	Feb 15 '22	\$ 117,000.00	\$ 96,000.00	\$ 21,000.00										
421	Producto 3: Capacitación de Operadoras de Maquinaria Pesada	0	451 days	Feb 21 '19	Nov 12 '20	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00										
422		Orden de Inicio	0	1 day	Feb 21 '19	Feb 21 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00									
423	Ejecucion de la Consultoría	0	450 days	Feb 22 '19	Nov 12 '20	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00										
424	Componente 2. Fortalecimiento Institucional	0	767 days	Dec 5 '17	Nov 11 '20	\$ 1,403,000.00	\$ 1,330,000.00	\$ 73,000.00										
425	Producto 1: Fortalecimiento a la Gestión Institucional	0	640 days	May 31 '18	Nov 11 '20	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00										
426	Fortalecimiento en el desarrollo institucional (a nivel de postgrado, 30 participantes)	0	640 days	May 31 '18	Nov 11 '20	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00										
427	Procesos de Selección y contratación de consultoría (SCC -	0	122 days	May 31 '18	Nov 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
428	Elaboración DSP	0	30 days	ay 31 '18	Jul 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
429	Publicación Anuncio para solicitud de expresiones de interés	0	7 days	Jul 12 '18	Jul 20 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
430	Presentación de Expresiones de Interés	0	10 days	Jul 13 '18	Jul 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
431	Análisis de expresiones de interés	0	5 days	Jul 27 '18	Aug 2 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
432	Elaboración de lista corta	0	3 days	Aug 3 '18	Aug 7 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
433	Solicitud de no objeción al BID al DSP y Lista Corta	0	1 day	Aug 8 '18	Aug 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
434	No Objeción del BID	0	5 days	Aug 9 '18	Aug 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
Página 29																		

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																																
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022											
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2												
435	Notificación y Remisión de DSP a integrantes de la lista corta	0	1 day	Aug 16 '18	Aug 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
436	Presentación de propuestas	0	25 days	Aug 17 '18	Sep 20 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
437	Evaluación de propuestas técnicas	0	15 days	Sep 21 '18	Oct 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
438	Negociación con la empresa consultora	0	5 days	Oct 12 '18	Oct 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
439	Solicitud de No Objeción del BID al Informe de Evaluación y Borrador del Contrato	0	1 day	Oct 19 '18	Oct 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
440	No Objeción del BID	0	5 days	Oct 22 '18	Oct 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
441	Adjudicación del contrato	0	8 days	Oct 29 '18	Nov 7 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
442	Suscripción del contrato	0	5 days	Nov 8 '18	Nov 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
443	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Nov 15 '18	Nov 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
444	Ejecución de los Servicios de Consultoría	0	520 days	Nov 15 '18	Nov 11 '20	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00																								
445	Inicio de la Capacitación	0	10 days	Nov 15 '18	Nov 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
446	Plan de Implementación y Metodología de Capacitación	0	40 days	Nov 29 '18	Jan 23 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
447	Tramite del 1er. Pago	0	10 days	Feb 21 '19	Mar 6 '19	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 0.00																								
448	Informe de Avance (30%, al 70% de avance)	0	340 days	Nov 29 '18	Mar 18 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
449	Tramite del 2do. Pago	0	10 days	Apr 16 '20	Apr 29 '20	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 0.00																								

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
450	Informe Final (20%)	0	140 days	Mar 19 '20	Sep 30 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
451	Tramite del 3er. Pago y final	0	10 days	Oct 29 '20	Nov 11 '20	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00														
452	Festalecimiento en el desempeño de gestión institucional (a nivel de diplomado y/o técnico, 20	0	337 days	Sep 21 '18	Aug 10 '19	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00														
453	Identificación de la temática del curs	0	80 days	Sep 21 '18	Jan 10 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
454	Negociación de Propuesta	0	10 days	Jan 11 '19	Jan 24 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
455	Borrador de Convenio de Colaboració	0	30 days	Jan 25 '19	Mar 7 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
456	Solicitud de No Objeción	0	1 day	Mar 8 '19	Mar 8 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
457	No Objeción	0	5 days	Mar 11 '19	Mar 15 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
458	Firma de Convenio	0	10 days	Mar 18 '19	Mar 29 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
459	Inicio de la Capacitación	0	1 day	Apr 1 '19	Apr 1 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
460	Tramite del 1er. Pago (80%)	0	10 days	Apr 2 '19	Apr 15 '19	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00														
461	Ejecución del evento	0	90 days	Apr 2 '19	Aug 5 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
462	Tramite 2do. Pago y final (20%)	0	10 days	Aug 6 '19	Aug 19 '19	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00														
463	Producto 2: Equipamiento y Bienes de Apoyo a la UCP	0	483 days	Dec 5 '17	Oct 10 '19	\$ 1,203,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ 73,000.00														
464	Equipamiento de oficinas	0	166 days	Mar 8 '18	Oct 25 '18	\$ 418,000.00	\$ 363,000.00	\$ 55,000.00														
Página 31																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097
---

ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	Gantt Chart															
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
465	Adquisición de Bienes informáticos (20 Computadoras de Escritorios, 10 laptops y 5 fotocopadoras	0	166 days	Mar 8 '18	Oct 25 '18	\$ 155,000.00	\$ 135,000.00	\$ 20,000.00																
466	Procesos de licitación y contratación (LPI, Revisión Ex	0	85 days	Mar 8 '18	Jul 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
467	Elaboración de DDL	0	20 days	Mar 8 '18	Apr 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
468	Solicitud de No Objeción	0	1 day	Apr 5 '18	Apr 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
469	No Objeción	0	5 days	Apr 6 '18	Apr 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
470	Publicación al llamado de licitación	0	7 days	Apr 13 '18	Apr 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
471	Presentación de ofertas	0	45 days	Apr 14 '18	May 29 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
472	Evaluación de ofertas	0	15 days	May 29 '18	Jun 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
473	Solicitud de No Objeción	0	1 day	Jun 19 '18	Jun 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
474	No Objeción	0	5 days	Jun 20 '18	Jun 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
475	Adjudicación del contrato	0	3 days	Jun 27 '18	Jun 29 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
476	Suscripción del contrato	0	2 days	Jul 2 '18	Jul 3 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
477	Envío de contrato firmado al BI	0	1 day	Jul 4 '18	Jul 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																
478	Entrega de Bienes	0	42 days	Aug 29 '18	Oct 25 '18	\$ 155,000.00	\$ 135,000.00	\$ 20,000.00																
479	Acta de Recepción a satisfacció	0	30 days	Aug 29 '18	Oct 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																		
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB										
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
495	Acta de Recepción a satisfacció	0	30 days	Jul 4 '18	Aug 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
496	Tramite de Pago	0	15 days	Aug 15 '18	Sep 4 '18	\$ 219,000.00	\$ 190,000.00	\$ 29,000.00										
497	<b>Adquisición de Muebles de Oficina (40 sillas de escritorio y 20 sillas de procesos de licitación v contratación (CP - Revisión Ex</b>	0	79 days	Apr 19 '18	Aug 7 '18	\$ 15,300.00	\$ 13,300.00	\$ 2,000.00										
498		0	44 days	Apr 19 '18	Jun 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
499		Especificaciones técnicas	0	12 days	Apr 19 '18	May 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00									
500		Publicación o Invitación a presentar ofertas	0	3 days	May 7 '18	May 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00									
501		Presentación de ofertas	0	14 days	May 8 '18	May 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00									
502	Evaluación de Ofertas	0	12 days	May 28 '18	Jun 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
503	Adjudicación de compra	0	3 days	Jun 13 '18	Jun 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
504	Orden de Compra	0	2 days	Jun 18 '18	Jun 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
505	<b>Entrega de Bienes</b>	0	35 days	Jun 20 '18	Aug 7 '18	\$ 15,300.00	\$ 13,300.00	\$ 2,000.00										
506	Acta de Recepción a satisfacción	0	20 days	Jun 20 '18	Jul 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
507	Tramite de Pago	0	15 days	Jul 18 '18	Aug 7 '18	\$ 15,300.00	\$ 13,300.00	\$ 2,000.00										
508	<b>Adquisición de Equipo de Oficina (8 aires acondicionados 24,000 BTU)</b>	0	79 days	Apr 19 '18	Aug 7 '18	\$ 16,700.00	\$ 14,700.00	\$ 2,000.00										
509	<b>Procesos de licitación v contratación (CP - Revisión Ex</b>	0	44 days	Apr 19 '18	Jun 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00										
Página 34																		

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APOORTE BID NI-L1097	APOORTE GOB	2016 H1   H2		2017 H1   H2		2018 H1   H2		2019 H1   H2		2020 H1   H2		2021 H1   H2		2022 H1   H2	
510	Especificaciones técnicas	0	12 days	Apr 19 '18	May 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
511	Publicación o Invitación a presentar ofertas	0	3 days	May 7 '18	May 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
512	Presentación de ofertas	0	14 days	May 8 '18	May 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
513	Evaluación de Ofertas	0	12 days	ay 28 '18	Jun 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
514	Adjudicación de compra	0	3 days	Jun 13 '18	Jun 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
515	Orden de Compra	0	2 days	Jun 18 '18	Jun 19 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
516	Entrega de Bienes	0	35 days	Jun 20 '18	Aug 7 '18	\$ 16,700.00	\$ 14,700.00	\$ 2,000.00														
517	Acta de Recepción a satisfacció	0	20 days	Jun 20 '18	Jul 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
518	Tramite de Pago	0	15 days	Jul 18 '18	Aug 7 '18	\$ 16,700.00	\$ 14,700.00	\$ 2,000.00														
519	Adquisición de Modelo de Analisis de Inversión en Carretera HDM-4 (2 Licencias)	0	76 days	Mar 8 '18	Jun 21 '18	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00														
520	Procesos de licitación y contratación (CP – Revisión Ex	0	41 days	Mar 8 '18	May 3 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
521	Especificaciones técnicas	0	12 days	Mar 8 '18	Mar 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
522	Publicación o Invitación a presentar ofertas	0	3 days	Mar 26 '18	Mar 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00															
523	Presentación de ofertas	0	15 days	Mar 27 '18	Apr 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
524	Evaluación de Ofertas	0	8 days	Apr 17 '18	Apr 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 35																						



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																				
ID	Nombre de tarea	Meta Física	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB												
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
525	Adjudicación de compra	0	3 days	Apr 27 '18	May 1 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
526	Orden de Compra	0	2 days	May 2 '18	May 3 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
527	Entrega de Bienes	0	35 days	May 4 '18	Jun 21 '18	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00												
528	Acta de Recepción a satisfacción	0	20 days	May 4 '18	May 31 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
529	Tramite de Pago	0	15 days	Jun 1 '18	Jun 21 '18	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00												
530	Rehabilitación Física de Oficinas	0	483 days	Dec 5 '17	Oct 10 '19	\$ 785,000.00	\$ 767,000.00	\$ 18,000.00												
531	Procesos de licitación y ejecución de las obras	0	218 days	Mar 13 '18	Jan 10 '19	\$ 707,000.00	\$ 700,000.00	\$ 7,000.00												
532	Procesos de licitación y contratación (LPN - Revisión Ex	0	78 days	Mar 13 '18	Jun 20 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
533	Elaboración de DDL	0	20 days	Mar 13 '18	Apr 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
534	Publicación al llamado de licitación	0	7 days	Apr 10 '18	Apr 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
535	Presentación de ofertas	0	45 days	Apr 11 '18	May 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
536	Evaluación de ofertas	0	15 days	May 28 '18	Jun 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
537	Adjudicación del contrato	0	5 days	Jun 18 '18	Jun 22 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
538	Suscripción del contrato	0	3 days	Jun 25 '18	Jun 27 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
539	Envío de contrato firmado al BI	0	1 day	Jun 28 '18	Jun 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
Página 36																				

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APOORTE BID NI-L1097	APOORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
540	Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación	0	141 days	Jun 28 '18	Jan 10 '19	\$ 707,000.00	\$ 700,000.00	\$ 7,000.00														
541	Entrega de Adelanto	0	10 days	Jun 28 '18	Jul 11 '18	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 0.00														
542	Orden de Inicio	0	1 day	Jul 12 '18	Jul 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
543	Programación Mes 1	0	20 days	Jul 13 '18	Aug 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
544	Tramite de Pago Mes 1	0	10 days	Aug 10 '18	Aug 23 '18	\$ 106,940.00	\$ 105,640.00	\$ 1,300.00														
545	Programación Mes 2	0	20 days	Aug 10 '18	Sep 6 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
546	Tramite de Pago Mes 2	0	10 days	Sep 7 '18	Sep 20 '18	\$ 127,400.00	\$ 125,800.00	\$ 1,600.00														
547	Programación Mes 3	0	20 days	Sep 7 '18	Oct 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
548	Tramite de Pago Mes 3	0	10 days	Oct 5 '18	Oct 18 '18	\$ 132,240.00	\$ 130,640.00	\$ 1,600.00														
549	Programación Mes 4	0	20 days	Oct 5 '18	Nov 1 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
550	Tramite de Pago Mes 4	0	10 days	Nov 2 '18	Nov 15 '18	\$ 113,900.00	\$ 112,500.00	\$ 1,400.00														
551	Cierre Legal y Financiera	0	40 days	Nov 2 '18	Dec 27 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
552	Tramite de Pago Finiquito	0	10 days	Dec 28 '18	Jan 10 '19	\$ 86,520.00	\$ 85,420.00	\$ 1,100.00														
553	Proceso de selección y ejecución de los servicios de supervisión	0	483 days	Dec 5 '17	Oct 10 '19	\$ 78,000.00	\$ 67,000.00	\$ 11,000.00														
554	Selección y contratación de los servicios de supervisión (SBCC – Revisión Ex Ante)	0	131 days	Dec 5 '17	Jun 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
555	Elaboración DSP	0	15 days	Dec 5 '17	Dec 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
556	Publicación Anuncio para solicitud de expresiones de	0	7 days	Dec 26 '17	Jan 3 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
557	Presentación de Expresiones de Interés	0	10 days	Dec 27 '17	Jan 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
558	Análisis de expresiones de interés	0	15 days	Jan 10 '18	Jan 30 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
559	Elaboración de lista corta	0	3 days	Jan 31 '18	Feb 2 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
560	Solicitud de no objeción al BID al DSP y Lista Corta	0	1 day	Feb 5 '18	Feb 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
561	No Objeción del BID	0	5 days	Feb 6 '18	Feb 12 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
562	Notificación y Remisión de DSP a integrantes de la lista	0	1 day	Feb 13 '18	Feb 13 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
563	Presentación de propuestas	0	25 days	Feb 14 '18	Mar 20 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
564	Evaluación de propuestas técnicas	0	15 days	Mar 21 '18	Apr 10 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
565	Solicitud de no objeción del BI	0	1 day	Apr 11 '18	Apr 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
566	No Objeción del BID	0	5 days	Apr 12 '18	Apr 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
567	Evaluación combinada técnica - económica	0	8 days	Apr 19 '18	Apr 30 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
568	Negociación con la empresa consultora	0	5 days	May 1 '18	May 7 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
569	Solicitud de No Objeción del BID al Informe de Evaluación y Borrador del Contrato	0	1 day	May 8 '18	May 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
570	No Objeción del BID	0	5 days	May 9 '18	May 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
571	Adjudicación del contrato	0	8 days	ay 16 '18	May 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
572	Suscripción del contrato	0	5 days	ay 28 '18	Jun 1 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
573	Envío de contrato firmado al B	0	2 days	Jun 4 '18	Jun 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
574	Ejecución de los Servicios de Consultoría	0	354 days	Jun 4 '18	Oct 10 '19	\$ 78,000.00	\$ 67,000.00	\$ 11,000.00														
575	Orden de Inicio	0	1 day	Jun 4 '18	Jun 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
576	Informe Inicial	0	15 days	Jun 5 '18	Jun 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
577	Tramite de 1er. Pago	0	10 days	Jun 26 '18	Jul 9 '18	\$ 15,600.00	\$ 13,400.00	\$ 2,200.00														
578	Informe Avance 1	0	22 days	Jun 26 '18	Jul 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
579	Tramite de 2do. Pago	0	10 days	Jul 26 '18	Aug 8 '18	\$ 11,700.00	\$ 10,050.00	\$ 1,650.00														
580	Informe Avance 2	0	22 days	Jul 26 '18	Aug 24 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
581	Tramite de 3er. Pago	0	10 days	Aug 27 '18	Sep 7 '18	\$ 11,700.00	\$ 10,050.00	\$ 1,650.00														
582	Informe Avance 3	0	22 days	Aug 27 '18	Sep 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
583	Tramite de 4to. Pago	0	10 days	Sep 26 '18	Oct 9 '18	\$ 11,700.00	\$ 10,050.00	\$ 1,650.00														
584	Informe Avance 4	0	22 days	Sep 26 '18	Oct 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 39																						





PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
616	Informe de Avance 2	0	30 days	Aug 8 '18	Sep 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
617	Tramite de pago 2	0	10 days	Sep 19 '18	Oct 2 '18	\$ 590,000.00	\$ 480,000.00	\$ 110,000.00														
618	Informe de Avance 3	0	45 days	Sep 19 '18	Nov 20 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
619	Tramite de pago 3	0	10 days	ov 21 '18	Dec 4 '18	\$ 590,000.00	\$ 480,000.00	\$ 110,000.00														
620	Informe de Avance 4	0	45 days	ov 21 '18	Jan 22 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
621	Tramite de pago 4	0	10 days	Jan 23 '19	Feb 5 '19	\$ 590,000.00	\$ 480,000.00	\$ 110,000.00														
622	Informe de Avance 5	0	30 days	Jan 23 '19	Mar 5 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
623	Tramite de pago 5	0	10 days	Mar 6 '19	Mar 19 '19	\$ 590,000.00	\$ 480,000.00	\$ 110,000.00														
624	Informe Final	0	30 days	Mar 6 '19	Apr 16 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
625	Tramite de pago 6	0	10 days	Apr 17 '19	Apr 30 '19	\$ 650,000.00	\$ 530,000.00	\$ 120,000.00														
626	Producto 1.2: Estudios Complementarios de Preinversión	0	379 days	Jan 11 '18	Jun 25 '19	\$ 5,140,000.00	\$ 4,430,000.00	\$ 710,000.00														
627	Procesos de Selección y contratación de consultoría (SBCC – Revisión Ex	0	150 days	Jan 11 '18	Aug 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
628	Elaboración DSP	0	50 days	Jan 11 '18	Mar 21 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
629	Publicación Anuncio para solicitud de expresiones de interés	0	7 days	Mar 22 '18	Mar 30 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
630	Presentación de Expresiones de Inte	0	10 days	Apr 3 '18	Apr 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 42																						





PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB														
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
646	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Aug 7 '18	Aug 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
647	Ejecución de la consultoría	0	231 days	Aug 7 '18	Jun 25 '19	\$ 5,140,000.00	\$ 4,430,000.00	\$ 710,000.00														
648	Entrega de Adelanto	0	10 days	Aug 7 '18	Aug 20 '18	\$ 1,330,000.00	\$ 1,330,000.00	\$ 0.00														
649	Orden de Inicio	0	1 day	Aug 21 '18	Aug 21 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
650	Cronograma de Ejecución	0	220 days	ug 22 '18	Jun 25 '19	\$ 3,810,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 710,000.00														
651	Informe de Avance 1	0	30 days	Aug 22 '18	Oct 2 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
652	Tramite de pago 1	0	10 days	Oct 3 '18	Oct 16 '18	\$ 620,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,000.00														
653	Informe de Avance 2	0	30 days	Oct 3 '18	Nov 13 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
654	Tramite de pago 2	0	10 days	ov 14 '18	Nov 27 '18	\$ 620,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,000.00														
655	Informe de Avance 3	0	45 days	ov 14 '18	Jan 15 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
656	Tramite de pago 3	0	10 days	Jan 16 '19	Jan 29 '19	\$ 620,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,000.00														
657	Informe de Avance 4	0	45 days	Jan 16 '19	Mar 19 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
658	Tramite de pago 4	0	10 days	Mar 20 '19	Apr 2 '19	\$ 620,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,000.00														
659	Informe de Avance 5	0	30 days	Mar 20 '19	Apr 30 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
660	Tramite de pago 5	0	10 days	May 1 '19	May 14 '19	\$ 620,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,000.00														
Página 44																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016 H1	H2	2017 H1	H2	2018 H1	H2	2019 H1	H2	2020 H1	H2	2021 H1	H2	2022 H1	H2
661	Informe Final	0	30 days	May 1 '19	Jun 11 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
662	Tramite de pago 6	0	10 days	Jun 12 '19	Jun 25 '19	\$ 710,000.00	\$ 550,000.00	\$ 160,000.00														
663	Administración y Gestión	0	1359.75 days	Mar 2 '17	May 18 '22	\$ 1,059,000.00	\$ 980,000.00	\$ 79,000.00														
664	Gestión Ambiental y Social	0	789 days	Sep 8 '17	Sep 16 '20	\$ 641,000.00	\$ 585,000.00	\$ 56,000.00														
665	Producto 2: Plan de Gestión Ambiental y Social	0	789 days	Sep 8 '17	Sep 16 '20	\$ 641,000.00	\$ 585,000.00	\$ 56,000.00														
666	Programa de Apoyo al fortalecimiento de la gestión ambiental de la Reserva Biosfera Bosawás (Convenio	0	789 days	Sep 8 '17	Sep 16 '20	\$ 541,000.00	\$ 485,000.00	\$ 56,000.00														
667	Procesos de preparación y suscripción de convenio de colaboración inter-institucional	0	90 days	Sep 8 '17	Jan 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
668	Preparación de Convenio	0	60 days	Sep 8 '17	Nov 30 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
669	Negociación del contrato	0	10 days	Dec 1 '17	Dec 14 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
670	Solicitud de no objeción del BID	0	10 days	Dec 15 '17	Dec 28 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
671	No objeción al Convenio y Planes de Adquisiciones	0	5 days	Dec 29 '17	Jan 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
672	Suscripción del convenio	0	3 days	Jan 5 '18	Jan 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
673	Envío de convenio firmado al B	0	2 days	Jan 10 '18	Jan 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
674	Ejecución de la consultoría	0	701 days	Jan 10 '18	Sep 16 '20	\$ 541,000.00	\$ 485,000.00	\$ 56,000.00														
Página 45																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
675	Orden de Inicio	0	1 day	Jan 10 '18	Jan 10 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
676	Plan de Trabajo	0	5 days	Jan 11 '18	Jan 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
677	Consultoría para el Apoyo a la Elaboración y apoyo a la implementación del Plan de manejo para la Reserva de Kuskawás	0	275 days	Jan 18 '18	Feb 6 '19	\$ 406,000.00	\$ 350,000.00	\$ 56,000.00														
678	Proceso de selección y contratación (SBCC – Revisión Ex Ante)	0	156 days	Jan 18 '18	Aug 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
679	Elaboración DSP	0	50 days	Jan 18 '18	Mar 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
680	Publicación de Aviso de Expresión de Interés UNDB, SISCAE	0	6 days	Mar 29 '18	Apr 5 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
681	Recepción de Expresiones de Interés	0	12 days	Mar 30 '18	Apr 16 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
682	Evaluación de Expresiones de Interés	0	12 days	Apr 17 '18	May 2 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
683	Selección de Lista Corta	0	5 days	May 3 '18	May 9 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
684	Solicitud de No Objeción al BID del DSP y Lista Corta	0	1 day	May 10 '18	May 10 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
685	No Objeción del BID	0	5 days	May 11 '18	May 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
686	Invitación y entrega de DSP a Consultores	687	Preparación de Propuestas Técnicas y de Precio																			



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																							
ID	Nombre de tarea		Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
										H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
688		Evaluación de Propuestas Técnicas	0	10 days	Jun 20 '18	Jul 3 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
689		Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación Técnica	0	1 day	Jul 4 '18	Jul 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
690		No Objeción del BID	0	5 days	Jul 5 '18	Jul 11 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
691		Evaluación de Propuestas de Precio	0	5 days	Jul 12 '18	Jul 18 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
692		Negociación de Propuesta	0	5 days	Jul 19 '18	Jul 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
693		Solicitud de No Objecion del BID a Borrador de	0	1 day	Jul 26 '18	Jul 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
694		No Objeción del BID	0	5 days	Jul 27 '18	Aug 2 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
695		Adjudicación de contrato	0	8 days	Aug 3 '18	Aug 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
696		Suscripción del Contrato	0	5 days	Aug 15 '18	Aug 21 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
697		Envío al Banco	0	2 days	Aug 22 '18	Aug 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
698		Ejecución de los Servicios de Consultoría	0	121 days	Aug 22 '18	Feb 6 '19	\$ 406,000.00	\$ 350,000.00	\$ 56,000.00														
699		orden de Inicio	0	1 day	Aug 22 '18	Aug 22 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
700		Ejecucion de la Consultoría	0	120 days	Aug 23 '18	Feb 6 '19	\$ 406,000.00	\$ 350,000.00	\$ 56,000.00														
701		Educación ambiental para el manejo de recursos naturales renovables	0	695 days	Jan 18 '19	Sep 16 '20	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 0.00														

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																				
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB												
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
702	Seguimiento a la planificación 2018	0	250 days	Jan 18 '18	Jan 2 '19	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00												
703	Seguimiento a la planificación 2019	0	250 days	Jan 10 '19	Dec 25 '19	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 0.00												
704	Seguimiento a la planificación 2020	0	180 days	Jan 9 '20	Sep 16 '20	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 0.00												
705	Programa de Educación Vial (Convenio Inter-Institucional MTI - Policía Nacional)	0	669 days	Feb 23 '18	Sep 16 '20	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00												
706	Procesos de preparación y suscripción de convenio de colaboración inter-institucional	0	90 days	Feb 23 '18	Jun 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
707	Preparación de Convenio	0	60 days	Feb 23 '18	May 17 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
708	Negociación del contrato	0	10 days	May 18 '18	May 31 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
709	Solicitud de no objeción del BID	0	10 days	Jun 1 '18	Jun 14 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
710	No objeción al Convenio y Planes de Adquisiciones	0	5 days	Jun 15 '18	Jun 21 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
711	Suscripción del convenio	0	3 days	Jun 22 '18	Jun 26 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
712	Envío de convenio firmado al BI	0	2 days	Jun 27 '18	Jun 28 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
713	Ejecución de la consultoría	0	581 days	Jun 27 '18	Sep 16 '20	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00												
714	Orden de Inicio	0	1 day	Jun 27 '18	Jun 27 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
715	Plan de Trabajo	0	5 days	Jun 28 '18	Jul 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00												
Página 48																				

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																							
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APOORTE BID NI-L1097	APOORTE GOB															
									2016 H1	H2	2017 H1	H2	2018 H1	H2	2019 H1	H2	2020 H1	H2	2021 H1	H2	2022 H1	H2	
716	Seguimiento a la Ejecución 2018	0	130 days	Jul 5 ‘18	Jan 2 ‘19	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00															
717	Seguimiento a la Ejecución 2019	0	255 days	Jan 10 ‘19	Jan 1 ‘20	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 0.00															
718	Seguimiento a la Ejecución 2020	0	180 days	Jan 9 ‘20	Sep 16 ‘20	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00															
719	Monitoreo y Evaluación	0	424 days	ay 30 ‘19	Jan 12 ‘21	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 0.00															
720	Evaluación Intermedia del Programa	0	142 days	ay 30 ‘19	Dec 13 ‘19	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00															
721	Proceso de adquisición y contratación (SBCCIN – Revisión Ex	0	63 days	May 30 ‘19	Aug 26 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
722	Elaboración Terminos de Referenc	0	30 days	ay 30 ‘19	Jul 10 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
723	Solicitud de No Objeción a TdR	0	1 day	Jul 11 ‘19	Jul 11 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
724	No Objeción	0	5 days	Jul 12 ‘19	Jul 18 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
725	Publicación o Invitación a presentar expresión de Interés	0	10 days	Jul 19 ‘19	Aug 1 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
726	Presentación de Curriculum de Consultores	0	10 days	Jul 22 ‘19	Aug 2 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
727	Evaluación de Curriculum de Consultores	0	5 days	Aug 5 ‘19	Aug 9 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
728	Negociación de Contrato	0	3 days	Aug 12 ‘19	Aug 14 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
729	Adjudicación del contrato	0	2 days	Aug 15 ‘19	Aug 16 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
730	Firma del Contrato	0	4 days	Aug 19 ‘19	Aug 22 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															
731	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Aug 23 ‘19	Aug 26 ‘19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00															





PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097
---


ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
732	Ejecución de la consultoría	0	81 days	Aug 23 '19	Dec 13 '19	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00		12/13												
733	Orden de Inicio	0	1 day	Aug 23 '19	Aug 23 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
734	Seguimiento de la consultoría	0	80 days	Aug 26 '19	Dec 13 '19	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00														
735	Evaluación Final del Programa	0	142 days	Jun 29 '20	Jan 12 '21	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00														
736	Proceso de aduiscisión v contratación (SBCCIN – Revisión Ex	0	63 days	Jun 29 '20	Sep 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
737	Elaboración Terminos de Referenc	0	30 days	Jun 29 '20	Aug 7 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
738	Solicitud de No Objeción a TdR	0	1 day	Aug 10 '20	Aug 10 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
739	No Objeción	0	5 days	Aug 11 '20	Aug 17 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
740	Publicación o Invitación a presentar expresión de Interés	0	10 days	Aug 18 '20	Aug 31 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
741	Presentación de Curriculum de Consultores	0	10 days	Aug 19 '20	Sep 1 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
742	Evaluación de Curriculum de Consultores	0	5 days	Sep 2 '20	Sep 8 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
743	Negociación de Contrato	0	3 days	Sep 9 '20	Sep 11 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
744	Adjudicación del contrato	0	2 days	Sep 14 '20	Sep 15 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
745	Firma del Contrato	0	4 days	Sep 16 '20	Sep 21 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
746	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Sep 22 '20	Sep 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
762	Evaluación de propuestas técnicas	0	15 days	Oct 23 '17	Nov 13 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
763	Solicitud de no objeción del BID	0	1 day	Nov 13 '17	Nov 14 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
764	No Objeción del BID	0	5 days	Nov 14 '17	Nov 21 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
765	Evaluación combinada técnica – económica	0	8 days	Nov 21 '17	Dec 1 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
766	Negociación con la empresa consultora	0	5 days	Dec 1 '17	Dec 8 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
767	Solicitud de No Objeción del BID al Informe de Evaluación y Borrador del Contrato	0	1 day	Dec 8 '17	Dec 11 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
768	No Objeción del BID	0	5 days	Dec 11 '17	Dec 18 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
769	Adjudicación del contrato	0	8 days	Dec 18 '17	Dec 28 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
770	Suscripción del contrato	0	5 days	Dec 28 '17	Jan 4 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
771	Envío de contrato firmado al BID	0	2 days	Jan 4 '18	Jan 8 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
772	Ejecución Consultoria Auditoria Financiera	0	1089 days	Mar 1 '18	May 4 '22	\$ 173,000.00	\$ 150,000.00	\$ 23,000.00														
773	Ejecución Consultoría Auditoria Financiera año 1	0	60 days	Mar 1 '18	May 24 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
774	Tramite de pago período año 1	0	10 days	Jun 14 '18	Jun 28 '18	\$ 22,500.00	\$ 19,500.00	\$ 3,000.00														
775	Ejecución Consultoria Auditoria Financiera año 2	0	60 days	Mar 1 '19	May 24 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
776	Tramite de pago período año 2	0	10 days	Jun 14 '19	Jun 28 '19	\$ 36,500.00	\$ 31,500.00	\$ 5,000.00														

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																			
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APOORTE BID NI-L1097	APOORTE GOB											
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
777	Ejecución Consultoria Auditoria Financiera año 3	0	60 days	Mar 2 '20	May 25 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
778	Tramite de pago período año 3	0	10 days	Jun 10 '20	Jun 24 '20	\$ 45,000.00	\$ 39,000.00	\$ 6,000.00											
779	Ejecución Consultoria Auditoria Financiera año 4	0	60 days	Mar 2 '21	May 25 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
780	Tramite de pago período año 4	0	10 days	Jun 10 '21	Jun 24 '21	\$ 29,500.00	\$ 25,500.00	\$ 4,000.00											
781	Financiera año 5 y de cierre	0	10 days	Mar 23 '22	Apr 6 '22	\$ 39,500.00	\$ 34,500.00	\$ 5,000.00											
782	Tramite de pago período año 5 y de cierre	0	10 days	Mar 23 '22	Apr 6 '22	\$ 39,500.00	\$ 34,500.00	\$ 5,000.00											
783	Presentación de Informes de EFA's (clausula contractual)	0	1124 days	Jan 25 '18	May 18 '22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
784	Presentación de Informes de EFA's	0	78 days	Jan 25 '18	May 15 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
785	Presentación de Informes de EFA's	0	78 days	Jan 25 '19	May 15 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
786	Presentación de Informes de EFA's	0	78 days	Jan 27 '20	May 14 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
787	Presentación de Informes de EFA's	0	80 days	Jan 26 '21	May 18 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
788	Presentación de Informes de EFA's 5 y de cierre	0	80 days	Jan 26 '22	May 18 '22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											
789	Asesorias y Asistencias Técnicas	0	1285 days	Mar 2 '17	Feb 2 '22	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00											
790	Asesoría Técnica al MTI	0	1285 days	Mar 2 '17	Feb 2 '22	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00											
791	Proceso de adquisición y contratación (SBCCIN – Revisión Ex	0	61 days	Mar 2 '17	May 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											

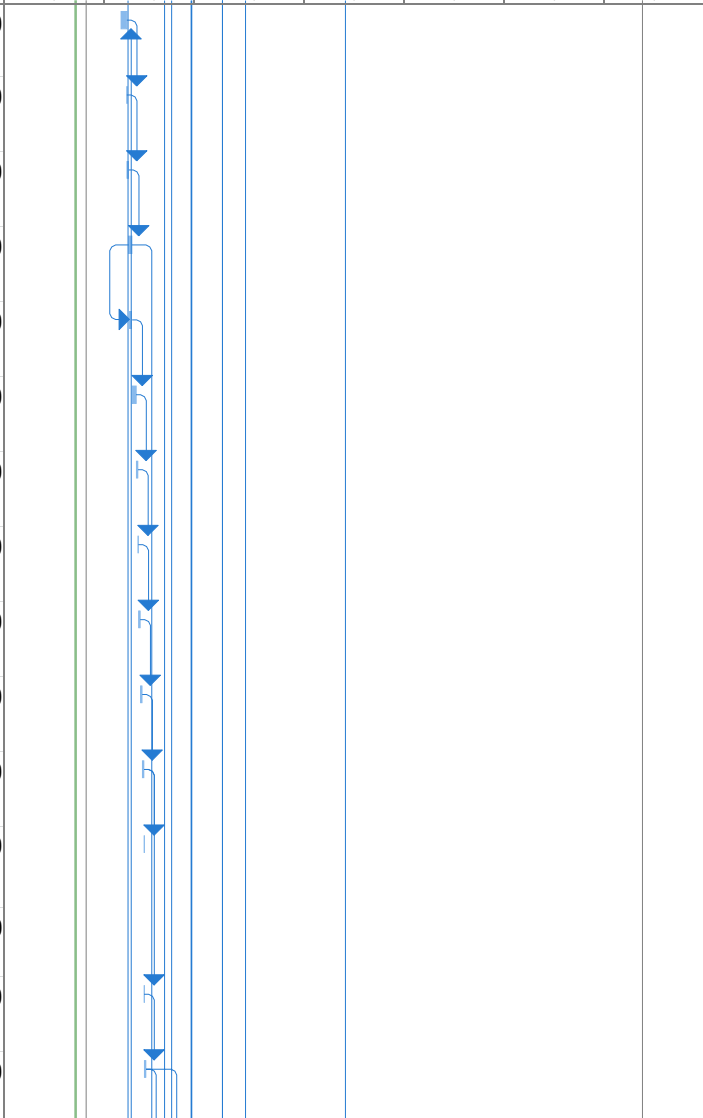

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APOORTE BID NI-L1097	APOORTE GOB	2016 H1	H2	2017 H1	H2	2018 H1	H2	2019 H1	H2	2020 H1	H2	2021 H1	H2	2022 H1	H2
792	Elaboración Terminos de Referencia	0	15 days	Mar 2 '17	Mar 22 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
793	Solicitud No Objeción al TdR	0	1 day	Mar 23 '17	Mar 23 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
794	No Objeción	0	5 days	Mar 24 '17	Mar 30 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
795	Publicación o Invitación a presentar expresión de Interés	0	7 days	Mar 31 '17	Apr 10 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
796	Presentación de Curriculum de Consultores	0	7 days	Apr 3 '17	Apr 11 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
797	Evaluación de Curriculum de Consultores	0	10 days	Apr 12 '17	Apr 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
798	Negociación de Contrato	0	5 days	Apr 26 '17	May 2 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
799	Solicitud No Objeción al Borrador de contrato	0	1 day	May 3 '17	May 3 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
800	No Objeción	0	5 days	May 4 '17	May 10 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
801	Adjudicación del contrato	0	5 days	May 11 '17	May 17 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
802	Firma del Contrato	0	5 days	May 18 '17	May 24 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
803	Envío de contrato firmado al BID	0	1 day	May 25 '17	May 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
804	Ejecución de la consultoría	0	1225 days	May 25 '17	Feb 2 '22	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00														
805	Orden de Inicio	0	1 day	May 25 '17	May 25 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
806	Plan de Trabajo	0	5 days	May 26 '17	Jun 1 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
						Página 54																



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
821	Informe I Semestral año 3	0	120 days	Jan 16 '20	Jul 1 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
822	Tramite de Pago	0	10 days	Aug 6 '20	Aug 19 '20	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00														
823	Informe II Semestral año 3	0	120 days	Jul 16 '20	Dec 30 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
824	Tramite de Pago	0	10 days	Feb 4 '21	Feb 17 '21	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00														
825	Informe I Semestral año 4	0	120 days	Jan 14 '21	Jun 30 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
826	Tramite de Pago	0	10 days	Aug 5 '21	Aug 18 '21	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00														
827	Informe II Semestral año 4	0	120 days	Jul 15 '21	Dec 29 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
828	Tramite de Pago	0	10 days	Jan 20 '22	Feb 2 '22	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00														
829	Informe Final	0	20 days	Dec 16 '21	Jan 12 '22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
830	Tramite de Pago	0	10 days	Jan 20 '22	Feb 2 '22	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00														
831	Gastos Financieros	0	795 days	Mar 8 '18	Mar 24 '21	\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 0.00														
832	Gastos Financieros 2017	0	15 days	Mar 8 '18	Mar 28 '18	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00														
833	Gastos Financieros 2018	0	15 days	Mar 7 '19	Mar 27 '19	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 0.00														
834	Gastos Financieros 2019	0	15 days	Mar 5 '20	Mar 25 '20	\$ 887,000.00	\$ 887,000.00	\$ 0.00														
835	Gastos Financieros 2020	0	15 days	Mar 4 '21	Mar 24 '21	\$ 2,230,000.00	\$ 2,230,000.00	\$ 0.00														
Página 56																						





PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB								
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
850	Entrada en vigencia del Manual Operativo del Programa	0	40 days	Feb 14 '17	Apr 10 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
851	Elegibilidad del Programa	0	5 days	Apr 27 '17	May 3 '17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
852																
853	<b>Gestión de Riesgos: Desastres Naturales y Otras Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>896 days</b>	<b>Jan 22 '18</b>	<b>Jun 28 '21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>								
854	<b>Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala</b>	<b>0</b>	<b>721 days</b>	<b>Jan 22 '18</b>	<b>Oct 26 '20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>								
855	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 1	0	1 day	Jan 22 '18	Jan 22 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
856	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 2	0	1 day	Apr 23 '18	Apr 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
857	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 3	0	1 day	Jul 23 '18	Jul 23 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
858	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 4	0	1 day	Oct 22 '18	Oct 22 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
859	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 5	0	1 day	Jan 28 '19	Jan 28 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
860	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 6	0	1 day	Apr 22 '19	Apr 22 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								
861	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 7	0	1 day	Jul 22 '19	Jul 22 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00								



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
862	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 8	0	1 day	Oct 28 '19	Oct 28 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
863	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala 9	0	1 day	Jan 27 '20	Jan 27 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
864	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala	0	1 day	Apr 27 '20	Apr 27 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
865	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala	0	1 day	Jul 27 '20	Jul 27 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
866	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – El Comején-Waslala	0	1 day	Oct 26 '20	Oct 26 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
867	<b>Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por</b>	<b>0</b>	<b>786 days</b>	<b>Jun 25 '18</b>	<b>Jun 28 '21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>														
868	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Jun 25 '18	Jun 25 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
869	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Sep 24 '18	Sep 24 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
870	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Dec 24 '18	Dec 24 '18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
871	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Mar 25 '19	Mar 25 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 59																						

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL II OPERACIÓN NI-L1097																						
ID	Nombre de tarea	Meta Física (Km.)	Duration	Start	Finish	COSTO TOTAL	APORTE BID NI-L1097	APORTE GOB	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
872	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Jun 24 '19	Jun 24 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
873	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Sep 23 '19	Sep 23 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
874	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Dec 23 '19	Dec 23 '19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
875	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Mar 23 '20	Mar 23 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
876	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Jun 22 '20	Jun 22 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
877	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Sep 28 '20	Sep 28 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
878	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Dec 28 '20	Dec 28 '20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
879	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Mar 22 '21	Mar 22 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
880	Evaluación y monitoreo del plan de contingencia presentado por el Contratista – Proyectos por	0	1 day	Jun 28 '21	Jun 28 '21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00														
Página 60																						

## PLANIFICACION FISICA - FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Programa: PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL II (OPERACIÓN NI-L1097)

Productos	Unidad de Medida	2017		2018		2019		2020		Final del Proyecto (2021)		Total	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
<b>TOTALES COSTOS DIRECTOS</b>			5,739,200		23,492,984		21,557,210		21,171,906		13,618,700		75,580,000
<b>COMPONENTE 1. Mejoramiento de Caminos Rurales</b>													
Sub Total Componente 1: Mejoramiento de Caminos Rurales	Km.	0	5,739,200	5	16,774,800	15.00	16,962,394	33.9	21,081,906	17.00	13,618,700	70.90	74,177,000
<b>Producto 1:</b> Tramo de Camino El Comején - Waslala, construido	Kms. Construidos		5,739,200	5	4,737,700	10.00	7,143,350	15.9	8,907,650		2,661,100	30.9	29,189,000
<b>Producto 2:</b> Tramo de Camino (pendiente de confirmar), construido o rehabilitado	Kms. Construidos o rehabilitados				12,037,100	5.00	9,779,400	18	12,133,900	17.00	10,957,600	40	44,908,000
<b>Producto 3:</b> Mujeres capacitadas en la operación de maquinaria pesada	Número de Mujeres						39,644	1	40,356			1	80,000
<b>Componente 2: Fortalecimiento Institucional del MTI</b>													
Sub total Componente 2: Fortalecimiento Institucional			0		1,118,184		194,816		90,000		0		1,403,000
<b>PRODUCTO 1:</b> Fortalecimiento a la Gestión Institucional, personas capacitadas	No. de personas capacitadas						110,000	50	90,000			50	200,000
<b>PRODUCTO 2:</b> Equipamiento y Bienes de Apoyo a la UCP, adquirido y en funcionamiento			0		1,118,184		84,816		0		0	0	1,203,000
Bienes informáticos (20 Computadoras de Escritorios, 10 laptops y 5 fotocopiadoras multifuncionales), adquiridos	No. de equipos adquiridos			35	155,000							35	155,000
Equipo de Transporte (4 vehículos pick up y 2 sedan), adquirido	No. de equipos adquiridos			4	219,000							4	219,000
Muebles de Oficina (40 sillas de escritorios y 30 sillas de espera), adquiridos	No. de muebles adquiridos			70	15,300							70	15,300
Equipo de Oficina (8 aires acondicionados de 24,000 BTU), adquirido	No. de equipos adquiridos			8	16,700							8	16,700
Modelo de Analisis de Inversión en Carretera HDM-4 (2 Licencias), adquirido	No. de Licencias adquiridas			4	12,000							4	12,000
Espacio físico de Oficinas, rehabilitado	Unidad			1	700,184		84,816					1	785,000

<b>COMPONENTE 3. Estudios de preinversión</b>													<b>10,000,000</b>
<b>Producto 1:</b> Número de estudios de preinversión de factibilidad	Número de estudios				5,600,000		4,400,000	2				2	10,000,000

**Administración y Gestión**

<b>Administración y Gestión</b>			40,000		438,067		336,933		1,090,000		2,354,000		1,059,000
<b>Producto 1:</b> Gestión Ambiental y Social, implementado	Plan				378,567		164,433	1	98,000			1	641,000
<b>PRODUCTO 2:</b> Monitoreo y Evaluación del Programa (Evaluación Intermedia y Final del Programa), realizados	Informes					1	25,000	1	30,000			2	55,000
Auditoría Financiera del Programa	N/A				22,500		36,500		45,000		69,000	0	173,000
Asesorías y Asistencias Técnica (Asesoría Técnica al MTI)	N/A		40,000		35,000		30,000		30,000		55,000	0	190,000
<b>Gastos Financieros</b>	N/A				2,000		81,000		887,000		2,230,000	0	3,200,000
<b>TOTALES</b>			5,779,200		23,931,051		21,894,143		22,261,906		15,972,700		89,839,000
