


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/16	21 novien 04/11/16	01 mayo 05/05/16	11 octubre 23/10/16	21 marzo 09/03/17	01 septien 25/09/16	11 febr 07/02/17
1	Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias. (PE-L 1153)	582 días?	lun 28/11/16	mar 19/02/19							
2	Preinversión	530 días	lun 28/11/16	vie 07/12/18							
3	Inicio de Gestiones para el Préstamo	0 días	lun 28/11/16	lun 28/11/16		28/11					
4	MEF remite oficio al BID solicitando préstamo.	10 días	lun 28/11/16	vie 09/12/16							
5	Viabilidad del Programa	0 días	mié 15/03/17	mié 15/03/17			15/03				
6	Oficio de OPP a MEF para asegurar disponibilidad presupuestaria.	30 días	mié 15/03/17	mar 25/04/17							
7	Inclusión del programa en el PPR de Residuos Sólidos "Presupuesto por Resultados" 2017 por parte de OPP/MINAM	40 días	mar 20/12/16	lun 13/02/17							
8	Coordinación entre DGCA/UE/Planificación del MINAM la inclusión de los objetivos y metas del programa en el Anexo 2 de PPR.	40 días	mié 15/03/17	mar 09/05/17							
9	Habilitación de los codigos presupuestales del programa por el MEF en el SIAF.	5 días	mié 15/03/17	mar 21/03/17							
10	Designación de la UE003 como ejecutora del programa	28 días	mié 15/03/17	vie 21/04/17							
11	Suscripción de Acuerdos de Concejo Municipal para sostenibilidad de los proyectos por parte de Municipios.	60 días	mié 15/03/17	mar 06/06/17							
12	Negociación del Contrato de Préstamo	4 días	lun 15/05/17	jue 18/05/17							
13	Aprobacion del Contrato de Préstamo por el Directorio del Banco.	0 días	mié 14/06/17	mié 14/06/17						14/06	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/17	21 noviem 04/11/17	01 mayo 05/05/17	11 octubre 23/10/17	21 marzo 09/03/18	01 septien 29/07/18	11 febr 13/02/18
14	Pedido de MINAM a MEF para la aprobación del Préstamo por parte de PCM, incluyendo informe técnico y económico y factibilidad.	10 días	vie 19/05/17	jue 01/06/17							
15	Preparación del Expendiente por MEF y envío a PCM.	30 días	mié 07/06/17	mar 18/07/17							
16	Opinión de Contraloría	10 días	mié 21/06/17	mar 04/07/17							
17	Aprobación de la Operación de Préstamo por DS	20 días	mié 19/07/17	mar 15/08/17							
18	Firma del Contrato de Préstamo	0 días	mié 13/09/17	mié 13/09/17							
19	Taller de Arranque	2 días	mié 27/09/17	jue 28/09/17							
20	Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	220 días	mié 15/03/17	mar 16/01/18							
21	Informe Juridico MEF	5 días	mié 13/09/17	mar 19/09/17							
22	Apertura de Cuenta Especial	5 días	mié 13/09/17	mar 19/09/17							
23	Informe Inicial	10 días	vie 29/09/17	jue 12/10/17							
24	MOP Aprobado	0 días	vie 19/05/17	vie 19/05/17							
25	Firma de Convenios de la Cuenta Unica Tesoro -CUT	90 días	mié 13/09/17	mar 16/01/18							
26	Firmas registradas ante el BID	2 días	mié 13/09/17	jue 14/09/17							
27	Presupuesto Año 1 del programa	120 días	mié 15/03/17	mar 29/08/17							
28	Solicitud de Primer Desembolso	7 días	mié 17/01/18	jue 25/01/18							
29	Gestiones previa a Expedientes Técnicos	530 días	lun 28/11/16	vie 07/12/18							

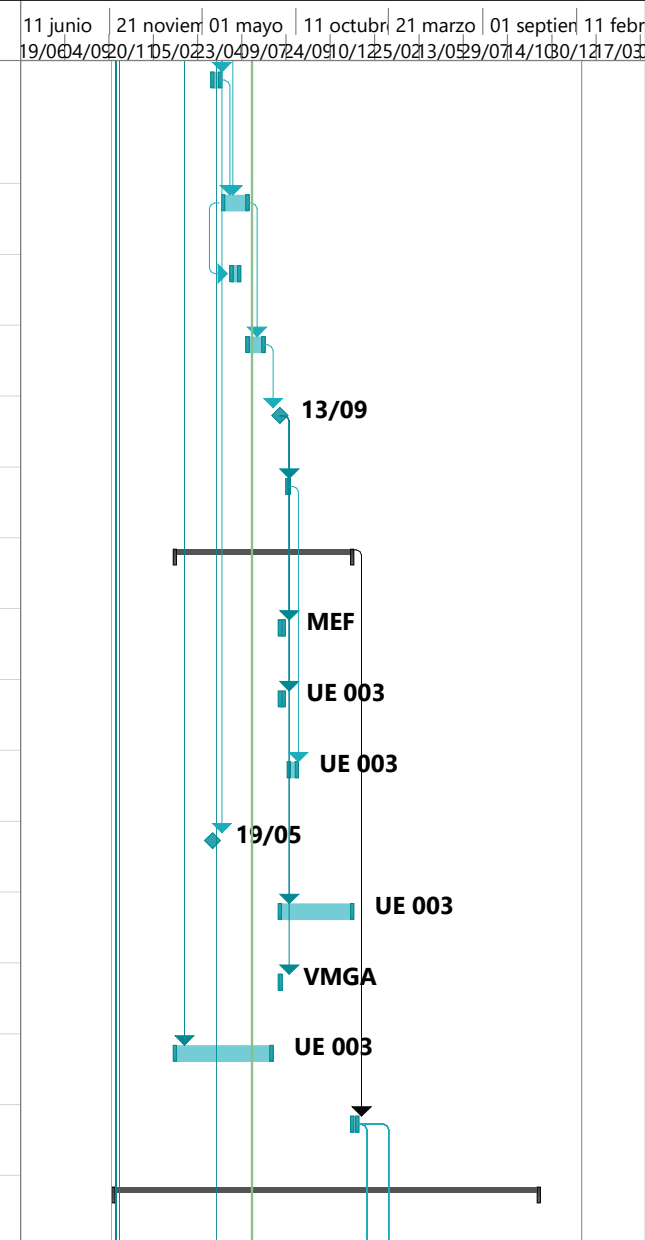

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 noviem 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 05/03/25	01 septien 09/09/29	11 febr 10/02/30
30	Acciones de negociación con comunidades campesinas para Inicio de Gestiones de Saneamiento físico legal de los terrenos.	50 días	mié 01/03/17	mar 09/05/17							
31	Huamanga	50 días	mié 01/03/17	mar 09/05/17							
32	Andahuaylas	50 días	mié 01/03/17	mar 09/05/17							
33	Aymaraes	50 días	mié 01/03/17	mar 09/05/17							
34	Saneamiento físico legal del terreno - Gestión con Registro Público.	199 días	vie 02/12/16	mié 06/09/17							
35	Chancay	150 días	vie 02/12/16	jue 29/06/17							
36	Bagua	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16							
37	Pozuzo	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16							
38	Oxapampa	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16							
39	Yauyos	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16							
40	Huamanga	150 días	jue 09/02/17	mié 06/09/17							
41	Andahuaylas	150 días	jue 09/02/17	mié 06/09/17							
42	Huacho	150 días	vie 02/12/16	jue 29/06/17							
43	Tarma	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16							
44	Chincha	150 días	jue 09/02/17	mié 06/09/17							
45	Abancay	150 días	vie 02/12/16	jue 29/06/17							
46	Aymaraes	150 días	jue 09/02/17	mié 06/09/17							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 novien 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 25/03/25	01 septien 09/09/29	11 febr 10/02/30
47	Obras JICA FASE I disponibles para Fase II (Chincha, Abancay y Aymaraes)	530 días	lun 28/11/16	vie 07/12/18							
48	Saneamiento fisico legal del terreno - Gestión con Registro Público.	200 días	lun 28/11/16	vie 01/09/17							
49	Contratación Expediente Técnico	150 días	lun 04/09/17	vie 30/03/18							
50	Elaboración Expediente Técnico	180 días	lun 02/04/18	vie 07/12/18							
51	Opinión Favorable al Plan de Recuperación de Area Degradada por DIGESA.	303 días	mar 10/01/17	jue 08/03/18							
52	Chancay	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
53	Bagua	200 días	lun 16/01/17	vie 20/10/17							
54	Pozuzo	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
55	Oxapampa	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
56	Yauyos	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
57	Huamanga	200 días	vie 02/06/17	jue 08/03/18							
58	Andahuaylas	200 días	vie 02/06/17	jue 08/03/18							
59	Huacho	200 días	lun 16/01/17	vie 20/10/17							
60	Tarma	200 días	lun 16/01/17	vie 20/10/17							
61	Chincha	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
62	Abancay	200 días	lun 16/01/17	vie 20/10/17							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 novien 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 25/03/25	01 septien 29/07/29	11 febr 10/12/30
63	Aymaraes	200 días	mar 10/01/17	lun 16/10/17							
64	Inversión	278 días?	vie 26/01/18	mar 19/02/19							
65	Componente 1 - Infraestructura	234 días	jue 29/03/18	mar 19/02/19							
66	Expedientes Técnicos	234 días	jue 29/03/18	mar 19/02/19							
67	Contratación de firma consultora para elaboración de Expedientes Técnicos - Grupo 1	234 días	jue 29/03/18	mar 19/02/19							
68	Proceso de Selección	40 días	jue 29/03/18	mié 23/05/18							
69	Evaluación Comité	22 días	jue 24/05/18	vie 22/06/18							
70	Firma del Contrato	22 días	lun 25/06/18	mar 24/07/18							
71	Ejecución del Servicio	150 días	mié 25/07/18	mar 19/02/19							
72	Contratación de firma supervisora para los Expedientes Técnicos Grupo 1	84 días	jue 29/03/18	mar 24/07/18							
73	Proceso de Selección	40 días	jue 29/03/18	mié 23/05/18							
74	Evaluación Comité	22 días	jue 24/05/18	vie 22/06/18							
75	Firma de Contrato	22 días	lun 25/06/18	mar 24/07/18							
76	Componente 2 - Social y Ambiental	104 días	jue 29/03/18	mar 21/08/18							
77	Contratación de firma para la Gestion Municipal	104 días	jue 29/03/18	mar 21/08/18							
78	Proceso de Selección	60 días	jue 29/03/18	mié 20/06/18							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 noviem 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 12/03/25	01 septien 09/09/29	11 febr 10/02/30
79	Evaluación Comité	22 días	jue 21/06/18	vie 20/07/18							
80	Firma del Contrato	22 días	lun 23/07/18	mar 21/08/18							
81	Contratacion de firma para la Gestión Social y Comunicación	104 días	jue 29/03/18	mar 21/08/18							
82	Proceso de Selección	60 días	jue 29/03/18	mié 20/06/18							
83	Evaluación Comité	22 días	jue 21/06/18	vie 20/07/18							
84	Entrega de Terreno	22 días	lun 23/07/18	mar 21/08/18							
85	Contratación de firma para la elaboración e implementación del Plan de Intervención Social de los Recicladores	104 días	jue 29/03/18	mar 21/08/18							
86	Proceso de Selección	60 días	jue 29/03/18	mié 20/06/18							
87	Evaluación Comité	22 días	jue 21/06/18	vie 20/07/18							
88	Entrega de Terreno	22 días	lun 23/07/18	mar 21/08/18							
89	Auditoria, Monitoreo y Evaluación	104 días	vie 26/01/18	mié 20/06/18							
90	Contratación de firma auditora contable externa	104 días	vie 26/01/18	mié 20/06/18							
91	Proceso de Selección	60 días	vie 26/01/18	jue 19/04/18							
92	Evaluación Comité	22 días	vie 20/04/18	lun 21/05/18							
93	Entrega de Terreno	22 días	mar 22/05/18	mié 20/06/18							
94	Contratación de firma consultora para la elaboración de la linea de base BID	104 días	vie 26/01/18	mié 20/06/18							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/18	21 noviem 20/11/18	01 mayo 05/05/18	11 octubre 09/10/18	21 marzo 12/03/19	01 septien 09/09/18	11 febr 13/02/19
95	Proceso de Selección	60 días	vie 26/01/18	jue 19/04/18							
96	Evaluación Comité	22 días	vie 20/04/18	lun 21/05/18							
97	Entrega de Terreno	22 días	mar 22/05/18	mié 20/06/18							
98	Administración del programa	240 días?	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
99	Contratación del Personal Clave	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
100	Contratación del Consultoría Individual para el Coordinador del Programa	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
101	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							
102	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
103	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
104	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
105	Contratación de Consultoría Individual para el Coordinador Técnico	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
106	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							
107	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
108	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
109	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
110	Contratación de Consultoría Individual para el Coordinador Administrativo	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 noviem 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 12/03/25	01 septien 09/09/29	11 febr 10/02/30
111	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							
112	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
113	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
114	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
115	Contratación de Consultoría Individual para el Especialista Contable y Patrimonial	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
116	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							
117	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
118	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
119	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
120	Contratación de Consultoría Individual para el Especialista en Adquisiciones	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
121	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							
122	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
123	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
124	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
125	Contratación de Consultoría Individual para el Especialista Social	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
126	Proceso de Selección	20 días	vie 26/01/18	jue 22/02/18							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/18	21 noviem 04/11/18	01 mayo 05/05/18	11 octubre 09/10/18	21 marzo 25/03/19	01 septien 09/09/18	11 febr 12/02/19
127	Evaluación Comité	15 días	vie 23/02/18	jue 15/03/18							
128	Firma de Contrato	15 días	vie 16/03/18	jue 05/04/18							
129	Ejecución del servicio	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
130	Contratación del Personal no Clave	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
131	Especialista en Seguimiento y Evaluación	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
132	Ingeniero Diseños	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
133	Ingeniero - Administrador de Contratos (2)	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
134	Ingeniero - Especialista en Costos y Presupuesto	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
135	Especialista en Saneamiento Físico Legal de Terrenos	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
136	Especialista Ambiental en Monitoreo Ambiental y Control Post Cierre	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
137	Especialista en Comunicación e imagen institucional	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
138	Especialista en Tesorería	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
139	Especialista en Inversión Pública	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
140	Especialista en Planificación y Presupuesto	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
141	Asesor Legal	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
142	Analista en Abastecimiento	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
143	Analista Contable	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 junio 19/06/19	21 noviem 04/11/20	01 mayo 05/05/23	11 octubre 09/10/24	21 marzo 25/03/25	01 septien 09/09/29	11 febr 10/02/30
144	Tecnico en Computación e Informática	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
145	Asistentes técnicos 1	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
146	Asistentes técnicos 2	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
147	Secretaria Coordinación Técnica	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
148	Secretaria Coordinación del Programa	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
149	Chofer	190 días	vie 06/04/18	jue 27/12/18							
150	Bienes	90 días	jue 29/03/18	mié 01/08/18							
151	Adecuación de oficina	30 días	jue 29/03/18	mié 09/05/18							
152	Equipamiento de oficina	90 días	jue 29/03/18	mié 01/08/18							
153	Equipamiento informatico	90 días	jue 29/03/18	mié 01/08/18							
154	Software	90 días	jue 29/03/18	mié 01/08/18							
155	Miscelaneos	90 días	jue 29/03/18	mié 01/08/18							
156	Costos Operativos	240 días	vie 26/01/18	jue 27/12/18							
157											
