
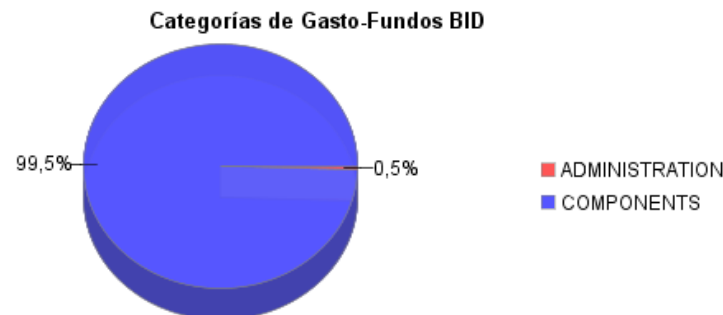
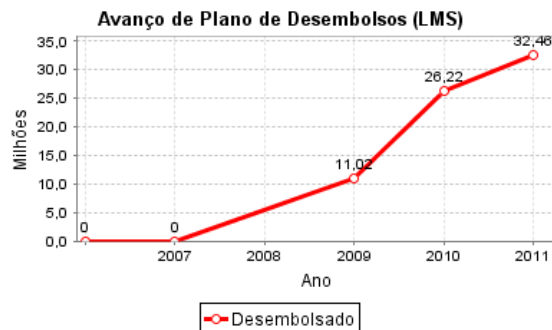



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Prefeitura Municipal de Vitória		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT		
Número da Operação: 1986/OC-BR	Atual: 39.100.000,00	Original BID: 39.100.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 32.455.645,87	Corrente BID: 39.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 83,01	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada: BR-L1043	Saldo: 6.644.354,13	Cofinanciamento/País: 26.100.000,00
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation		Original Estimado: 65.200.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 25, 2011

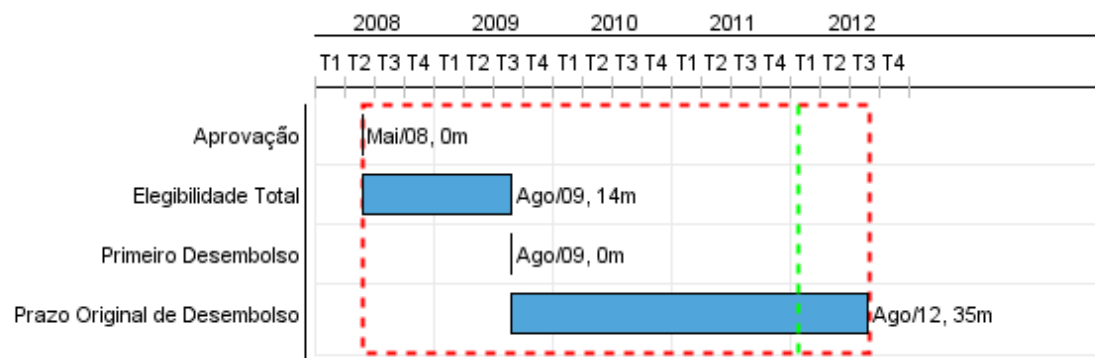

Progresso Acumulado até 2011

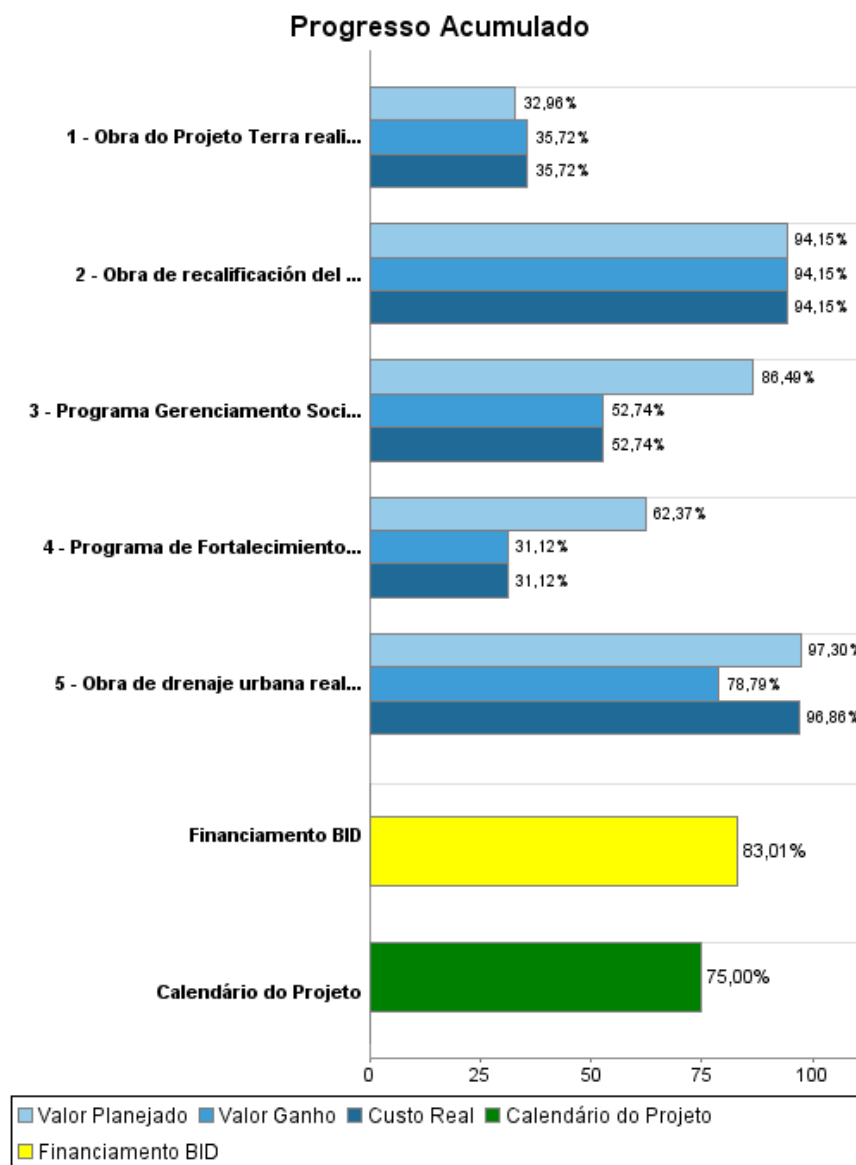

Resultados

Resultado:	Infraestrutura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto ¿Terra Mais Igual¿ mejorado	índice	0,52	2000	P	0,68	0,68
				A		
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro mejorado	índice	0,73	2000	P	0,80	0,80
				A		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Obra do Projeto Terra realizada	obra				1,00	5.000.000,00	5.000.000,00		46.499.010,66
Programa Gerenciamento Social Projeto Terra implementado	programa				1,00	800.000,00	1.234.360,56		2.340.529,00
Recalificación del centro									
Obra de recalificación del centro realizada	obra	1,00	1,00		1,00				529.411,76
Drenaje Urbano									
Obra de drenaje urbana realizada	#				1,00	661.934,00			21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Programa de Fortalecimiento Institucional implementado	programa				1,00	1.500.000,00			4.800.000,00
Administracion del programa									
others									
TOTAL						7.961.934,00	6.234.360,56		75.221.751,42
