

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Prefeitura Municipal de Vitoria
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1986/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-L1043
Sous-Type de l'Opération: GCR - Global Credit Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 39.100.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 32.455.645,87
% Décaissé: 83,01
Solde: 6.644.354,13

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 39.100.000,00
Courant BID: 39.100.000,00
Pari Passu: 60,00
Cofinancement/Pays: 26.100.000,00
Estimation Initiale: 65.200.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: Sep 23, 2011

Validé par le Représentant: Sep 25, 2011

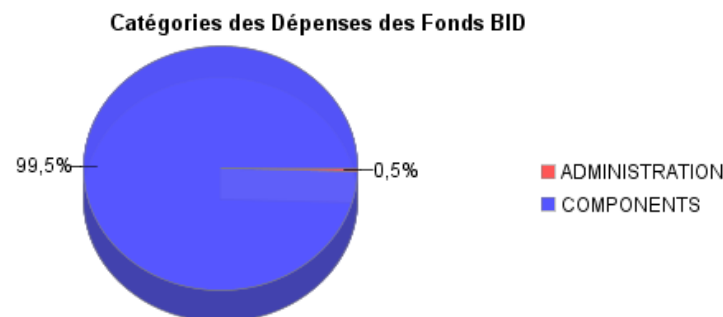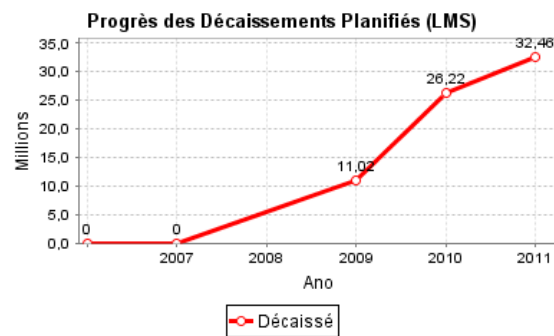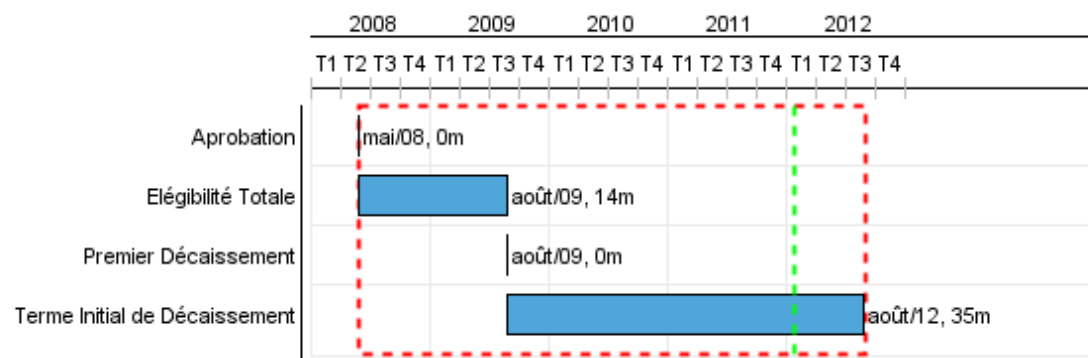

Progrès Cumulé à 2011

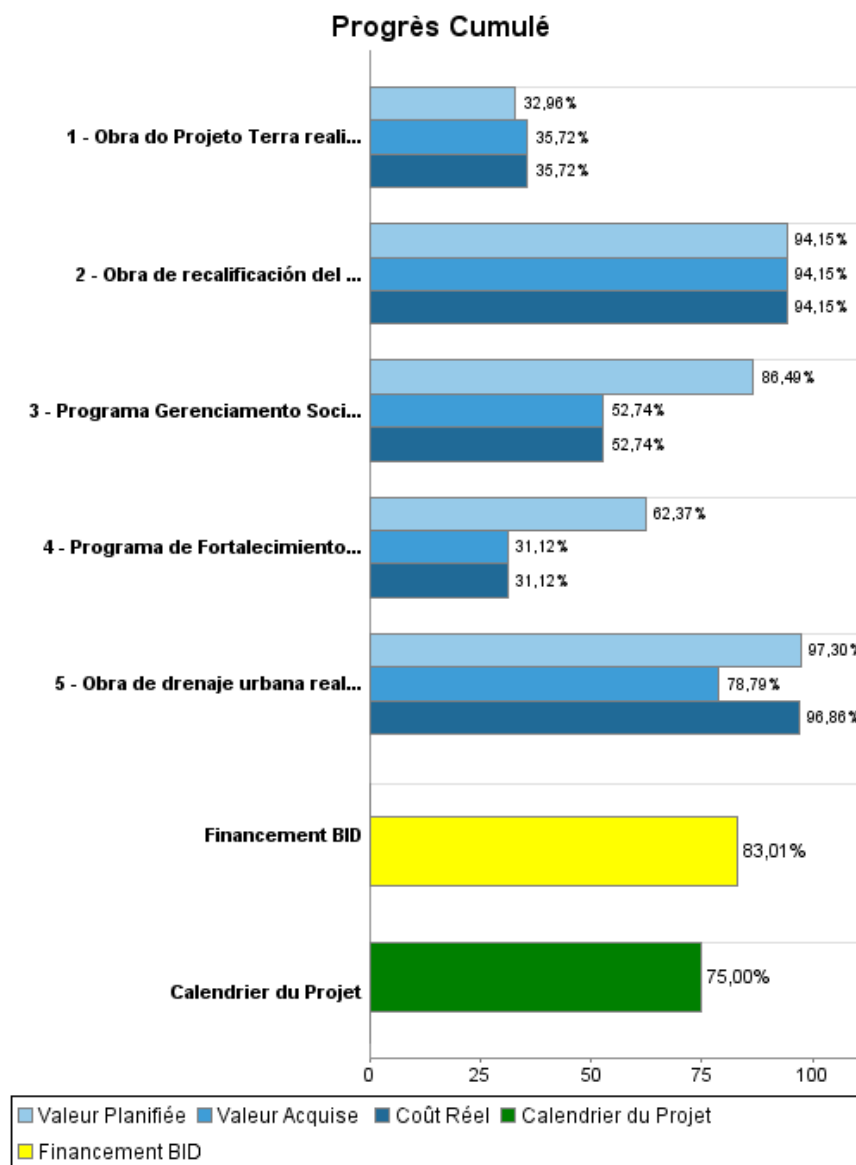

Résultats

Résultat:	Infraestructura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Indice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto ¿Terra Mais Igual¿ mejorado	indice	0,52	2000	P	0,68	0,68
				A		
Indice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro mejorado	indice	0,73	2000	P	0,80	0,80
				A		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Obra do Projeto Terra realizada	obra				1,00	5.000.000,00	5.000.000,00		46.499.010,66
Programa Gerenciamento Social Projeto Terra implementado	programa				1,00	800.000,00	1.234.360,56		2.340.529,00
Recalificación del centro									
Obra de recalificación del centro realizada	obra	1,00	1,00		1,00				529.411,76
Drenaje Urbano									
Obra de drenaje urbana realizada	#				1,00	661.934,00			21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Programa de Fortalecimiento Institucional implementado	programa				1,00	1.500.000,00			4.800.000,00
Administracion del programa others									
TOTAL						7.961.934,00	6.234.360,56		75.221.751,42
