



Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0...	BID			0 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL DE LA REGIÓN CENTRAL Y OCCIDENTAL DE PANAMÁ (PN-L1147)	1194 días	19 mar '18	17 nov '22		\$87,000,000....							
1	0%		C		1 REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	683 días	19 mar '18	25 nov '20		\$84,630,000....							
2	0%		E		1.1 Construcción del segundo puente sobre el Río Chico (David-Paso Canoas)	565 días	19 mar '18	08 jun '20		\$7,790,000.00							
3	0%	BID			1.1.1 Proceso de Adquisición para el diseño y construcción del segundo puente sobre el Río	565 días	19 mar '18	08 jun '20		\$7,790,000.00							
4	0%				1.1.1.1 Proceso de Adquisición	183 días	19 mar '18	04 dic '18		\$0.00							
5	0%				1.1.1.1.1 Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 días	19 mar '18	06 abr '18		\$0.00							
6	0%				1.1.1.1.2 Preparación de DDL	10 días	09 abr '18	20 abr '18	5	\$0.00							
7	0%				1.1.1.1.3 Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 día	23 abr '18	23 abr '18	6	\$0.00							
8	0%				1.1.1.1.4 No Objeción a DDL	5 días	24 abr '18	30 abr '18	7	\$0.00							
9	0%				1.1.1.1.5 Vo.Bo. Del Despacho Superior	10 días	02 may '18	15 may '18	8	\$0.00							
10	0%				1.1.1.1.6 Publicacion y Presentacion de Ofertas	45 días	16 may '18	17 jul '18	9	\$0.00							
11	0%				1.1.1.1.7 Recepcion y Apertura de Ofertas	1 día	18 jul '18	18 jul '18	10	\$0.00							
12	0%				1.1.1.1.8 Designacion de Miembros del Comité de E	10 días	05 jul '18	18 jul '18	11FF	\$0.00							
13	0%				1.1.1.1.9 Evaluacion de Ofertas e Informe	10 días	19 jul '18	01 ago '18	11	\$0.00							
14	0%				1.1.1.1.10 No objeción al informe de evaluación	5 días	02 ago '18	08 ago '18	13	\$0.00							
15	0%				1.1.1.1.11 Adjudicación y elaboración de contrato	15 días	09 ago '18	30 ago '18	14	\$0.00							
16	0%				1.1.1.1.12 Refrendo de Contraloría	66 días	31 ago '18	04 dic '18	15	\$0.00							
17	0%				1.1.1.1.13 Orden de Proceder	0 días	04 dic '18	04 dic '18	16	\$0.00							
18	0%				1.1.1.2 Ejecución del Contrato	382 días	05 dic '18	08 jun '20		\$0.00							
19	0%				1.1.1.2.1 Ejecución de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	18 mss	05 dic '18	07 may '20	17	\$0.00							
20	0%				1.1.1.2.2 Recepción final de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	22 días	08 may '20	08 jun '20	19	\$0.00							
21	0%				1.1.1.2.3 Fin de la obra - Segundo puente sobre Río	0 días	08 jun '20	08 jun '20	20	\$0.00							
22	0%				1.1.1.3 Ejecución Financiera	360 días	08 ene '19	08 jun '20		\$7,790,000.00							
23	0%	BID			1.1.1.3.1 Pagos BID	18 mss	08 ene '19	08 jun '20	19CC+22 días	\$7,790,000.00							
24	0%		E		1.2 Rehabilitación corredor Atalaya – Mariato – Quebró – Flores y Ramal Varadero (Veraguas,	565 días	19 mar '18	08 jun '20		\$60,740,000....							



Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	0%	BID			1.2.1 Proceso de Adquisición para la Rehabilitación corredor Atalaya – Mariato – Quebró – Flores	565 días	19 mar '18	08 jun '20		\$60,740,000....							
26	0%				1.2.1.1 Proceso de Adquisición	183 días	19 mar '18	04 dic '18		\$0.00							
27	0%				1.2.1.1.1 Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 días	19 mar '18	06 abr '18		\$0.00							
28	0%				1.2.1.1.2 Preparación de DDL	10 días	09 abr '18	20 abr '18	27	\$0.00							
29	0%				1.2.1.1.3 Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 día	23 abr '18	23 abr '18	28	\$0.00							
30	0%				1.2.1.1.4 No Objeción a DDL	5 días	24 abr '18	30 abr '18	29	\$0.00							
31	0%				1.2.1.1.5 Vo.Bo. Del Despacho Superior	10 días	02 may '18	15 may '18	30	\$0.00							
32	0%				1.2.1.1.6 Publicacion y Presentacion de Ofertas	45 días	16 may '18	17 jul '18	31	\$0.00							
33	0%				1.2.1.1.7 Recepcion y Apertura de Ofertas	1 día	18 jul '18	18 jul '18	32	\$0.00							
34	0%				1.2.1.1.8 Designacion de Miembros del Comité de E	10 días	05 jul '18	18 jul '18	33FF	\$0.00							
35	0%				1.2.1.1.9 Evaluacion de Ofertas e Informe	10 días	19 jul '18	01 ago '18	33	\$0.00							
36	0%				1.2.1.1.10 No objeción al informe de evaluación	5 días	02 ago '18	08 ago '18	35	\$0.00							
37	0%				1.2.1.1.11 Adjudicación y elaboración de contrato	15 días	09 ago '18	30 ago '18	36	\$0.00							
38	0%				1.2.1.1.12 Refrendo de Contraloría	66 días	31 ago '18	04 dic '18	37	\$0.00							
39	0%				1.2.1.1.13 Orden de Proceder	0 días	04 dic '18	04 dic '18	38	\$0.00							
40	0%				1.2.1.2 Ejecución del Contrato	382 días	05 dic '18	08 jun '20		\$0.00							
41	0%				1.2.1.2.1 Ejecución de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	18 mss	05 dic '18	07 may '20	39	\$0.00							
42	0%				1.2.1.2.2 Recepción final de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	22 días	08 may '20	08 jun '20	41	\$0.00							
43	0%				1.2.1.2.3 Fin de la obra - Segundo puente sobre Río	0 días	08 jun '20	08 jun '20	42	\$0.00							
44	0%				1.2.1.3 Ejecución Financiera	360 días	08 ene '19	08 jun '20		\$60,740,000....							
45	0%	BID			1.2.1.3.1 Pagos BID	18 mss	08 ene '19	08 jun '20	41CC+22 días	\$60,740,000....							
46	0%		E		1.3 Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales del Distrito de Besikó (Comarca	575 días	20 ago '18	25 nov '20		\$16,100,000....							
47	0%	BID			1.3.1 Proceso de Adquisición para la Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales del	575 días	20 ago '18	25 nov '20		\$16,100,000....							
48	0%				1.3.1.1 Proceso de Adquisición	193 días	20 ago '18	23 may '18		\$0.00							
49	0%				1.3.1.1.1 Elaboración de Especificaciones Técnicas	20 días	20 ago '18	14 sep '18		\$0.00							
50	0%				1.3.1.1.2 Preparación de DDL	15 días	17 sep '18	05 oct '18	49	\$0.00							
51	0%				1.3.1.1.3 Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 día	08 oct '18	08 oct '18	50	\$0.00							
52	0%				1.3.1.1.4 No Objeción a DDL	5 días	09 oct '18	15 oct '18	51	\$0.00							

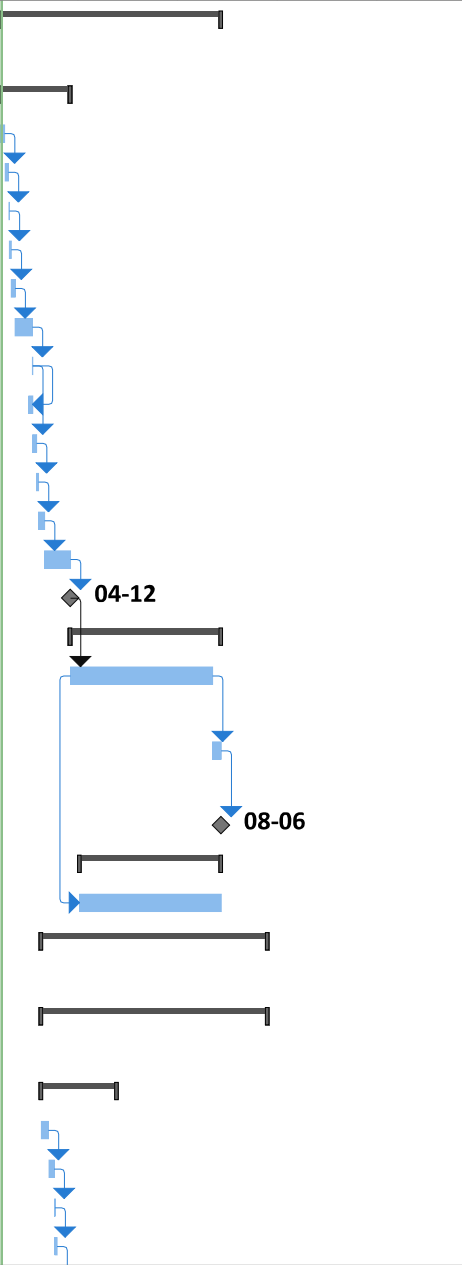

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
53	0%			1.3.1.1.5	Vo.Bo. Del Despacho Superior	10 días	16 oct '18	29 oct '18	52	\$0.00							
54	0%			1.3.1.1.6	Publicacion y Presentacion de Ofertas	45 días	30 oct '18	04 ene '19	53	\$0.00							
55	0%			1.3.1.1.7	Recepcion y Apertura de Ofertas	1 día	07 ene '19	07 ene '19	54	\$0.00							
56	0%			1.3.1.1.8	Designacion de Miembros del Comité de E	10 días	21 dic '18	07 ene '19	55FF	\$0.00							
57	0%			1.3.1.1.9	Evaluacion de Ofertas e Informe	10 días	08 ene '19	22 ene '19	55	\$0.00							
58	0%			1.3.1.1.10	No objeción al informe de evaluación	5 días	23 ene '19	29 ene '19	57	\$0.00							
59	0%			1.3.1.1.11	Adjudicación y elaboración de contrato	15 días	30 ene '19	19 feb '19	58	\$0.00							
60	0%			1.3.1.1.12	Refrendo de Contraloría	66 días	20 feb '19	23 may '19	59	\$0.00							
61	0%			1.3.1.1.13	Orden de Proceder	0 días	23 may '19	23 may '19	60	\$0.00							
62	0%			1.3.1.2	Ejecución del Contrato	382 días	24 may '19	25 nov '20		\$0.00							
63	0%			1.3.1.2.1	Ejecución de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	18 mss	24 may '19	20 oct '20	61	\$0.00							
64	0%			1.3.1.2.2	Recepción final de la obra - Segundo puente sobre Río Chico	22 días	21 oct '20	25 nov '20	63	\$0.00							
65	0%			1.3.1.2.3	Fin de la obra - Segundo puente sobre Río	0 días	25 nov '20	25 nov '20	64	\$0.00							
66	0%			1.3.1.3	Ejecución Financiera	360 días	25 jun '19	25 nov '20		\$16,100,000....							
67	0%	BID		1.3.1.3.1	Pagos BID	18 mss	25 jun '19	25 nov '20	63CC+22 días	\$16,100,000....							
68	0%		C	2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL MOP	769 días	12 nov '18	16 nov '21		\$2,170,000.00							
69	0%		E	2.1	Asesoría Técnica del MOP	190 días	12 nov '18	09 ago '19		\$75,000.00							
70	0%	BID		2.1.1	Proceso de contratación para Asesoría Técnica	190 días	12 nov '18	09 ago '19		\$75,000.00							
71	0%			2.1.1.1	Proceso de Contratación	124 días	12 nov '18	09 may '19		\$0.00							
72	0%			2.1.1.1.1	Elaboración de TDRs	15 días	12 nov '18	03 dic '18		\$0.00							
73	0%			2.1.1.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 día	04 dic '18	04 dic '18	72	\$0.00							
74	0%			2.1.1.1.3	No objeción del BID a los TdRs	5 días	05 dic '18	11 dic '18	73	\$0.00							
75	0%			2.1.1.1.4	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	12 dic '18	26 dic '18	74	\$0.00							
76	0%			2.1.1.1.5	Designación del Comité Evaluador	10 días	12 dic '18	26 dic '18	75FF	\$0.00							
77	0%			2.1.1.1.6	Elaboración de lista corta	5 días	27 dic '18	03 ene '19	76	\$0.00							
78	0%			2.1.1.1.7	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	04 ene '19	11 ene '19	77	\$0.00							
79	0%			2.1.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 día	14 ene '19	14 ene '19	78	\$0.00							
80	0%			2.1.1.1.9	No objeción del BID al Informe final de eva	5 días	15 ene '19	21 ene '19	79	\$0.00							
81	0%			2.1.1.1.10	Negociación y suscripción del contrato	10 días	22 ene '19	04 feb '19	80	\$0.00							
82	0%			2.1.1.1.11	Refrendo de Contraloría	66 días	05 feb '19	08 may '19	81	\$0.00							

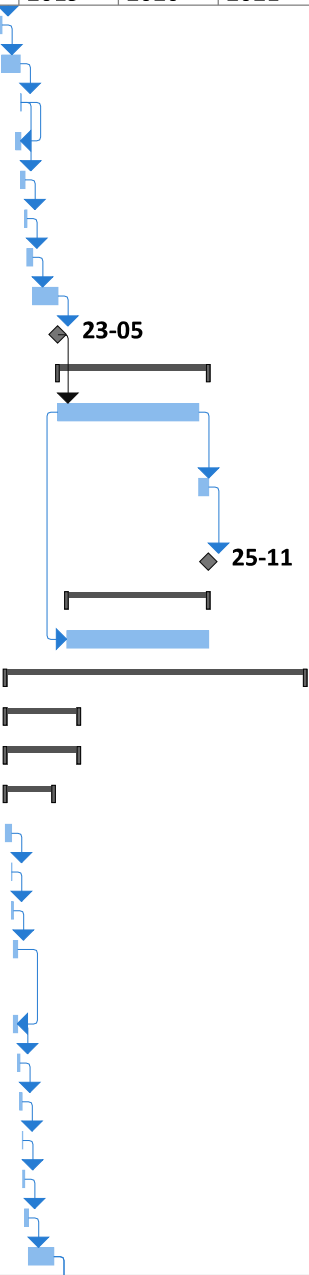


Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
83	0%			2.1.1.1.12	Orden de Proceder	1 día	09 may '19	09 may '19	82	\$0.00							
84	0%			2.1.1.1.13	Envío de contrato firmado al BID	1 día	09 may '19	09 may '19	82	\$0.00							
85	0%			2.1.1.2	Ejecución de la consultoría	44 días	10 may '19	10 jul '19		\$0.00							
86	0%			2.1.1.2.1	Elaboración de informe de evaluación fina	44 días	10 may '19	10 jul '19	83	\$0.00							
87	0%			2.1.1.3	Ejecución Financiera	44 días	11 jun '19	09 ago '19		\$75,000.00							
88	0%	BID		2.1.1.3.1	Pagos BID - Evaluación Final	44 días	11 jun '19	09 ago '19	86CC+22 días	\$75,000.00							
89	0%		E	2.2	Bienes informáticos (10 laptops, 10 receptores GPS, 10 dispositivos de registro de datos (tablets), 10 estaciones de trabajo para GIS y 5	168 días	21 ene '19	13 sep '19		\$75,000.00							
90	0%	BID		2.2.1	Proceso de Adquisición de Bienes informáticos	168 días	21 ene '19	13 sep '19		\$75,000.00							
91	0%			2.2.1.1	Proceso de adquisición	102 días	21 ene '19	12 jun '19		\$0.00							
92	0%			2.2.1.1.1	Revisión de especificaciones técnicas	10 días	21 ene '19	01 feb '19		\$0.00							
93	0%			2.2.1.1.2	Preparación de documento de solicitud de	5 días	04 feb '19	08 feb '19	92	\$0.00							
94	0%			2.2.1.1.3	Solicitud de cotizaciones	5 días	11 feb '19	15 feb '19	93	\$0.00							
95	0%			2.2.1.1.4	Presentación de cotizaciones	10 días	18 feb '19	01 mar '19	94	\$0.00							
96	0%			2.2.1.1.5	Evaluación de las cotizaciones recibidas	5 días	04 mar '19	08 mar '19	95	\$0.00							
97	0%			2.2.1.1.6	Solicitud de no objeción del BID a la adjud	1 día	11 mar '19	11 mar '19	96	\$0.00							
98	0%			2.2.1.1.7	No objeción del BID	5 días	12 mar '19	18 mar '19	97	\$0.00							
99	0%			2.2.1.1.8	Notificación a oferentes	1 día	19 mar '19	19 mar '19	98	\$0.00							
100	0%			2.2.1.1.9	Suscripción del contrato	15 días	20 mar '19	09 abr '19	99	\$0.00							
101	0%			2.2.1.1.10	Refrendo de Contraloría	44 días	10 abr '19	11 jun '19	100	\$0.00							
102	0%			2.2.1.1.11	Orden de proceder	1 día	12 jun '19	12 jun '19	101	\$0.00							
103	0%			2.2.1.1.12	Envío de contrato firmado al BID	1 día	12 jun '19	12 jun '19	101	\$0.00							
104	0%			2.2.1.2	Ejecución de Contrato	44 días	13 jun '19	13 ago '19		\$0.00							
105	0%			2.2.1.2.1	Recepción de equipo informático	44 días	13 jun '19	13 ago '19	102	\$0.00							
106	0%			2.2.1.3	Ejecución Financiera	44 días	15 jul '19	13 sep '19		\$75,000.00							
107	0%	BID		2.2.1.3.1	Pagos BID	44 días	15 jul '19	13 sep '19	105CC+22 d...	\$75,000.00							
108	0%		E	2.3	Equipo de Transporte (2 vehículos pick up)	159 días	24 ene '19	05 sep '19		\$100,000.00							
109	0%	BID		2.3.1	Proceso de adquisicion de equipo de transport	159 días	24 ene '19	05 sep '19		\$100,000.00							
110	0%			2.3.1.1	Proceso de Contratación	159 días	24 ene '19	05 sep '19		\$100,000.00							
111	0%			2.3.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	71 días	24 ene '19	03 may '19		\$0.00							
112	0%			2.3.1.1.1.1	Solicitud de cotizaciones por convenio n	5 días	24 ene '19	30 ene '19		\$0.00							
113	0%			2.3.1.1.1.2	Presentación de cotizaciones	5 días	31 ene '19	06 feb '19	112	\$0.00							




Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
114	0%			2.3.1.1.1.3	Evaluación de las cotizaciones recibidas	5 días	07 feb '19	13 feb '19	113	\$0.00							
115	0%			2.3.1.1.1.4	Solicitud de no objeción del BID a la adju	1 día	14 feb '19	14 feb '19	114	\$0.00							
116	0%			2.3.1.1.1.5	No objeción del BID	5 días	15 feb '19	21 feb '19	115	\$0.00							
117	0%			2.3.1.1.1.6	Suscripción del contrato u orden de con	5 días	22 feb '19	28 feb '19	116	\$0.00							
118	0%			2.3.1.1.1.7	Refrendo de Contraloría	44 días	01 mar '19	02 may '19	117	\$0.00							
119	0%			2.3.1.1.1.8	Orden de Proceder	1 día	03 may '19	03 may '19	118	\$0.00							
120	0%			2.3.1.1.2	Ejecución de contrato	44 días	06 may '19	04 jul '19	119	\$0.00							
121	0%			2.3.1.1.2.1	Recepción de equipo de transporte	44 días	06 may '19	04 jul '19	119	\$0.00							
122	0%			2.3.1.1.3	Avance Financiero	44 días	05 jul '19	05 sep '19		\$100,000.00							
123	0%	BID		2.3.1.1.3.1	Pagos BID	44 días	05 jul '19	05 sep '19		\$100,000.00							
124	0%		E	2.4	Servicios de Consultoria para el fortalecimiento institucional del MOP en aspectos técnicos, gestión social y ambiental de proyectos de infraestructura vial, cambio climático y	370 días	11 mar '19	20 ago '20		\$150,000.00							
125	0%	BID		2.4.1	Proceso de adquisición para la contratación de Servicios de Consultoria para el fortalecimiento institucional del MOP en aspectos técnicos, gestión social y ambiental de proyectos de infraestructura vial, cambio	370 días	11 mar '19	20 ago '20		\$150,000.00							
126	0%			2.4.1.1	Proceso de Contratación	166 días	11 mar '19	30 oct '19		\$0.00							
127	0%			2.4.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 días	11 mar '19	22 mar '19		\$0.00							
128	0%			2.4.1.1.2	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	25 mar '19	05 abr '19	127	\$0.00							
129	0%			2.4.1.1.3	Análisis de expresiones de interés	5 días	08 abr '19	12 abr '19	128	\$0.00							
130	0%			2.4.1.1.4	Elaboración de lista corta	2 días	15 abr '19	16 abr '19	129	\$0.00							
131	0%			2.4.1.1.5	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 días	10 abr '19	16 abr '19	130FF	\$0.00							
132	0%			2.4.1.1.6	No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	17 abr '19	23 abr '19	131	\$0.00							
133	0%			2.4.1.1.7	Notificación de conformación de lista corta	2 días	24 abr '19	25 abr '19	132	\$0.00							
134	0%			2.4.1.1.8	Remisión de SP a integrantes de la lista cor	2 días	24 abr '19	25 abr '19	133CC	\$0.00							
135	0%			2.4.1.1.9	Presentación de propuestas	30 días	26 abr '19	07 jun '19	134	\$0.00							
136	0%			2.4.1.1.10	Evaluación de propuestas	5 días	10 jun '19	14 jun '19	135	\$0.00							

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
137	0%			2.4.1.1.11	Notificación de resultados a los participantes	5 días	17 jun '19	21 jun '19	136	\$0.00							
138	0%			2.4.1.1.12	Negociación del contrato	5 días	24 jun '19	28 jun '19	137	\$0.00							
139	0%			2.4.1.1.13	No objeción del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	01 jul '19	05 jul '19	138	\$0.00							
140	0%			2.4.1.1.14	Publicación de la adjudicación	5 días	08 jul '19	12 jul '19	139	\$0.00							
141	0%			2.4.1.1.15	Suscripción del contrato	10 días	15 jul '19	26 jul '19	140	\$0.00							
142	0%			2.4.1.1.16	Refrendo de Contraloria	66 días	29 jul '19	29 oct '19	141	\$0.00							
143	0%			2.4.1.1.17	Orden de proceder	1 día	30 oct '19	30 oct '19	142	\$0.00							
144	0%			2.4.1.1.18	Envío de contrato al BID	1 día	30 oct '19	30 oct '19	142	\$0.00							
145	0%			2.4.1.2	Ejecución del contrato	182 días	31 oct '19	21 jul '20		\$0.00							
146	0%			2.4.1.2.1	Ejecución de Consultoría de Fortalecimiento institucional	8 mss	31 oct '19	19 jun '20	143	\$0.00							
147	0%			2.4.1.2.2	Entrega final - Consultoría de Fortalecimiento institucional	0 días	21 jul '20	21 jul '20	146FC+22 días	\$0.00							
148	0%			2.4.1.3	Ejecución Financiera	160 días	08 ene '20	20 ago '20		\$150,000.00							
149	0%	BID		2.4.1.3.1	Pagos BID - Consultoría Fortalecimiento In	8 mss	08 ene '20	20 ago '20	146CC+44 d...	\$150,000.00							
150	0%		E	2.5	Servicios de Consultoría para la Revisión de los IV	290 días	18 mar '19	07 may '20		\$80,000.00							
151	0%	BID		2.5.1	Proceso de Adquisición para la contratación de Servicios de Consultoría para la Revisión de	290 días	18 mar '19	07 may '20		\$80,000.00							
152	0%			2.5.1.1	Proceso de Contratación	166 días	18 mar '19	08 nov '19		\$0.00							
153	0%			2.5.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 días	18 mar '19	29 mar '19		\$0.00							
154	0%			2.5.1.1.2	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	01 abr '19	12 abr '19		\$0.00							
155	0%			2.5.1.1.3	Análisis de expresiones de interés	5 días	15 abr '19	19 abr '19	154	\$0.00							
156	0%			2.5.1.1.4	Elaboración de lista corta	2 días	22 abr '19	23 abr '19	155	\$0.00							
157	0%			2.5.1.1.5	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 días	17 abr '19	23 abr '19	156FF	\$0.00							
158	0%			2.5.1.1.6	No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	24 abr '19	30 abr '19	157	\$0.00							
159	0%			2.5.1.1.7	Notificación de conformación de lista corta	2 días	02 may '19	03 may '19	158	\$0.00							
160	0%			2.5.1.1.8	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 días	02 may '19	03 may '19	159CC	\$0.00							
161	0%			2.5.1.1.9	Presentación de propuestas	30 días	06 may '19	14 jun '19	160	\$0.00							
162	0%			2.5.1.1.10	Evaluación de propuestas	5 días	17 jun '19	21 jun '19	161	\$0.00							


Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
163	0%			2.5.1.1.11	Notificación de resultados a los participantes	5 días	24 jun '19	28 jun '19	162	\$0.00							
164	0%			2.5.1.1.12	Negociación del contrato	5 días	01 jul '19	05 jul '19	163	\$0.00							
165	0%			2.5.1.1.13	No objeción del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	08 jul '19	12 jul '19	164	\$0.00							
166	0%			2.5.1.1.14	Publicación de la adjudicación	5 días	15 jul '19	19 jul '19	165	\$0.00							
167	0%			2.5.1.1.15	Suscripción del contrato	10 días	22 jul '19	02 ago '19	166	\$0.00							
168	0%			2.5.1.1.16	Refrendo de Contraloría	66 días	05 ago '19	07 nov '19	167	\$0.00							
169	0%			2.5.1.1.17	Orden de proceder	1 día	08 nov '19	08 nov '19	168	\$0.00							
170	0%			2.5.1.1.18	Envío de contrato al BID	1 día	08 nov '19	08 nov '19	168	\$0.00							
171	0%			2.5.1.2	Ejecución del contrato	102 días	11 nov '19	06 abr '20		\$0.00							
172	0%			2.5.1.2.1	Ejecución de Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión Social y	4 mss	11 nov '19	05 mar '20	169	\$0.00							
173	0%			2.5.1.2.2	Entrega final - Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión	0 días	06 abr '20	06 abr '20	172FC+22 días	\$0.00							
174	0%			2.5.1.3	Ejecución Financiera	80 días	16 ene '20	07 may '20		\$80,000.00							
175	0%	BID		2.5.1.3.1	Pagos BID - Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión Social y	4 mss	16 ene '20	07 may '20	172CC+44 días	\$80,000.00							
176	0%		E	2.6	5 licencias de Software de Ingeniería, Diseño y Modelo de Análisis de Inversión en Carretera (Autocad - Civil 3D, ArcMap, InfraWorks, HDM.4)	168 días	18 mar '19	12 nov '19		\$185,000.00							
177	0%	BID		2.6.1	Proceso de Adquisición para Adquisición de 5 licencias de Software de Ingeniería, Diseño y Modelo de Análisis de Inversión en Carretera (Autocad - Civil 3D, ArcMap, InfraWorks,	168 días	18 mar '19	12 nov '19		\$185,000.00							
178	0%			2.6.1.1	Proceso de adquisición	102 días	18 mar '19	07 ago '19		\$0.00							
179	0%			2.6.1.1.1	Revisión de especificaciones técnicas	10 días	18 mar '19	29 mar '19		\$0.00							
180	0%			2.6.1.1.2	Preparación de documento de solicitud de	5 días	01 abr '19	05 abr '19	179	\$0.00							
181	0%			2.6.1.1.3	Solicitud de cotizaciones	5 días	08 abr '19	12 abr '19	180	\$0.00							
182	0%			2.6.1.1.4	Presentación de cotizaciones	10 días	15 abr '19	26 abr '19	181	\$0.00							
183	0%			2.6.1.1.5	Evaluación de las cotizaciones recibidas	5 días	29 abr '19	06 may '19	182	\$0.00							
184	0%			2.6.1.1.6	Solicitud de no objeción del BID a la adjudicación	1 día	07 may '19	07 may '19	183	\$0.00							
185	0%			2.6.1.1.7	No objeción del BID	5 días	08 may '19	14 may '19	184	\$0.00							
186	0%			2.6.1.1.8	Notificación a oferentes	1 día	15 may '19	15 may '19	185	\$0.00							



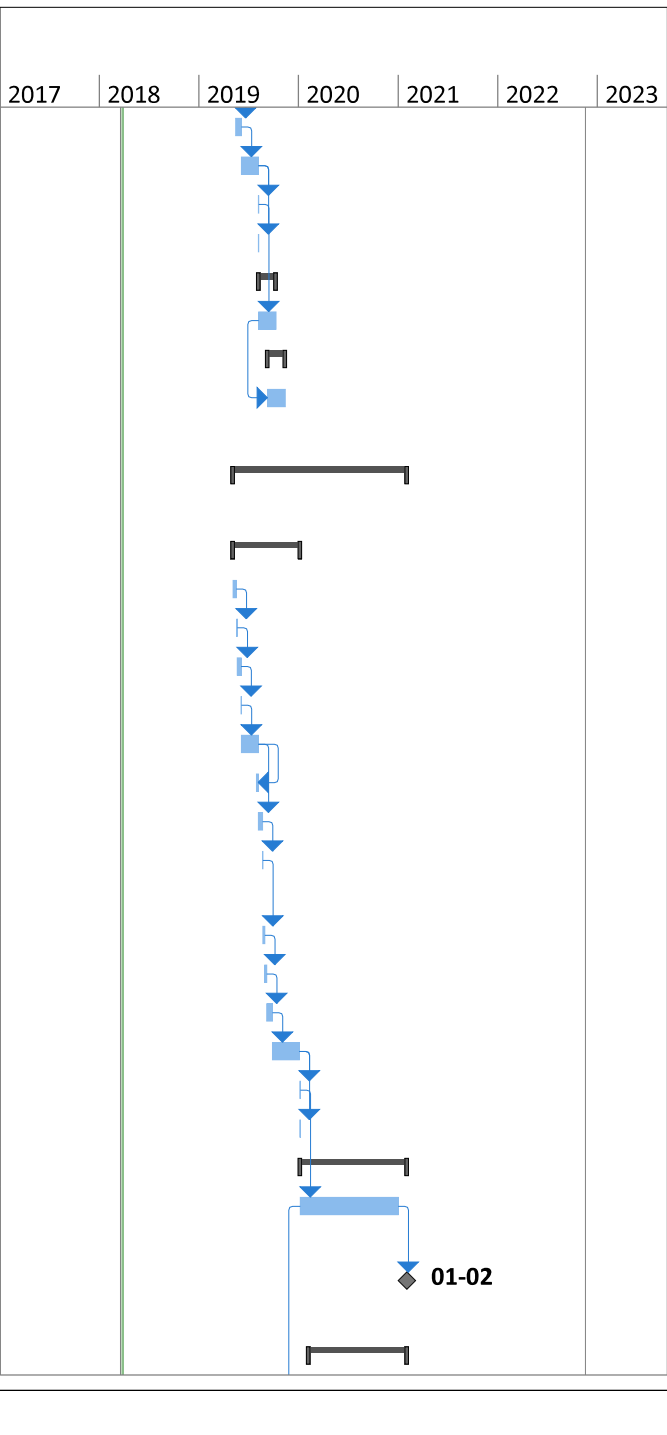Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
187	0%			2.6.1.1.9	Suscripción del contrato	15 días	16 may '19	05 jun '19	186	\$0.00							
188	0%			2.6.1.1.10	Refrendo de Contraloría	44 días	06 jun '19	06 ago '19	187	\$0.00							
189	0%			2.6.1.1.11	Orden de proceder	1 día	07 ago '19	07 ago '19	188	\$0.00							
190	0%			2.6.1.1.12	Envío de contrato firmado al BID	1 día	07 ago '19	07 ago '19	188	\$0.00							
191	0%			2.6.1.2	Ejecución de Contrato	44 días	08 ago '19	09 oct '19		\$0.00							
192	0%			2.6.1.2.1	Recepción de licencias de softwares	44 días	08 ago '19	09 oct '19	189	\$0.00							
193	0%			2.6.1.3	Ejecución Financiera	44 días	10 sep '19	12 nov '19		\$185,000.00							
194	0%	BID		2.6.1.3.1	Pagos BID	44 días	10 sep '19	12 nov '19	192CC+22 d...	\$185,000.00							
195	0%		E	2.7	Sistema de Gestión y Control de Proyectos	443 días	06 may '19	01 feb '21		\$200,000.00							
196	0%	BID		2.7.1	Proceso de Adquisición para Sistema de Gestión y Control de Proyectos	443 días	06 may '19	01 feb '21		\$200,000.00							
197	0%			2.7.1.1	Proceso de Adquisición	170 días	06 may '19	06 ene '20		\$0.00							
198	0%			2.7.1.1.1	Revisión de DDL y presupuesto del proyecto	10 días	06 may '19	17 may '19		\$0.00							
199	0%			2.7.1.1.2	Solicitud de no objeción a DDL	1 día	20 may '19	20 may '19	198	\$0.00							
200	0%			2.7.1.1.3	No objeción del BID a DDL	10 días	21 may '19	03 jun '19	199	\$0.00							
201	0%			2.7.1.1.4	Publicación de convocatoria a participar	1 día	04 jun '19	04 jun '19	200	\$0.00							
202	0%			2.7.1.1.5	Recepción de ofertas	45 días	05 jun '19	06 ago '19	201	\$0.00							
203	0%			2.7.1.1.6	Constitución de la Comisión Evaluadora	5 días	31 jul '19	06 ago '19	202FF	\$0.00							
204	0%			2.7.1.1.7	Evaluación de Propuestas	10 días	07 ago '19	21 ago '19	202	\$0.00							
205	0%			2.7.1.1.8	Solicitud de no objeción del informe de evaluación al BID	1 día	22 ago '19	22 ago '19	204	\$0.00							
206	0%			2.7.1.1.9	No objeción del BID	5 días	23 ago '19	29 ago '19	205	\$0.00							
207	0%			2.7.1.1.10	Notificación a oferentes	5 días	30 ago '19	05 sep '19	206	\$0.00							
208	0%			2.7.1.1.11	Negociación y Firma del Contrato	15 días	06 sep '19	26 sep '19	207	\$0.00							
209	0%			2.7.1.1.12	Refrendo de Contraloría	66 días	27 sep '19	03 ene '20	208	\$0.00							
210	0%			2.7.1.1.13	Orden de Proceder	1 día	06 ene '20	06 ene '20	209	\$0.00							
211	0%			2.7.1.1.14	Envío de contrato al BID	1 día	06 ene '20	06 ene '20	209	\$0.00							
212	0%			2.7.1.2	Ejecución de Contrato	273 días	07 ene '20	01 feb '21		\$0.00							
213	0%			2.7.1.2.1	Desarrollo e implementación de sistema de gestión y control de proyectos	251 días	07 ene '20	31 dic '20	210	\$0.00							
214	0%			2.7.1.2.2	Acta final de recepción del sist. De gestión y control de proyectos	0 días	01 feb '21	01 feb '21	213FC+22 días	\$0.00							
215	0%			2.7.1.3	Ejecución Financiera	251 días	07 feb '20	01 feb '21		\$200,000.00							

Page 8


Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
216	0%	BID		2.7.1.3.1	Pagos BID - Sistema de control y gestión de	251 días	07 feb '20	01 feb '21	213CC+22 d...	\$200,000.00							
217	0%		E	2.8	Sistema de Documentación y Archivo	443 días	06 may '19	01 feb '21		\$180,000.00							
218	0%	BID		2.8.1	Proceso de Adquisición de Sistema de Documentación y Archivo	443 días	06 may '19	01 feb '21		\$180,000.00							
219	0%			2.8.1.1	Proceso de Adquisición	443 días	06 may '19	01 feb '21		\$180,000.00							
220	0%			2.8.1.1.1	Revisión de DDL y presupuesto del proyecto	10 días	06 may '19	17 may '19		\$0.00							
221	0%			2.8.1.1.2	Solicitud de no objeción a DDL	1 día	20 may '19	20 may '19	220	\$0.00							
222	0%			2.8.1.1.3	No objeción del BID a DDL	10 días	21 may '19	03 jun '19	221	\$0.00							
223	0%			2.8.1.1.4	Publicación de convocatoria a participar	1 día	04 jun '19	04 jun '19	222	\$0.00							
224	0%			2.8.1.1.5	Recepción de ofertas	45 días	05 jun '19	06 ago '19	223	\$0.00							
225	0%			2.8.1.1.6	Constitución de la Comisión Evaluadora	5 días	31 jul '19	06 ago '19	224FF	\$0.00							
226	0%			2.8.1.1.7	Evaluación de Propuestas	10 días	07 ago '19	21 ago '19	224	\$0.00							
227	0%			2.8.1.1.8	Solicitud de no objeción del informe de evaluación al BID	1 día	22 ago '19	22 ago '19	226	\$0.00							
228	0%			2.8.1.1.9	No objeción del BID	5 días	23 ago '19	29 ago '19	227	\$0.00							
229	0%			2.8.1.1.10	Notificación a oferentes	5 días	30 ago '19	05 sep '19	228	\$0.00							
230	0%			2.8.1.1.11	Negociación y Firma del Contrato	15 días	06 sep '19	26 sep '19	229	\$0.00							
231	0%			2.8.1.1.12	Refrendo de Contraloría	66 días	27 sep '19	03 ene '20	230	\$0.00							
232	0%			2.8.1.1.13	Orden de Proceder	1 día	06 ene '20	06 ene '20	231	\$0.00							
233	0%			2.8.1.1.14	Envío de contrato al BID	1 día	06 ene '20	06 ene '20	231	\$0.00							
234	0%			2.8.1.1.15	Ejecución de Contrato	273 días	07 ene '20	01 feb '21		\$0.00							
235	0%			2.8.1.1.15.1	Desarrollo e implementación de sistema de documentación y archivo	251 días	07 ene '20	31 dic '20	232	\$0.00							
236	0%			2.8.1.1.15.2	Acta final de repeción del sistema de documentación y archivo	0 días	01 feb '21	01 feb '21	235FC+22 días	\$0.00							
237	0%			2.8.1.1.16	Ejecución Financiera	251 días	07 feb '20	01 feb '21		\$180,000.00							
238	0%	BID		2.8.1.1.16.1	Pagos BID - sistema de documentación y	251 días	07 feb '20	01 feb '21	235CC+22 d...	\$180,000.00							
239	0%		E	2.9	Servicios de Consultoría para Preinversión de proyectos prioritarios del MOP (estudios por	570 días	20 may '19	11 ago '21		\$280,000.00							
240	0%	BID		2.9.1	Proceso de adquisición para la contratación de Servicios de Consultoría para Preinversión	570 días	20 may '19	11 ago '21		\$280,000.00							
241	0%			2.9.1.1	Proceso de Contratación	166 días	20 may '19	15 ene '20		\$0.00							
242	0%			2.9.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 días	20 may '19	31 may '19		\$0.00							

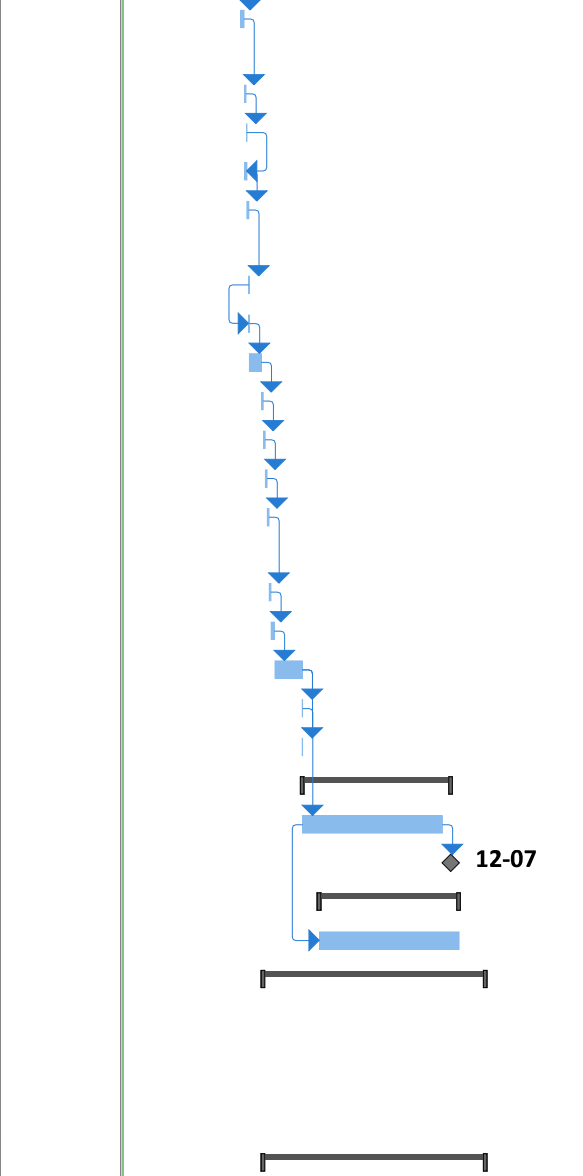Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
243	0%			2.9.1.1.2	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	03 jun '19	14 jun '19	242	\$0.00							
244	0%			2.9.1.1.3	Análisis de expresiones de interés	5 días	17 jun '19	21 jun '19	243	\$0.00							
245	0%			2.9.1.1.4	Elaboración de lista corta	2 días	24 jun '19	25 jun '19	244	\$0.00							
246	0%			2.9.1.1.5	Preparación de documento de solicitud de	5 días	19 jun '19	25 jun '19	245FF	\$0.00							
247	0%			2.9.1.1.6	No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	26 jun '19	02 jul '19	246	\$0.00							
248	0%			2.9.1.1.7	Notificación de conformación de lista cort	2 días	03 jul '19	04 jul '19	247	\$0.00							
249	0%			2.9.1.1.8	Remisión de SP a integrantes de la lista cor	2 días	03 jul '19	04 jul '19	248CC	\$0.00							
250	0%			2.9.1.1.9	Presentación de propuestas	30 días	05 jul '19	16 ago '19	249	\$0.00							
251	0%			2.9.1.1.10	Evaluación de propuestas	5 días	19 ago '19	23 ago '19	250	\$0.00							
252	0%			2.9.1.1.11	Notificación de resultados a los participant	5 días	26 ago '19	30 ago '19	251	\$0.00							
253	0%			2.9.1.1.12	Negociación del contrato	5 días	02 sep '19	06 sep '19	252	\$0.00							
254	0%			2.9.1.1.13	No objerción del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	09 sep '19	13 sep '19	253	\$0.00							
255	0%			2.9.1.1.14	Publicación de la adjudicación	5 días	16 sep '19	20 sep '19	254	\$0.00							
256	0%			2.9.1.1.15	Suscripción del contrato	10 días	23 sep '19	04 oct '19	255	\$0.00							
257	0%			2.9.1.1.16	Refrendo de Contraloria	66 días	07 oct '19	14 ene '20	256	\$0.00							
258	0%			2.9.1.1.17	Orden de proceder	1 día	15 ene '20	15 ene '20	257	\$0.00							
259	0%			2.9.1.1.18	Envío de contrato al BID	1 día	15 ene '20	15 ene '20	257	\$0.00							
260	0%			2.9.1.2	Ejecución del contrato	382 días	16 ene '20	12 jul '21		\$0.00							
261	0%			2.9.1.2.1	Ejecución de Consultoría para Preinversiór	18 mss	16 ene '20	10 jun '21	258	\$0.00							
262	0%			2.9.1.2.2	Entrega final - Consultoría para Preinversi	0 días	12 jul '21	12 jul '21	261FC+22 dí...	\$0.00							
263	0%			2.9.1.3	Ejecución Financiera	360 días	18 mar '20	11 ago '21		\$280,000.00							
264	0%	BID		2.9.1.3.1	Pagos BID - Consultoría para Preinversión	18 mss	18 mar '20	11 ago '21	261CC+44 d...	\$280,000.00							
265	0%		E	2.10	Servicios de Consultoría para Estructuración de un Sistema de Gestión de Activos Viales (Invetario, Planificación, Inversión, Manitenimiento y Operación) los Estudios de Preinversión, Factibilidad y diseños de	570 días	26 ago '19	16 nov '21		\$320,000.00							
266	0%	BID		2.10.1	Proceso de adquisición para la contratación de Servicios de Consultoría para Estructuración de un Sistema de Gestión de	570 días	26 ago '19	16 nov '21		\$320,000.00							

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
267	0%			2.10.1.1	Proceso de Contratación	166 días	26 ago '19	21 abr '20		\$0.00							
268	0%			2.10.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 días	26 ago '19	06 sep '19		\$0.00							
269	0%			2.10.1.1.2	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	09 sep '19	20 sep '19	268	\$0.00							
270	0%			2.10.1.1.3	Análisis de expresiones de interés	5 días	23 sep '19	27 sep '19	269	\$0.00							
271	0%			2.10.1.1.4	Elaboración de lista corta	2 días	30 sep '19	01 oct '19	270	\$0.00							
272	0%			2.10.1.1.5	Preparación de documento de solicitud de	5 días	25 sep '19	01 oct '19	271FF	\$0.00							
273	0%			2.10.1.1.6	No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	02 oct '19	08 oct '19	272	\$0.00							
274	0%			2.10.1.1.7	Notificación de conformación de lista cort	2 días	09 oct '19	10 oct '19	273	\$0.00							
275	0%			2.10.1.1.8	Remisión de SP a integrantes de la lista cor	2 días	09 oct '19	10 oct '19	274CC	\$0.00							
276	0%			2.10.1.1.9	Presentación de propuestas	30 días	11 oct '19	25 nov '19	275	\$0.00							
277	0%			2.10.1.1.10	Evaluación de propuestas	5 días	26 nov '19	03 dic '19	276	\$0.00							
278	0%			2.10.1.1.11	Notificación de resultados a los participant	5 días	04 dic '19	10 dic '19	277	\$0.00							
279	0%			2.10.1.1.12	Negociación del contrato	5 días	11 dic '19	17 dic '19	278	\$0.00							
280	0%			2.10.1.1.13	No objección del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	18 dic '19	24 dic '19	279	\$0.00							
281	0%			2.10.1.1.14	Publicación de la adjudicación	5 días	26 dic '19	02 ene '20	280	\$0.00							
282	0%			2.10.1.1.15	Suscripción del contrato	10 días	03 ene '20	17 ene '20	281	\$0.00							
283	0%			2.10.1.1.16	Refrendo de Contraloria	66 días	20 ene '20	20 abr '20	282	\$0.00							
284	0%			2.10.1.1.17	Orden de proceder	1 día	21 abr '20	21 abr '20	283	\$0.00							
285	0%			2.10.1.1.18	Envío de contrato al BID	1 día	21 abr '20	21 abr '20	283	\$0.00							
286	0%			2.10.1.2	Ejecución del contrato	382 días	22 abr '20	15 oct '21		\$0.00							
287	0%			2.10.1.2.1	Ejecución de Consultoría para Estructuración de un Sistema de Gestión de Activos Viales (Invetario, Planificación, Inversión, Manitenimiento y Operación) los Estudios de Preinversión, Factibilidad y	18 mss	22 abr '20	15 sep '21	284	\$0.00							
288	0%			2.10.1.2.2	Entrega final - Consultoría para Estructuración de un Sistema de Gestión de Activos Viales (Invetario, Planificación,	0 días	15 oct '21	15 oct '21	287FC+22 días	\$0.00							
289	0%			2.10.1.3	Ejecución Financiera	360 días	24 jun '20	16 nov '21		\$320,000.00							

Page 11

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
290	0%	BID		2.10.1.3.1	Pagos BID - Consultoría para Estructuración de un Sistema de Gestión de Activos Viales (Inventario, Planificación,	18 mss	24 jun '20	16 nov '21	287CC+44 días	\$320,000.00							
291	0%		E	2.11	Adquisición de Sistema de Gestión de Activos Viales	443 días	03 feb '20	21 oct '21		\$275,000.00							
292	0%	BID		2.11.1	Proceso de adquisición para Sistema de Gestión de Activos Viales	443 días	03 feb '20	21 oct '21		\$275,000.00							
293	0%			2.11.1.1	Proceso de Adquisición	170 días	03 feb '20	28 sep '20		\$0.00							
294	0%			2.11.1.1.1	Revisión de DDL y presupuesto del proyecto	10 días	03 feb '20	14 feb '20		\$0.00							
295	0%			2.11.1.1.2	Solicitud de no objeción a DDL	1 día	17 feb '20	17 feb '20	294	\$0.00							
296	0%			2.11.1.1.3	No objeción del BID a DDL	10 días	18 feb '20	02 mar '20	295	\$0.00							
297	0%			2.11.1.1.4	Publicación de convocatoria a participar	1 día	03 mar '20	03 mar '20	296	\$0.00							
298	0%			2.11.1.1.5	Recepción de ofertas	45 días	04 mar '20	06 may '20	297	\$0.00							
299	0%			2.11.1.1.6	Constitución de la Comisión Evaluadora	5 días	29 abr '20	06 may '20	298FF	\$0.00							
300	0%			2.11.1.1.7	Evaluación de Propuestas	10 días	07 may '20	20 may '20	298	\$0.00							
301	0%			2.11.1.1.8	Solicitud de no objeción del informe de evaluación al BID	1 día	21 may '20	21 may '20	300	\$0.00							
302	0%			2.11.1.1.9	No objeción del BID	5 días	22 may '20	28 may '20	301	\$0.00							
303	0%			2.11.1.1.10	Notificación a oferentes	5 días	29 may '20	04 jun '20	302	\$0.00							
304	0%			2.11.1.1.11	Negociación y Firma del Contrato	15 días	05 jun '20	25 jun '20	303	\$0.00							
305	0%			2.11.1.1.12	Refrendo de Contraloría	66 días	26 jun '20	25 sep '20	304	\$0.00							
306	0%			2.11.1.1.13	Orden de Proceder	1 día	28 sep '20	28 sep '20	305	\$0.00							
307	0%			2.11.1.1.14	Envío de contrato al BID	1 día	28 sep '20	28 sep '20	305	\$0.00							
308	0%			2.11.1.2	Ejecución de Contrato	273 días	29 sep '20	21 oct '21		\$0.00							
309	0%			2.11.1.2.1	Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión de Activos Viales	251 días	29 sep '20	21 sep '21		\$0.00							
310	0%			2.11.1.2.2	Acta final de repeción del Sistema de Gestión de Activos Viales	0 días	21 oct '21	21 oct '21	309FC+22 días	\$0.00							
311	0%			2.11.1.3	Ejecución Financiera	251 días	29 oct '20	21 oct '21		\$275,000.00							
312	0%	BID		2.11.1.3.1	Pagos BID - Sistema de Gestión de Activos	251 días	29 oct '20	21 oct '21	309CC+22 d...	\$275,000.00							
313	0%		E	2.12	Servicios de Consultoría para el Diseño de la Metodología "Blue Sopt Analysis", de priorización de inversiones para adaptabilidad	290 días	20 may '19	08 jul '20		\$250,000.00							

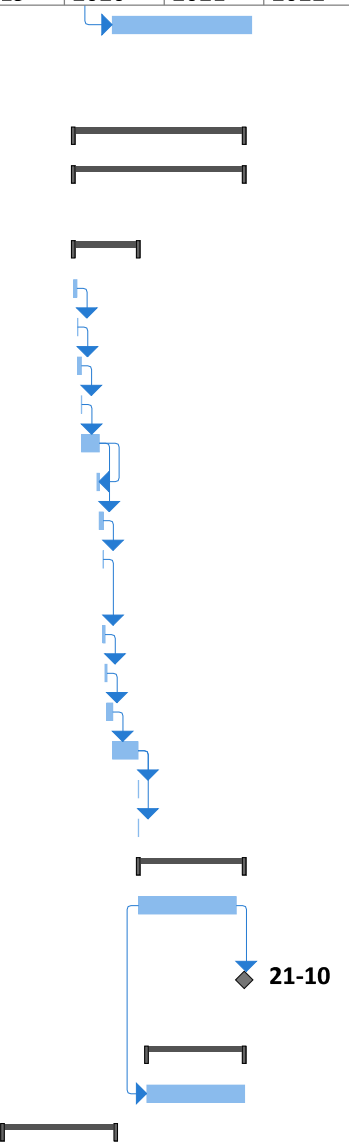


Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
314	0%	BID		2.12.1	Proceso para la contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño de la Metodología "Blue Sopt Analysis", de priorización de	290 días	20 may '19	08 jul '20		\$250,000.00							
315	0%			2.12.1.1	Proceso de Contratación	166 días	20 may '19	15 ene '20		\$0.00							
316	0%			2.12.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 días	20 may '19	31 may '19		\$0.00							
317	0%			2.12.1.1.2	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	03 jun '19	14 jun '19	316	\$0.00							
318	0%			2.12.1.1.3	Análisis de expresiones de interés	5 días	17 jun '19	21 jun '19	317	\$0.00							
319	0%			2.12.1.1.4	Elaboración de lista corta	2 días	24 jun '19	25 jun '19	318	\$0.00							
320	0%			2.12.1.1.5	Preparación de documento de solicitud de	5 días	19 jun '19	25 jun '19	319FF	\$0.00							
321	0%			2.12.1.1.6	No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	26 jun '19	02 jul '19	320	\$0.00							
322	0%			2.12.1.1.7	Notificación de conformación de lista corta	2 días	03 jul '19	04 jul '19	321	\$0.00							
323	0%			2.12.1.1.8	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 días	03 jul '19	04 jul '19	322CC	\$0.00							
324	0%			2.12.1.1.9	Presentación de propuestas	30 días	05 jul '19	16 ago '19	323	\$0.00							
325	0%			2.12.1.1.10	Evaluación de propuestas	5 días	19 ago '19	23 ago '19	324	\$0.00							
326	0%			2.12.1.1.11	Notificación de resultados a los participantes	5 días	26 ago '19	30 ago '19	325	\$0.00							
327	0%			2.12.1.1.12	Negociación del contrato	5 días	02 sep '19	06 sep '19	326	\$0.00							
328	0%			2.12.1.1.13	No objeción del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	09 sep '19	13 sep '19	327	\$0.00							
329	0%			2.12.1.1.14	Publicación de la adjudicación	5 días	16 sep '19	20 sep '19	328	\$0.00							
330	0%			2.12.1.1.15	Suscripción del contrato	10 días	23 sep '19	04 oct '19	329	\$0.00							
331	0%			2.12.1.1.16	Refrendo de Contraloria	66 días	07 oct '19	14 ene '20	330	\$0.00							
332	0%			2.12.1.1.17	Orden de proceder	1 día	15 ene '20	15 ene '20	331	\$0.00							
333	0%			2.12.1.1.18	Envío de contrato al BID	1 día	15 ene '20	15 ene '20	331	\$0.00							
334	0%			2.12.1.2	Ejecución del contrato	102 días	16 ene '20	08 jun '20		\$0.00							
335	0%			2.12.1.2.1	Ejecución de Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión Social y	4 mss	16 ene '20	07 may '20	332	\$0.00							
336	0%			2.12.1.2.2	Entrega final - Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión	0 días	08 jun '20	08 jun '20	335FC+22 días	\$0.00							
337	0%			2.12.1.3	Ejecución Financiera	80 días	18 mar '20	08 jul '20		\$250,000.00							
338	0%	BID		2.12.1.3.1	Pagos BID - Consultoría para la Revisión de los Manuales de Gestión Social y	4 mss	18 mar '20	08 jul '20	335CC+44 días	\$250,000.00							

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
339	0%			C	3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	1056 días	01 oct '18	17 nov '22		\$200,000.00							
340	0%			E	3.1 Servicios de Consultoría para la Auditoría Financiera Independiente del Programa	956 días	01 oct '18	30 jun '22		\$150,000.00							
341	0%	BID			3.1.1 Proceso de contratación de la Auditoría Financiera Independiente del Programa	956 días	01 oct '18	30 jun '22		\$150,000.00							
342	0%				3.1.1.1 Elaboración de TDRs y de presupuesto	156 días	01 oct '18	14 may '19		\$0.00							
343	0%				3.1.1.1.1 Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	01 oct '18	12 oct '18		\$0.00							
344	0%				3.1.1.1.2 Análisis de expresiones de interés	5 días	15 oct '18	19 oct '18	343	\$0.00							
345	0%				3.1.1.1.3 Elaboración de lista corta	2 días	22 oct '18	23 oct '18	344	\$0.00							
346	0%				3.1.1.1.4 Preparación de documento de solicitud de	5 días	17 oct '18	23 oct '18	345FF	\$0.00							
347	0%				3.1.1.1.5 No objeción al documento de solicitud de propuestas y lista corta	5 días	24 oct '18	30 oct '18	346	\$0.00							
348	0%				3.1.1.1.6 Notificación de conformación de lista cort	2 días	31 oct '18	01 nov '18	347	\$0.00							
349	0%				3.1.1.1.7 Remisión de SP a integrantes de la lista cor	2 días	31 oct '18	01 nov '18	348CC	\$0.00							
350	0%				3.1.1.1.8 Presentación de propuestas	30 días	02 nov '18	17 dic '18	349	\$0.00							
351	0%				3.1.1.1.9 Evaluación de propuestas	5 días	18 dic '18	24 dic '18	350	\$0.00							
352	0%				3.1.1.1.10 Notificación de resultados a los participan	5 días	26 dic '18	02 ene '19	351	\$0.00							
353	0%				3.1.1.1.11 Negociación del contrato	5 días	03 ene '19	10 ene '19	352	\$0.00							
354	0%				3.1.1.1.12 No objercción del BID al informe de evaluación y contrato negociado	5 días	11 ene '19	17 ene '19	353	\$0.00							
355	0%				3.1.1.1.13 Publicación de la adjudicación	5 días	18 ene '19	24 ene '19	354	\$0.00							
356	0%				3.1.1.1.14 Suscripción del contrato	10 días	25 ene '19	07 feb '19	355	\$0.00							
357	0%				3.1.1.1.15 Refrendo de Contraloria	66 días	08 feb '19	13 may '19	356	\$0.00							
358	0%				3.1.1.1.16 Orden de proceder	1 día	14 may '19	14 may '19	357	\$0.00							
359	0%				3.1.1.1.17 Envío de contrato al BID	1 día	14 may '19	14 may '19	357	\$0.00							
360	0%				3.1.1.2 Ejecución del contrato	845 días	08 ene '19	29 abr '22		\$0.00							
361	0%				3.1.1.2.1 Auditoría año 2018	80 días	08 ene '19	30 abr '19		\$0.00							
362	0%				3.1.1.2.2 Auditoría año 2019	80 días	02 ene '20	23 abr '20	361CC+249 ...	\$0.00							
363	0%				3.1.1.2.3 Auditoría año 2020	84 días	04 ene '21	29 abr '21	362CC+249 ...	\$0.00							
364	0%				3.1.1.2.4 Auditoría año 2021	81 días	03 ene '22	29 abr '22	363CC+260 ...	\$0.00							
365	0%				3.1.1.3 Ejecución Financiera	809 días	02 may '19	30 jun '22		\$150,000.00							
366	0%	BID			3.1.1.3.1 Auditoría año 2018	44 días	02 may '19	02 jul '19	361	\$37,500.00							

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
367	0%	BID			3.1.1.3.2 Auditoría año 2019	44 días	24 abr '20	25 jun '20	362	\$37,500.00							
368	0%	BID			3.1.1.3.3 Auditoría año 2020	44 días	30 abr '21	30 jun '21	363	\$37,500.00							
369	0%	BID			3.1.1.3.4 Auditoría año 2021	44 días	02 may '22	30 jun '22	364	\$37,500.00							
370	0%		E		3.2 Evaluación Intermedia del Programa de Integraci	195 días	15 jun '20	19 mar '21		\$25,000.00							
371	0%	BID			3.2.1 Proceso de adquisición para la contratación de Evaluación Intermedia del Programa de	195 días	15 jun '20	19 mar '21		\$25,000.00							
372	0%				3.2.1.1 Proceso de Contratación	129 días	15 jun '20	16 dic '20		\$0.00							
373	0%				3.2.1.1.1 Elaboración de TDRs	15 días	15 jun '20	03 jul '20		\$0.00							
374	0%				3.2.1.1.2 Solicitud de no objeción al BID	1 día	06 jul '20	06 jul '20		\$0.00							
375	0%				3.2.1.1.3 No objeción del BID a los TdRs	5 días	07 jul '20	13 jul '20	374	\$0.00							
376	0%				3.2.1.1.4 Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	14 jul '20	27 jul '20	375	\$0.00							
377	0%				3.2.1.1.5 Designación del Comité Evaluador	10 días	14 jul '20	27 jul '20	376FF	\$0.00							
378	0%				3.2.1.1.6 Elaboración de lista corta	5 días	28 jul '20	03 ago '20	377	\$0.00							
379	0%				3.2.1.1.7 Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	04 ago '20	10 ago '20	378	\$0.00							
380	0%				3.2.1.1.8 Solicitud de no obejciòn del BID	1 día	11 ago '20	11 ago '20	379	\$0.00							
381	0%				3.2.1.1.9 No objeción del BID al Informe final de eva	5 días	12 ago '20	18 ago '20	380	\$0.00							
382	0%				3.2.1.1.10 Negociación y suscripción del contrato	15 días	19 ago '20	08 sep '20	381	\$0.00							
383	0%				3.2.1.1.11 Refrendo de Contraloría	66 días	09 sep '20	15 dic '20	382	\$0.00							
384	0%				3.2.1.1.12 Orden de Proceder	1 día	16 dic '20	16 dic '20	383	\$0.00							
385	0%				3.2.1.1.13 Envío de contrato firmado al BID	1 día	16 dic '20	16 dic '20	383	\$0.00							
386	0%				3.2.1.2 Ejecución de la consultoría	44 días	17 dic '20	17 feb '21		\$0.00							
387	0%				3.2.1.2.1 Elaboración de informe de evaluación fina	44 días	17 dic '20	17 feb '21	384	\$0.00							
388	0%				3.2.1.3 Ejecución Financiera	44 días	19 ene '21	19 mar '21		\$25,000.00							
389	0%	BID			3.2.1.3.1 Pagos BID - Evaluación Final	44 días	19 ene '21	19 mar '21	387CC+22 d...	\$25,000.00							
390	0%		E		3.3 Evaluación Final del Programa de Integración Vía	195 días	14 feb '22	17 nov '22		\$25,000.00							
391	0%	BID			3.3.1 Proceso de contratación para la Evaluación Final del Programa de Integración Vial II	195 días	14 feb '22	17 nov '22		\$25,000.00							
392	0%				3.3.1.1 Proceso de Contratación	129 días	14 feb '22	17 ago '22		\$0.00							
393	0%				3.3.1.1.1 Elaboración de TDRs	15 días	14 feb '22	08 mar '22		\$0.00							
394	0%				3.3.1.1.2 Solicitud de no objeción al BID	1 día	09 mar '22	09 mar '22	393	\$0.00							
395	0%				3.3.1.1.3 No objeción del BID a los TdRs	5 días	10 mar '22	16 mar '22	394	\$0.00							

Id	% Ava	Fuen	De	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Costo							
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
396	0%			3.3.1.1.4	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	10 días	17 mar '22	30 mar '22	395	\$0.00							
397	0%			3.3.1.1.5	Designación del Comité Evaluador	10 días	17 mar '22	30 mar '22	396FF	\$0.00							
398	0%			3.3.1.1.6	Elaboración de lista corta	5 días	31 mar '22	06 abr '22	397	\$0.00							
399	0%			3.3.1.1.7	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	07 abr '22	13 abr '22	398	\$0.00							
400	0%			3.3.1.1.8	Solicitud de no obejciòn del BID	1 día	18 abr '22	18 abr '22	399	\$0.00							
401	0%			3.3.1.1.9	No objeción del BID al Informe final de eva	5 días	19 abr '22	25 abr '22	400	\$0.00							
402	0%			3.3.1.1.10	Negociación y suscripción del contrato	15 días	26 abr '22	16 may '22	401	\$0.00							
403	0%			3.3.1.1.11	Refrendo de Contraloría	66 días	17 may '22	16 ago '22	402	\$0.00							
404	0%			3.3.1.1.12	Orden de Proceder	1 día	17 ago '22	17 ago '22	403	\$0.00							
405	0%			3.3.1.1.13	Envío de contrato firmado al BID	1 día	17 ago '22	17 ago '22	403	\$0.00							
406	0%			3.3.1.2	Ejecución de la consultoría	44 días	18 ago '22	18 oct '22		\$0.00							
407	0%			3.3.1.2.1	Elaboración de informe de evaluación fina	44 días	18 ago '22	18 oct '22	404	\$0.00							
408	0%			3.3.1.3	Ejecución Financiera	44 días	19 sep '22	17 nov '22		\$25,000.00							
409	0%	BID		3.3.1.3.1	Pagos BID - Evaluación Final	44 días	19 sep '22	17 nov '22	407CC+22 d...	\$25,000.00							



PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL DE LA REGIÓN CENTRAL Y OCCIDENTAL DE PANAMÁ (PN-L1147)

PLANIFICACIÓN FÍSICO - FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Productos	Costo estimado (US\$)	Unidad de medida	Línea de base	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Meta final	Frecuencia de Medición	Medio de verificación
			2018							
Componente 1: Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial										
• Tramo Atalaya – Mariato – Quebró – Flores y ramal Varadero rehabilitado	\$ 60.740.000	Km	0	45	50	18,26	0	113,26	Anual (en coincidencia con el Informe del II semestre)	Informes de la supervisión Acta de recepción de las obras Responsable: MOP-BID
		\$	\$ -	\$24.132.968	\$26.814.409	\$ 9.792.622	\$ -	\$ 60.740.000		
• Tramo Camino rural distrito de Besikó mejorado	\$ 16.100.000	Km	0	5	17,9	0	0	22,9		
		\$	\$ -	\$ 3.515.284	\$12.584.716	\$ -	\$ -	\$ 16.100.000		
• Puente sobre Río Chico Construido	\$ 7.790.000	Ud	0	0	1	0	0	1		
		\$	\$2.300.000	\$ 3.116.000	\$ 2.374.000	\$ -	\$ -	\$ 7.790.000		
Componente 2: Desarrollo de capacidades del MOP										
Sistema de Gestión de Activos Viales estructurado e implementado	\$ 595.000	No. de sistemas	0	0	0	1	0	1	Anual (en coincidencia con el Informe del II semestre)	Informe final de consultoría Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ 178.500	\$ 178.500	\$ 238.000	\$ -	\$ 595.000		
Número de equipos informáticos adquiridos y funcionando (15 laptops, 15 receptores GPS, 15 dispositivos de registro de datos (tablets), 15 estaciones de trabajo para GIS y 15 camaras fotográficas HD)	\$ 75.000	No. de equipos	0	10	35	0	0	45		Acta de Recepción de bienes Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ 16.667	\$ 58.333	\$ -	\$ -	\$ 75.000		
Número de licencias de software adquiridas y en funcionamiento	\$ 185.000	No. de licencias	0	5	10	5	0	20		Acta de Recepción de bienes Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ 46.250	\$ 92.500	\$ 46.250	\$ -	\$ 185.000		
Número de equipos de transporte adquiridos y funcionando (2 vehículos <i>pick up</i>)	\$ 100.000	No. de equipos	0	0	2	0	0	2		Acta de Recepción de bienes Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000		
Sistema de Documentación y Archivo adquirido e implementado	\$ 180.000	No. de sistemas	0	0	1	0	0	1		Acta de Recepción de bienes Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ -	\$ -	\$ 180.000		
Sistema de gestión de proyectos adquirido e implementado	\$ 200.000	No. de sistemas	0	0	0	1	0	1		Acta de Recepción de bienes Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ -	\$ 80.000	\$ 120.000	\$ -	\$ 200.000		
Número de estudios de preinversión y asesorías técnicas contratadas y finalizadas.	\$ 505.000	No. de estudios	0	1	3	3	2	9		Informe final de consultoría Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ 56.111	\$ 168.333	\$ 168.333	\$112.222	\$ 505.000		
Manual de procedimientos ambientales revisado y adoptado por el MOP	\$ 80.000	Manual	0	0	1	0	0	1		Manual publicado en la web del MOP Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ -	\$ 80.000	\$ -	\$ -	\$ 80.000		
Metodología "Blue Sopt Analysis" desarrollada.	\$ 250.000	Metodología	0	0	1	0	0	1		Informe final de consultoría Responsable: MOP
		\$	\$ -	\$ -	\$ 250.000	\$ -	\$ -	\$ 250.000		
