


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
0	0		PEP-POA del Programa BO-L1188	1715 days	Mon 5/12/16	Fri 30/6/23	\$40.000.000,00											
1	0		Inicio de preparación del Programa	0 days	Mon 5/12/16	Mon 5/12/16	\$0,00				5/12							
2	0		Actividades previas de preparación del Programa	309 days	Mon 5/12/16	Thu 8/2/18	\$0,00											
3	0		Misión de Identificación	4 days	Mon 5/12/16	Thu 8/12/16	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
4	0		Misión de Orientación	4 days	Mon 19/6/17	Thu 22/6/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
5	0		Misión de Análisis	8 days	Tue 29/8/17	Thu 7/9/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
6	0		Distribución del POD	1 day	Fri 15/9/17	Fri 15/9/17	\$0,00	BID										
7	0		Misión de Negociación MEFP / MMAYa / MPD-FPS / BID	5 days	Mon 16/10/17	Fri 20/10/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
8	0		Aprobación del Préstamo por el Directorio del BID	1 day	Thu 30/11/17	Thu 30/11/17	\$0,00	BID										
9	0		Autorización de firma del Contrato de Préstamo mediante Decreto Supremo	1 day	Thu 1/2/18	Thu 1/2/18	\$0,00	GDB										
10	0		Firma del Contrato de Préstamo	5 days	Fri 2/2/18	Thu 8/2/18	\$0,00	BID;MEFP										
11	0		Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00											
12	0	CPPD	Tramitación de la Resolución Ministerial del MMAYa de Aprobación del ROP	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
13	0		ROP aprobado	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00				12/6							
14	0	CPPD	Selección del Personal Clave del Programa BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00											
15	0		Responsable Técnico BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;A - UCEP Mi Riego										
16	0		Especialista de Adquisiciones BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	A - UCEP Mi Riego;CG - UCEP Mi Riego;RT - BO-L1188										
17	0		Especialista Financiero BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;A - UCEP Mi Riego;RT - BO-L1188										
18	0		Personal clave de la UCEP Mi Riego seleccionado	0 days	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00				8/6							
19	0	CPPD	Tramitación de la Resolución Ministerial del MMAYa que incorpore el Programa BO-L1188 a la cartera de programas y proyectos de la UCEP Mi Riego	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
20	0		Resolución Ministerial emitida	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00				12/6							
21	0		Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00				12/6							
22	1		Componente I: Reducción del Riesgo Climático	1500 days	Mon 2/10/17	Fri 30/6/23	\$36.925.200,00											
23	1.1		Producto 1: Proyectos de la muestra en la cuenca del río Rocha para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	763 days	Mon 2/10/17	Wed 2/9/20	\$14.979.995,00	FPS										
24	1.1.1	CEE	Suscripción del Convenio Subsidiario MEFP/MMAYa/MPD-FPS	21 days	Wed 27/6/18	Wed 25/7/18	\$0,00	MEFP/MMAYa/MPD-FPS										
25	1.1.2	CEE	Suscripción de Convenios Intergubernativos MMAYa/FPS/Municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe y emisión de las licencias ambientales	30 days	Wed 27/6/18	Tue 7/8/18	\$0,00	MMAYa;FPS;Munucipio										
26	1.1.3	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	30 days	Wed 27/6/18	Tue 7/8/18	\$0,00	RD UCEP Mi Riego;ES BO-L1188										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
27	1.1.4	GRP	Incorporar personal para la tramitación, seguimiento y monitoreo hasta la obtención de las licencias ambientales de las obras de la muestra	88 days	Mon 2/10/17	Wed 31/1/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
28	1.1.5		LPI_1. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	496 days	Wed 8/8/18	Wed 1/7/20	\$12.399.202,00											
29	1.1.5.1		Etapas previa	13 days	Wed 8/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00											
30	1.1.5.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Wed 8/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	GT - C										
31	1.1.5.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Thu 9/8/18	Thu 9/8/18	\$0,00	GT - C										
32	1.1.5.1.3	GRP	Preparación del documento que incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	GT - C										
33	1.1.5.1.4		Solicitud de no objeción	1 day	Fri 17/8/18	Fri 17/8/18	\$0,00	GD										
34	1.1.5.1.5		No objeción	5 days	Mon 20/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	BID										
35	1.1.5.2		Etapas de Contratación	84 days	Mon 27/8/18	Thu 20/12/18	\$0,00											
36	1.1.5.2.1		Publicación	1 day	Mon 27/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	PL-D										
37	1.1.5.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Tue 28/8/18	Mon 29/10/18	\$0,00	Oferente										
38	1.1.5.2.3		Evaluación	7 days	Tue 30/10/18	Wed 7/11/18	\$0,00	PL-D										
39	1.1.5.2.4		Solicitud de NO	1 day	Thu 8/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	GD										
40	1.1.5.2.5		No objeción	5 days	Fri 9/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	BID										
41	1.1.5.2.6		Presentación de documentos legales	15 days	Fri 16/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00	Oferente										
42	1.1.5.2.7		Preparación del contrato	3 days	Fri 7/12/18	Tue 11/12/18	\$0,00	PL - D										
43	1.1.5.2.8		Solicitud de informe jurídico	1 day	Wed 12/12/18	Wed 12/12/18	\$0,00	PL - D										
44	1.1.5.2.9		Se adjudica y firma	2 days	Thu 13/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	JAF-D										
45	1.1.5.2.10		Firma del contrato	4 days	Mon 17/12/18	Thu 20/12/18	\$0,00	P;GD										
46	1.1.5.3		Ejecución del contrato	399 days	Fri 21/12/18	Wed 1/7/20	\$12.399.202,00											
47	1.1.5.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Fri 21/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	FS										
48	1.1.5.3.2		Ejecución de Obras (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PPMASA)	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$12.399.202,00	EC										
49	1.1.5.3.3		Obras de la cuenca del río Rocha ejecutadas	0 days	Wed 1/7/20	Wed 1/7/20	\$0,00											
50	1.1.6		Compensaciones sociales en las áreas de intervención	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$702.019,00	EAM-BO-L1188										
51	1.1.7		SBCC_9. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de inundación en la cuenca del río Rocha, incluye los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe	559 days	Wed 13/6/18	Mon 3/8/20	\$944.701,00											
52	1.1.7.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 13/6/18	Fri 27/7/18	\$0,00											
53	1.1.7.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 13/6/18	Thu 14/6/18	\$0,00	PL - D										
54	1.1.7.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 15/6/18	Fri 15/6/18	\$0,00	PL - D										
55	1.1.7.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0,00	GD										
56	1.1.7.1.4		No objeción	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	BID										

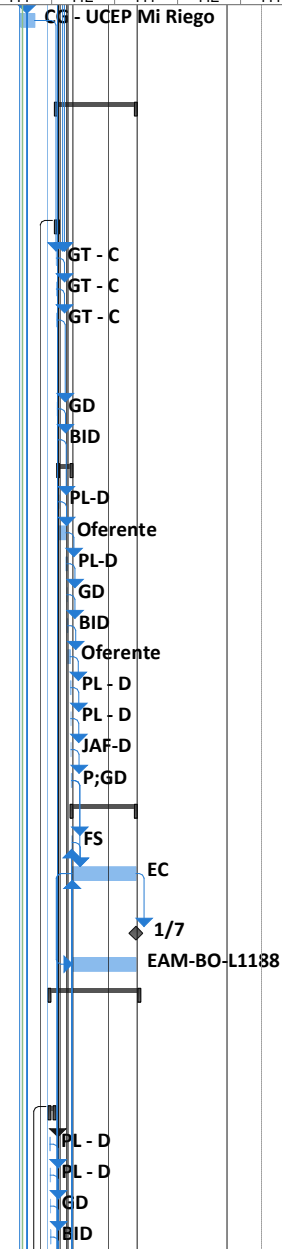


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
57	1.1.7.1.5		Publicación	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
58	1.1.7.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 21/6/18	Tue 10/7/18	\$0,00	FP				FP						
59	1.1.7.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 11/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
60	1.1.7.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 11/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
61	1.1.7.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	GD				GD						
62	1.1.7.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 23/7/18	Fri 27/7/18	\$0,00	BID				BID						
63	1.1.7.2		Etapla de contratación	83 days	Mon 30/7/18	Wed 21/11/18	\$0,00											
64	1.1.7.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 30/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
65	1.1.7.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 31/7/18	Mon 10/9/18	\$0,00	FP				FP						
66	1.1.7.2.3		Evaluación - Sobre 1	7 days	Tue 11/9/18	Wed 19/9/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
67	1.1.7.2.4		Solicitud de NO a adjudicación y confir. Contrato negociado	1 day	Thu 20/9/18	Thu 20/9/18	\$0,00	GD				GD						
68	1.1.7.2.5		No objeción	5 days	Fri 21/9/18	Thu 27/9/18	\$0,00	BID				BID						
69	1.1.7.2.6		Apertura y evaluación - Sobre 2	7 days	Fri 28/9/18	Mon 8/10/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
70	1.1.7.2.7		Negociación de contrato	4 days	Tue 9/10/18	Fri 12/10/18	\$0,00	JAF-D;FP				JAF-D;FP						
71	1.1.7.2.8		Solicitud de NO a adjudicación y confir. Contrato negociado	1 day	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0,00	GD				GD						
72	1.1.7.2.9		NO del Banco	5 days	Tue 16/10/18	Mon 22/10/18	\$0,00	BID				BID						
73	1.1.7.2.10		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 23/10/18	Mon 12/11/18	\$0,00	FP				FP						
74	1.1.7.2.11		Preparación de contrato	1 day	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
75	1.1.7.2.12		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 14/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
76	1.1.7.2.13		Se adjudica y firma	2 days	Fri 16/11/18	Mon 19/11/18	\$0,00	GD;P				GD;P						
77	1.1.7.2.14		Firma del contrato	2 days	Tue 20/11/18	Wed 21/11/18	\$0,00	P;GD				P;GD						
78	1.1.7.3		Ejecución del contrato	443 days	Thu 22/11/18	Mon 3/8/20	\$944.701,00											
79	1.1.7.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Thu 22/11/18	Mon 26/11/18	\$0,00	PT - D				PT - D						
80	1.1.7.3.2		Ejecución del contrato	440 days	Tue 27/11/18	Mon 3/8/20	\$944.701,00	FS					FS					
81	1.1.7.3.3		<i>Supervisión de Obras de la cuenca del Río Rocha realizada</i>	<i>0 days</i>	<i>Mon 3/8/20</i>	<i>Mon 3/8/20</i>	<i>\$0,00</i>						3/8					
82	1.1.8		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	440 days	Thu 27/12/18	Wed 2/9/20	\$934.073,00	FPS					FPS					
83	1.2		Producto 2: Proyectos de la muestra en la cuenca Alpacoma para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	586 days	Mon 2/10/17	Mon 30/12/19	\$652.914,00	FPS										
84	1.2.1	CEE	Suscripción del Convenio Intergubernativo MMAyA/FPS/Municipio de la cuenca del río Alpacoma y emisión de la licencia ambiental	30 days	Wed 8/8/18	Tue 18/9/18	\$0,00	MMAyA;FPS;Munucipio					MMAyA;FPS;Munucipio					
85	1.2.2	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	30 days	Wed 8/8/18	Tue 18/9/18	\$0,00	ES BO-L1188					ES BO-L1188					
86	1.2.3	GRP	Incorporar personal para la tramitación, seguimiento y monitoreo hasta la obtención de las licencias ambientales de las obras de la muestra	88 days	Mon 2/10/17	Wed 31/1/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
87	1.2.4		CP_2. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	322 days	Wed 19/9/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00											
88	1.2.4.1		Etapla previa	12 days	Wed 19/9/18	Thu 4/10/18	\$0,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
89	1.2.4.1.1	GRP	Preparación del documento; incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0,00	GT - C				GT - C						
90	1.2.4.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Wed 26/9/18	Wed 26/9/18	\$0,00	GT - C				GT - C						
91	1.2.4.1.3		Solicitud de no objeción	1 day	Thu 27/9/18	Thu 27/9/18	\$0,00	GD				GD						
92	1.2.4.1.4		No objeción	5 days	Fri 28/9/18	Thu 4/10/18	\$0,00	BID				BID						
93	1.2.4.2		Etapas de Contratación	43 days	Fri 5/10/18	Tue 4/12/18	\$0,00											
94	1.2.4.2.1		Publicación	1 day	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0,00	PL-D				PL-D						
95	1.2.4.2.2		Presentación de propuestas	15 days	Mon 8/10/18	Fri 26/10/18	\$0,00	Oferente				Oferente						
96	1.2.4.2.3		Evaluación	10 days	Mon 29/10/18	Fri 9/11/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
97	1.2.4.2.4		Adjudicación	3 days	Mon 12/11/18	Wed 14/11/18	\$0,00	PL-D				PL-D						
98	1.2.4.2.5		Presentación de documentos legales	10 days	Thu 15/11/18	Wed 28/11/18	\$0,00	Oferente				Oferente						
99	1.2.4.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Thu 29/11/18	Fri 30/11/18	\$0,00	PL-D				PL-D						
100	1.2.4.2.7		Firma del contrato	2 days	Mon 3/12/18	Tue 4/12/18	\$0,00	P;GD				P;GD						
101	1.2.4.3		Ejecución del contrato	267 days	Wed 5/12/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00											
102	1.2.4.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Wed 5/12/18	Fri 7/12/18	\$0,00	FS				FS						
103	1.2.4.3.2		Ejecución del contrato (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PPMASA)	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00	EC				EC						
104	1.2.4.3.3		<i>Obras de la cuenca de del Río Alpacoma ejecutadas</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 12/12/19</i>	<i>Thu 12/12/19</i>	<i>\$0,00</i>											
105	1.2.6		SCC_10. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma	384 days	Wed 13/6/18	Mon 2/12/19	\$43.200,00	FS										
106	1.2.6.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 13/6/18	Fri 27/7/18	\$0,00											
107	1.2.6.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 13/6/18	Thu 14/6/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
108	1.2.6.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 15/6/18	Fri 15/6/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
109	1.2.6.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0,00	GD				GD						
110	1.2.6.1.4		No objeción	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	BID				BID						
111	1.2.6.1.5		Publicación	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
112	1.2.6.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 21/6/18	Tue 10/7/18	\$0,00	FP				FP						
113	1.2.6.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 11/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
114	1.2.6.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 11/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
115	1.2.6.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	GD				GD						
116	1.2.6.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 23/7/18	Fri 27/7/18	\$0,00	BID				BID						
117	1.2.6.2		Etapas de contratación	71 days	Mon 30/7/18	Mon 5/11/18	\$0,00											
118	1.2.6.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 30/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
119	1.2.6.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 31/7/18	Mon 10/9/18	\$0,00	FP				FP						
120	1.2.6.2.3		Evaluación	14 days	Tue 11/9/18	Fri 28/9/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
121	1.2.6.2.4		Negociación de contrato	4 days	Mon 1/10/18	Thu 4/10/18	\$0,00	FP;JAF-D				FP;JAF-D						
122	1.2.6.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Fri 5/10/18	Thu 25/10/18	\$0,00	FP				FP						
123	1.2.6.2.6		Preparación de contrato	1 day	Fri 26/10/18	Fri 26/10/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
124	1.2.6.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Mon 29/10/18	Tue 30/10/18	\$0,00	PL - D				PL - D						



Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
125	1.2.6.2.8		Se adjudica y firma	2 days	Wed 31/10/18	Thu 1/11/18	\$0,00	GD;P					GD;P					
126	1.2.6.2.9		Firma del contrato	2 days	Fri 2/11/18	Mon 5/11/18	\$0,00	GD;P					GD;P					
127	1.2.6.3		Ejecución del contrato	280 days	Tue 6/11/18	Mon 2/12/19	\$43.200,00											
128	1.2.6.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Tue 6/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	PT - D					PT - D					
129	1.2.6.3.2		Ejecución del contrato	277 days	Fri 9/11/18	Mon 2/12/19	\$43.200,00	FS					FS					
130	1.2.6.3.3		Supervisión de Obras de la cuenca del Río Alpacoma realizada	0 days	Mon 2/12/19	Mon 2/12/19	\$0,00						2/12					
131	1.2.7		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	275 days	Tue 11/12/18	Mon 30/12/19	\$42.714,00	FPS					FPS					
132	1.3		Producto 3: Evaluaciones de riesgos probabilísticos y diseños ejecutivos por zonas de intervención, elaborados	704 days	Mon 6/11/17	Thu 16/7/20	\$1.960.000,00	UCEP - Mi Riego										
133	1.3.1		LPCPI-SN_11. Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos de riesgos climáticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación - 1° Grupo	268 days	Mon 6/11/17	Wed 14/11/18	\$370.000,00											
134	1.3.1.1		Etapla previa	7 days	Mon 6/11/17	Tue 14/11/17	\$0,00											
135	1.3.1.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Mon 6/11/17	Mon 6/11/17	\$0,00	RT Designado					RT Designado					
136	1.3.1.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Tue 7/11/17	Tue 7/11/17	\$0,00	RT Designado					RT Designado					
137	1.3.1.1.3		Preparación del documento	5 days	Wed 8/11/17	Tue 14/11/17	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
138	1.3.1.2		Etapla de Contratación	78 days	Wed 15/11/17	Fri 2/3/18	\$0,00											
139	1.3.1.2.1		Publicación	1 day	Wed 15/11/17	Wed 15/11/17	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
140	1.3.1.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Thu 16/11/17	Wed 17/1/18	\$0,00	Oferente					Oferente					
141	1.3.1.2.3		Evaluación	7 days	Thu 18/1/18	Fri 26/1/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
142	1.3.1.2.4		Presentación de documentos legales	15 days	Mon 29/1/18	Fri 16/2/18	\$0,00	Oferente					Oferente					
143	1.3.1.2.5		Preparación del contrato	3 days	Mon 19/2/18	Wed 21/2/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
144	1.3.1.2.6		Solicitud de informe jurídico	1 day	Thu 22/2/18	Thu 22/2/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
145	1.3.1.2.7		Se adjudica y firma	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
146	1.3.1.2.8		Firma del contrato	4 days	Tue 27/2/18	Fri 2/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;P					CG - UCEP Mi Riego;P					
147	1.3.1.3		Ejecución del contrato	183 days	Mon 5/3/18	Wed 14/11/18	\$370.000,00											
148	1.3.1.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Mon 5/3/18	Wed 7/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
149	1.3.1.3.2		Ejecución del contrato	180 days	Thu 8/3/18	Wed 14/11/18	\$370.000,00	FC					FC					
150	1.3.1.3.3		Evaluaciones de Riesgos probabilísticos del 1° Grupo realizadas	0 days	Wed 14/11/18	Wed 14/11/18	\$0,00						14/11					
151	1.3.2		LPCPI-SN_12. Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos de riesgos climáticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación - 2° Grupo	268 days	Tue 22/5/18	Thu 30/5/19	\$370.000,00											
152	1.3.2.1		Etapla previa	7 days	Tue 22/5/18	Wed 30/5/18	\$0,00											
153	1.3.2.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Tue 22/5/18	Tue 22/5/18	\$0,00	RT Designado					RT Designado					
154	1.3.2.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Wed 23/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	RT Designado					RT Designado					
155	1.3.2.1.3		Preparación del documento	5 days	Thu 24/5/18	Wed 30/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
156	1.3.2.2		Etapla de Contratación	78 days	Thu 31/5/18	Mon 17/9/18	\$0,00											
157	1.3.2.2.1		Publicación	1 day	Thu 31/5/18	Thu 31/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
158	1.3.2.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Fri 1/6/18	Thu 2/8/18	\$0,00	Oferente					Oferente					
159	1.3.2.2.3		Evaluación	7 days	Fri 3/8/18	Mon 13/8/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego					EA UCEP Mi Riego					
160	1.3.2.2.4		Presentación de documentos legales	15 days	Tue 14/8/18	Mon 3/9/18	\$0,00	Oferente					Oferente					

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
161	1.3.2.2.5		Preparación del contrato	3 days	Tue 4/9/18	Thu 6/9/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
162	1.3.2.2.6		Solicitud de informe jurídico	1 day	Fri 7/9/18	Fri 7/9/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
163	1.3.2.2.7		Se adjudica y firma	2 days	Mon 10/9/18	Tue 11/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
164	1.3.2.2.8		Firma del contrato	4 days	Wed 12/9/18	Mon 17/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;P										
165	1.3.2.3		Ejecución del contrato	183 days	Tue 18/9/18	Thu 30/5/19	\$370.000,00											
166	1.3.2.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Tue 18/9/18	Thu 20/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
167	1.3.2.3.2		Ejecución del contrato	180 days	Fri 21/9/18	Thu 30/5/19	\$370.000,00	FC										
168	1.3.2.3.3		Evaluaciones de Riesgos probabilísticos del 2° Grupo realizadas	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0,00											
169	1.3.3		SBCC_13. Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	251 days	Fri 21/12/18	Fri 6/12/19	\$610.000,00											
170	1.3.3.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 21/12/18	Tue 5/2/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
171	1.3.3.2		Etapa de contratación	83 days	Wed 6/2/19	Fri 31/5/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
172	1.3.3.3		Ejecución del contrato	135 days	Mon 3/6/19	Fri 6/12/19	\$610.000,00											
173	1.3.3.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Mon 3/6/19	Wed 5/6/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
174	1.3.3.3.2		Ejecución del contrato	132 days	Thu 6/6/19	Fri 6/12/19	\$610.000,00	FC										
175	1.3.3.3.3		Diseños ejecutivos de Obras del 1° Grupo elaborados	0 days	Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0,00											
176	1.3.4		SBCC_14. Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 2° Grupo	251 days	Thu 1/8/19	Thu 16/7/20	\$610.000,00											
177	1.3.4.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Thu 1/8/19	Mon 16/9/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
178	1.3.4.2		Etapa de contratación	83 days	Tue 17/9/19	Thu 9/1/20	\$0,00	EA - BO-L1188										
179	1.3.4.3		Ejecución del contrato	135 days	Fri 10/1/20	Thu 16/7/20	\$610.000,00											
180	1.3.4.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Fri 10/1/20	Tue 14/1/20	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
181	1.3.4.3.2		Ejecución del contrato	132 days	Wed 15/1/20	Thu 16/7/20	\$610.000,00	FC										
182	1.3.4.3.3		Diseños ejecutivos de Obras del 2° Grupo elaborados	0 days	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0,00											
183	1.4		Producto 4: Otros proyectos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático a nivel municipal, ejecutados	875 days	Mon 9/12/19	Fri 14/4/23	\$17.619.313,00	FPS										
184	1.4.1		Proyectos del 1° Grupo	532 days	Mon 9/12/19	Tue 21/12/21	\$8.809.656,00											
185	1.4.1.1	CEE	Suscripción del Convenio Intergubernativo MMAyA/FPS/Municipios de la zona de intervención del proyecto y emisión de la licencia ambiental	15 days	Mon 9/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	MMAyA;FPS;Munucipio										
186	1.4.1.2	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	15 days	Mon 9/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	ES BO-L1188										
187	1.4.1.3		LPI_3. Contratación de firma para construcción de obras de prevención de riesgos de inundación o deslizamiento terrestre - 1° Grupo	496 days	Mon 30/12/19	Mon 22/11/21	\$7.465.208,00											
188	1.4.1.3.1	GRP	Etapa previa: preparación del documento que incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	13 days	Mon 30/12/19	Wed 15/1/20	\$0,00	GT - C										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188


ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
189	1.4.1.3.2		Etapas de Contratación	84 days	Thu 16/1/20	Tue 12/5/20	\$0,00	PL - D					PL - D					
190	1.4.1.3.3		Ejecución del contrato	399 days	Wed 13/5/20	Mon 22/11/21	\$7.465.208,00						FS					
191	1.4.1.3.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Wed 13/5/20	Fri 15/5/20	\$0,00	FS					FS					
192	1.4.1.3.3.2		Ejecución del contrato (incluye obras y actividades de mitigación del MGAS y PPMPASA)	396 days	Mon 18/5/20	Mon 22/11/21	\$7.465.208,00	EC					EC					
193	1.4.1.3.3.3		Obras de prevención de riesgos de inundación o deslizamineto terrestre - 1° Grupo realizada	0 days	Mon 22/11/21	Mon 22/11/21	\$0,00						22/11					
194	1.4.1.4		Compensaciones sociales en las áreas de intervención	396 days	Mon 18/5/20	Mon 22/11/21	\$213.292,00	EAM-BO-L1188					EAM-BO-L1188					
195	1.4.1.5		SBCC_15. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	532 days	Mon 9/12/19	Tue 21/12/21	\$568.778,00											
196	1.4.1.5.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Mon 9/12/19	Wed 22/1/20	\$0,00	PL - D					PL - D					
197	1.4.1.5.2		Etapas de contratación	83 days	Thu 23/1/20	Mon 18/5/20	\$0,00	PL - D					PL - D					
198	1.4.1.5.3		Ejecución del contrato	416 days	Tue 19/5/20	Tue 21/12/21	\$568.778,00											
199	1.4.1.5.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Tue 19/5/20	Thu 21/5/20	\$0,00	PT - D					PT - D					
200	1.4.1.5.3.2		Ejecución del contrato	413 days	Fri 22/5/20	Tue 21/12/21	\$568.778,00	FS					FS					
201	1.4.1.5.3.3		Producto entregado	0 days	Tue 21/12/21	Tue 21/12/21	\$0,00						21/12					
202	1.4.1.6		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	391 days	Tue 23/6/20	Tue 21/12/21	\$562.378,00	FPS					FPS					
203	1.4.2		Proyectos del 2° Grupo	716 days	Fri 17/7/20	Fri 14/4/23	\$8.809.657,00											
204	1.4.2.1	CEE	Suscripción del Convenio Intergubernativo MMAyA/FPS/Municipios de la zona de intervención del proyecto y emisión de la licencia ambiental	15 days	Thu 27/8/20	Wed 16/9/20	\$0,00	MMAyA;FPS;Munucipio					MMAyA;FPS;Munucipio					
205	1.4.2.2	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	15 days	Thu 27/8/20	Wed 16/9/20	\$0,00	ES BO-L1188					ES BO-L1188					
206	1.4.2.3		LPI_4. Contratación de firma para construcción de obras de prevención de riesgos de inundación o deslizamiento terrestre - 2° Grupo	628 days	Thu 17/9/20	Mon 13/2/23	\$7.465.208,00											
207	1.4.2.3.1	GRP	Etapas previa: preparación del documento que incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	13 days	Thu 17/9/20	Mon 5/10/20	\$0,00	GT - C					GT - C					
208	1.4.2.3.2		Etapas de Contratación	84 days	Tue 6/10/20	Fri 29/1/21	\$0,00	PL - D					PL - D					
209	1.4.2.3.3		Ejecución del contrato	531 days	Mon 1/2/21	Mon 13/2/23	\$7.465.208,00											
210	1.4.2.3.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Mon 1/2/21	Wed 3/2/21	\$0,00	FS					FS					
211	1.4.2.3.3.2		Ejecución del contrato (incluye obras y actividades de mitigación del MGAS y PPMPASA)	528 days	Thu 4/2/21	Mon 13/2/23	\$7.465.208,00	EC					EC					
212	1.4.2.3.3.3		Obras de prevención de riesgos de inundación o deslizamineto terrestre - 2° Grupo realizada	0 days	Mon 13/2/23	Mon 13/2/23	\$0,00						13/2					
213	1.4.2.4		Compensaciones sociales en las áreas de intervención	528 days	Thu 4/2/21	Mon 13/2/23	\$213.292,00	EAM-BO-L1188					EAM-BO-L1188					
214	1.4.2.5		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos climáticos - 2° Grupo	694 days	Fri 17/7/20	Wed 15/3/23	\$568.778,00											
215	1.4.2.5.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 17/7/20	Tue 1/9/20	\$0,00	PL - D					PL - D					

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014	H1	H2	2017	H1	H2	2020	H1	H2	2023	H1	H2	2026	H1	H2
216	1.4.2.5.2		Etapla de contratación	83 days	Wed 2/9/20	Fri 25/12/20	\$0,00	PL - D															
217	1.4.2.5.3		Ejecución del contrato	578 days	Mon 28/12/20	Wed 15/3/23	\$568.778,00																
218	1.4.2.5.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Mon 28/12/20	Wed 30/12/20	\$0,00	PT - D															
219	1.4.2.5.3.2		Ejecución del contrato	575 days	Thu 31/12/20	Wed 15/3/23	\$568.778,00	FS															
220	1.4.2.5.3.4		Producto entregado	0 days	Wed 15/3/23	Wed 15/3/23	\$0,00																
221	1.4.2.6		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	575 days	Mon 1/2/21	Fri 14/4/23	\$562.379,00	FPS															
222	1.5		Producto 5: Protocolos para el mantenimiento de obras de mitigación de riesgos climáticos, por municipio, elaborados y socializados	1119 days	Mon 10/12/18	Thu 23/3/23	\$160.500,00	FPS															
223	1.5.1	GRP	LPI_1. Elaboración de protocolos para mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Rocha	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00																
224	1.5.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00																
225	1.5.1.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00	EC															
226	1.5.1.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del Río Rocha elaborados	0 days	Mon 30/12/19	Mon 30/12/19	\$0,00																
227	1.5.2	GRP	CP_2. Elaboración de los protocolos de mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Alpacoma	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00																
228	1.5.2.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00																
229	1.5.2.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00	EC															
230	1.5.2.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del Río Alpacoma elaborados	0 days	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	\$0,00																
231	1.5.3	GRP	LPI_3. Elaboración de los protocolos de mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - 1° Grupo	396 days	Mon 18/5/20	Mon 22/11/21	\$50.000,00																
232	1.5.3.1		Ejecución del contrato	396 days	Mon 18/5/20	Mon 22/11/21	\$50.000,00																
233	1.5.3.1.1		Ejecución del contrato	396 days	Mon 18/5/20	Mon 22/11/21	\$50.000,00	EC															
234	1.5.3.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del 1° Grupo elaborados	0 days	Mon 22/11/21	Mon 22/11/21	\$0,00																
235	1.5.4	GRP	LPI_4. Elaboración de los protocolos de mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - 2° Grupo	528 days	Thu 4/2/21	Mon 13/2/23	\$50.000,00																
236	1.5.4.1		Ejecución del contrato	528 days	Thu 4/2/21	Mon 13/2/23	\$50.000,00																
237	1.5.4.1.1		Ejecución del contrato	528 days	Thu 4/2/21	Mon 13/2/23	\$50.000,00	EC															
238	1.5.4.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del 2° Grupo elaborados	0 days	Mon 13/2/23	Mon 13/2/23	\$0,00																
239	1.5.5		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	1085 days	Fri 25/1/19	Thu 23/3/23	\$10.500,00	FPS															
240	1.6		Producto 6: Actividades de concientización ambiental dirigidas a la población, a nivel de zona de intervención, realizadas	1173 days	Wed 2/1/19	Fri 30/6/23	\$352.478,00	UCEP - Mi Riego															
241	1.6.1		CCIN_23. Contratación de un Especialista comunicacional para la elaboración del diseño del Plan Comunicacional del Programa e implementación	1173 days	Wed 2/1/19	Fri 30/6/23	\$52.478,00																
242	1.6.1.1		Etapla Previa	12 days	Wed 2/1/19	Thu 17/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188															
243	1.6.1.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 18/1/19	Wed 20/2/19	\$0,00	EA - BO-L1188															
244	1.6.1.3		Ejecución del contrato	1137 days	Thu 21/2/19	Fri 30/6/23	\$52.478,00																


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014	2017	2020	2023	2026	
									H1	H2	H1	H2	H1	H2
245	1.6.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 21/2/19	Mon 25/2/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego						
246	1.6.1.3.2		Elaboración del Diseño del Plan Comunicacional del Programa	88 days	Tue 26/2/19	Thu 27/6/19	\$7.000,00	CI						
247	1.6.1.3.3		Diseño del Plan Comunicacional elaborado	0 days	Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0,00							
248	1.6.1.3.4		Acompañamiento en la implementación del Plan Comunicacional	1046 days	Fri 28/6/19	Fri 30/6/23	\$45.478,00	CI						
249	1.6.2		LPN_7. Contratación de firma para implementación del Plan Comunicacional - Año 3 y 4	673 days	Fri 28/6/19	Tue 25/1/22	\$90.000,00							
250	1.6.2.1		Etapla previa	13 days	Fri 28/6/19	Tue 16/7/19	\$0,00	EA - BO-L1188						
251	1.6.2.2		Etapla de contratación	59 days	Wed 17/7/19	Mon 7/10/19	\$0,00	EA - BO-L1188						
252	1.6.2.3		Ejecución del contrato	601 days	Tue 8/10/19	Tue 25/1/22	\$90.000,00							
253	1.6.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Tue 8/10/19	Thu 10/10/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego						
254	1.6.2.3.2		Ejecución del contrato	598 days	Fri 11/10/19	Tue 25/1/22	\$90.000,00	P						
255	1.6.2.3.3		Plan Comunicacional Año 3 y 4 implementado	0 days	Tue 25/1/22	Tue 25/1/22	\$0,00							
256	1.6.3		LPI_8. Contratación de firma para implementación del Plan Comunicacional - Año 5 y 6 (I Semestre)	449 days	Fri 10/9/21	Wed 31/5/23	\$210.000,00							
257	1.6.3.1		Etapla previa	13 days	Fri 10/9/21	Tue 28/9/21	\$0,00	EA - BO-L1188						
258	1.6.3.2		Etapla de contratación	84 days	Wed 29/9/21	Mon 24/1/22	\$0,00	EA - BO-L1188						
259	1.6.3.3		Ejecución del contrato	352 days	Tue 25/1/22	Wed 31/5/23	\$210.000,00							
260	1.6.3.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Tue 25/1/22	Thu 27/1/22	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego						
261	1.6.3.3.2		Ejecución del contrato	349 days	Fri 28/1/22	Wed 31/5/23	\$210.000,00	P						
262	1.6.3.3.3		Plan Comunicacional Año 5 y 6 (I Semestre) implementado	0 days	Wed 31/5/23	Wed 31/5/23	\$0,00							
263	1.7		Producto 7: Sistemas de alerta temprana hidrológica, a nivel de zona de intervención, diseñados y operando	773 days	Wed 15/7/20	Fri 30/6/23	\$1.200.000,00	UCEP - Mi Riego						
264	1.7.1		Coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)	132 days	Wed 15/7/20	Thu 14/1/21	\$0,00	UCEP - Mi Riego;SENAMHI						
265	1.7.2		SBCC_17. Contratación de ONG/Universidad para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana en zonas de intervención del Programa y conexos	641 days	Fri 15/1/21	Fri 30/6/23	\$1.200.000,00							
266	1.7.2.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 15/1/21	Tue 2/3/21	\$0,00	EA - BO-L1188						
267	1.7.2.2		Etapla de contratación	83 days	Wed 3/3/21	Fri 25/6/21	\$0,00	EA - BO-L1188						
268	1.7.2.3		Ejecución del contrato	525 days	Mon 28/6/21	Fri 30/6/23	\$1.200.000,00							
269	1.7.2.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Mon 28/6/21	Wed 30/6/21	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego						
270	1.7.2.3.2	GRP	Ejecución del contrato: diseño del sistema y capacitación a las comunidades sobre GRD	522 days	Thu 1/7/21	Fri 30/6/23	\$1.200.000,00	FC						
271	1.7.2.3.3		Sistema de Alerta Temprana implementado	0 days	Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0,00							
272	2		Componente II: Gestión del Conocimiento sobre Riesgos Climáticos	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$687.200,00							
273	2.1		Producto 8: Total de personal técnico del gobierno central y ETAs capacitados en análisis de riesgos y vulnerabilidad climáticos	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$72.000,00	UCEP - Mi Riego						

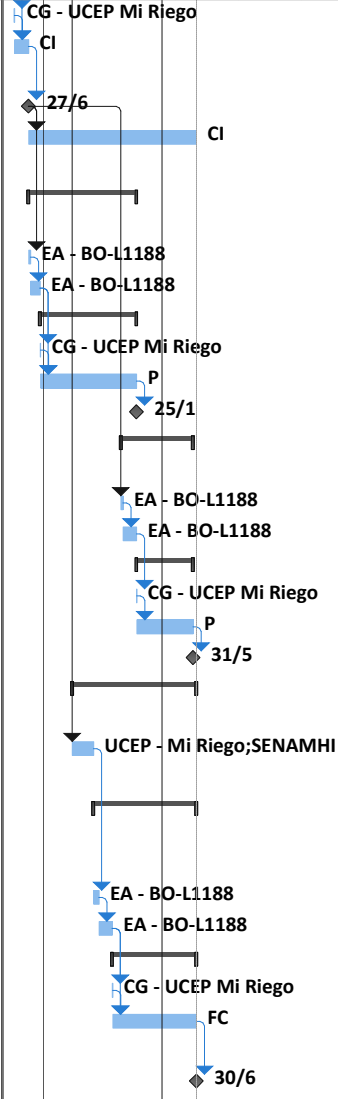

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
274	2.1.1		CCIN_24. Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal técnico del gobierno central y gobiernos sub-nacionales	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$72.000,00											
275	2.1.1.1		Etapla Previa	12 days	Wed 21/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00											
276	2.1.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Wed 21/11/18	Tue 27/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
277	2.1.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Wed 28/11/18	Wed 28/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
278	2.1.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
279	2.1.1.1.4		NO del Banco	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00	BD										
280	2.1.1.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 7/12/18	Wed 9/1/19	\$0,00											
281	2.1.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Fri 7/12/18	Fri 7/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
282	2.1.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Mon 10/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	CI										
283	2.1.1.2.3		Evaluación	7 days	Mon 17/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
284	2.1.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Wed 26/12/18	Thu 27/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
285	2.1.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Fri 28/12/18	Thu 3/1/19	\$0,00	CI										
286	2.1.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
287	2.1.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Tue 8/1/19	Wed 9/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
288	2.1.1.3		Ejecución del contrato	1037 days	Thu 10/1/19	Fri 30/12/22	\$72.000,00											
289	2.1.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 10/1/19	Mon 14/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
290	2.1.1.3.2		Ejecución del contrato	1034 days	Tue 15/1/19	Fri 30/12/22	\$72.000,00	CI										
291	2.1.1.3.3		Personal técnico del gobierno central y gobiernos sub-nacionales capacitados en riesgos climáticos	0 days	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22	\$0,00											
292	2.2		Producto 9: Plan de Acción del Componente de Riesgos Hidrológicos y Cambios Climáticos del Plan Nacional de Cuencas, elaborado	563 days	Tue 5/11/19	Thu 30/12/21	\$76.000,00	UCEP - Mi Riego										
293	2.2.1		CCIN_25. Contratación de Experto para la elaboración del diseño del Plan de Acción de Gestión de Riesgos Hidrológicos	563 days	Tue 5/11/19	Thu 30/12/21	\$76.000,00											
294	2.2.1.1		Etapla Previa	12 days	Tue 5/11/19	Wed 20/11/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
295	2.2.1.2		Etapla de contratación	24 days	Thu 21/11/19	Tue 24/12/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
296	2.2.1.3		Ejecución del contrato	527 days	Wed 25/12/19	Thu 30/12/21	\$76.000,00											
297	2.2.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Wed 25/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
298	2.2.1.3.2		Ejecución del contrato	264 days	Mon 30/12/19	Thu 31/12/20	\$36.000,00	CI										
299	2.2.1.3.3		Plan de Acción de Gestión de Riesgos Hidrológicos diseñado	0 days	Thu 31/12/20	Thu 31/12/20	\$0,00											
300	2.2.1.3.4		Realización de talleres para implementar el Plan de Acción de Gestión en Riesgos Hidrológicos	260 days	Fri 1/1/21	Thu 30/12/21	\$40.000,00	CI										
301	2.2.1.3.5		Talleres para la implementación del Plan de Acción realizado	0 days	Thu 30/12/21	Thu 30/12/21	\$0,00											
302	2.3		Producto 10: Unidad de Gestión de Riesgos Hidrológicos, Proyectos y Temas Estratégicos fortalecida	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$237.200,00	UCEP - Mi Riego										
303	2.3.1		CCIN_26. Contratación de un Especialista en Gestión de Riesgos Hidrológicos y Cambio Climático	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$168.000,00											
304	2.3.1.1		Etapla Previa	12 days	Wed 13/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00											
305	2.3.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Wed 13/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
306	2.3.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										

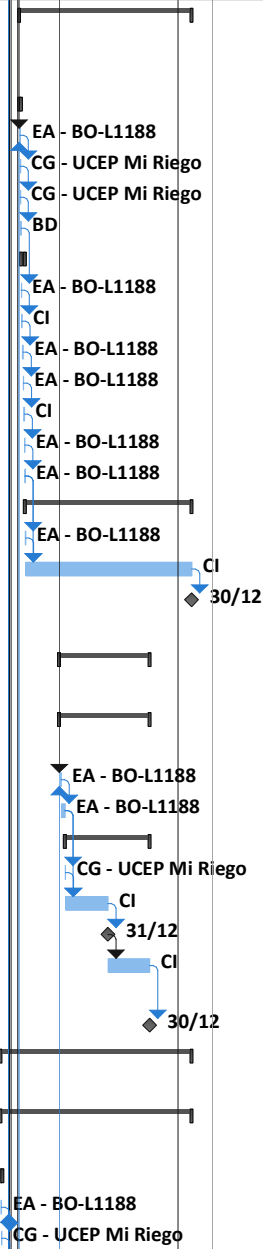

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188


ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
307	2.3.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Thu 21/6/18	Thu 21/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
308	2.3.1.1.4		NO del Banco	5 days	Fri 22/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	BD										
309	2.3.1.2		Etap ­ a de contrataci ­ on	24 days	Fri 29/6/18	Wed 1/8/18	\$0,00											
310	2.3.1.2.1		Publicaci ­ on o invitaci ­ on	1 day	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
311	2.3.1.2.2		Presentaci ­ on de propuestas	5 days	Mon 2/7/18	Fri 6/7/18	\$0,00	CI										
312	2.3.1.2.3		Evaluaci ­ on	7 days	Mon 9/7/18	Tue 17/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
313	2.3.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Wed 18/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
314	2.3.1.2.5		Presentaci ­ on de documentos legales	5 days	Fri 20/7/18	Thu 26/7/18	\$0,00	CI										
315	2.3.1.2.6		Preparaci ­ on del contrato e informe jur ­ idico	2 days	Fri 27/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
316	2.3.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Tue 31/7/18	Wed 1/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
317	2.3.1.3		Ejecuci ­ on del contrato	1152 days	Thu 2/8/18	Fri 30/12/22	\$168.000,00											
318	2.3.1.3.1		Emisi ­ on de la Orden de Inicio	3 days	Thu 2/8/18	Mon 6/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
319	2.3.1.3.2		Ejecuci ­ on del contrato	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$168.000,00	CI										
320	2.3.2		CP_5. Adquisici ­ on de equipamiento y mobiliario para la UCEP Mi Riego	102 days	Wed 13/6/18	Thu 1/11/18	\$19.200,00											
321	2.3.2.1		Etap ­ a previa	12 days	Wed 13/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00											
322	2.3.2.1.1		Preparaci ­ on Esp. T ­ ecnicas	5 days	Wed 13/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
323	2.3.2.1.2		Recepci ­ on de informaci ­ on T ­ ecnica	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
324	2.3.2.1.3		Solicitud de no objecci ­ on	1 day	Thu 21/6/18	Thu 21/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
325	2.3.2.1.4		No objecci ­ on	5 days	Fri 22/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	BID										
326	2.3.2.2		Etap ­ a de Contrataci ­ on	43 days	Fri 29/6/18	Tue 28/8/18	\$0,00											
327	2.3.2.2.1		Publicaci ­ on	1 day	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
328	2.3.2.2.2		Presentaci ­ on de propuestas	15 days	Mon 2/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	Oferente										
329	2.3.2.2.3		Evaluaci ­ on	10 days	Mon 23/7/18	Fri 3/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
330	2.3.2.2.4		Adjudicaci ­ on	3 days	Mon 6/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
331	2.3.2.2.5		Presentaci ­ on de documentos legales	10 days	Thu 9/8/18	Wed 22/8/18	\$0,00	Oferente										
332	2.3.2.2.6		Preparaci ­ on del contrato e informe jur ­ idico	2 days	Thu 23/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
333	2.3.2.2.7		Firma del contrato	2 days	Mon 27/8/18	Tue 28/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
334	2.3.2.3		Ejecuci ­ on del contrato	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$19.200,00											
335	2.3.2.3.1		Emisi ­ on de la orden de proceder o de incio	3 days	Wed 29/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
336	2.3.2.3.2		Provisi ­ on de equipamiento	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$12.000,00	P										
337	2.3.2.3.3		Provisi ­ on de mobiliario	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$7.200,00	P										
338	2.3.2.3.4		Equipamiento y mobiliario para la UCEP - Mi Riego adquiridos	0 days	Thu 1/11/18	Thu 1/11/18	\$0,00											
339	2.3.3		Gastos operativos	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$50.000,00											
340	2.4		Producto 11: Total de personal t ­ ecnico de ETAs capacitados en la integraci ­ on del enfoque de GRD y ACC en los PTDIs y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$72.000,00	UCEP - Mi Riego										
341	2.4.1		CCIN_ 27. Contrataci ­ on de Especialista en Riesgos Clim ­ aticos para capacitar al personal de las ETAs en el enfoque de GRD y CC para su incorporaci ­ on en los PTDIs y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$72.000,00											
342	2.4.1.1		Etap ­ a Previa	12 days	Thu 8/11/18	Fri 23/11/18	\$0,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
343	2.4.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 8/11/18	Wed 14/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
344	2.4.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Thu 15/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
345	2.4.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 16/11/18	Fri 16/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
346	2.4.1.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 19/11/18	Fri 23/11/18	\$0,00	BID										
347	2.4.1.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 26/11/18	Thu 27/12/18	\$0,00											
348	2.4.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 26/11/18	Mon 26/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
349	2.4.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 27/11/18	Mon 3/12/18	\$0,00	CI										
350	2.4.1.2.3		Evaluación	7 days	Tue 4/12/18	Wed 12/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
351	2.4.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 13/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
352	2.4.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 17/12/18	Fri 21/12/18	\$0,00	CI										
353	2.4.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 24/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
354	2.4.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 26/12/18	Thu 27/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
355	2.4.1.3		Ejecución del contrato	1046 days	Fri 28/12/18	Fri 30/12/22	\$72.000,00											
356	2.4.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 28/12/18	Tue 1/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
357	2.4.1.3.2		Ejecución del contrato	1043 days	Wed 2/1/19	Fri 30/12/22	\$72.000,00	CI										
358	2.4.1.3.3		Personal de las ETAs capacitados en el enfoque de GRD y CC para su incorporación en los PTDIs y POAs	0 days	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22	\$0,00											
359	2.5		Producto 12: Estudio de la caracterización de la población originaria, indígena y multicultural y su exposición al riesgo, realizado	1156 days	Fri 27/7/18	Fri 30/12/22	\$200.000,00	UCEP - Mi Riego										
360	2.5.1		SCC_18. Contratación de firma para la Elaboración del estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo, Fase I situación previa del proyecto	241 days	Fri 27/7/18	Fri 28/6/19	\$100.000,00											
361	2.5.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 27/7/18	Tue 11/9/18	\$0,00											
362	2.5.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Fri 27/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
363	2.5.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
364	2.5.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Wed 1/8/18	Wed 1/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
365	2.5.1.1.4		No objeción	1 day	Thu 2/8/18	Thu 2/8/18	\$0,00	BID										
366	2.5.1.1.5		Publicación	1 day	Fri 3/8/18	Fri 3/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
367	2.5.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Mon 6/8/18	Thu 23/8/18	\$0,00	FP										
368	2.5.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Fri 24/8/18	Thu 6/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
369	2.5.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Fri 24/8/18	Mon 3/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
370	2.5.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Tue 4/9/18	Tue 4/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
371	2.5.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Wed 5/9/18	Tue 11/9/18	\$0,00	BID										
372	2.5.1.2		Etapas de contratación	71 days	Wed 12/9/18	Wed 19/12/18	\$0,00											
373	2.5.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Wed 12/9/18	Wed 12/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
374	2.5.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Thu 13/9/18	Wed 24/10/18	\$0,00	FP										
375	2.5.1.2.3		Evaluación	14 days	Thu 25/10/18	Tue 13/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
376	2.5.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Wed 14/11/18	Mon 19/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
377	2.5.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 20/11/18	Mon 10/12/18	\$0,00	FP										
378	2.5.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Tue 11/12/18	Tue 11/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
379	2.5.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 12/12/18	Thu 13/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
380	2.5.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Fri 14/12/18	Mon 17/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
381	2.5.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Tue 18/12/18	Wed 19/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
382	2.5.1.3		Ejecución del contrato	137 days	Thu 20/12/18	Fri 28/6/19	\$100.000,00											
383	2.5.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 20/12/18	Mon 24/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
384	2.5.1.3.2		Ejecución del contrato	124 days	Tue 8/1/19	Fri 28/6/19	\$100.000,00	FC										
385	2.5.1.3.3		Estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo (situación previa del proyecto) realizado	0 days	Fri 28/6/19	Fri 28/6/19	\$0,00											
386	2.5.2		SCC_19. Contratación de firma para la Elaboración del estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo, Fase II final del proyecto	232 days	Thu 10/2/22	Fri 30/12/22	\$100.000,00											
387	2.5.2.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Thu 10/2/22	Mon 28/3/22	\$0,00	EA - BO-L1188										
388	2.5.2.2		Etapas de contratación	71 days	Tue 29/3/22	Tue 5/7/22	\$0,00	EA - BO-L1188										
389	2.5.2.3		Ejecución del contrato	128 days	Wed 6/7/22	Fri 30/12/22	\$100.000,00											
390	2.5.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Wed 6/7/22	Fri 8/7/22	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
391	2.5.2.3.2		Ejecución del contrato	125 days	Mon 11/7/22	Fri 30/12/22	\$100.000,00	FC										
392	2.5.2.3.3		Estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo al final del proyecto realizado	0 days	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22	\$0,00											
393	2.6		Producto 13: Informe de sistematización de experiencias del Programa, realizado	215 days	Mon 5/9/22	Fri 30/6/23	\$30.000,00	UCEP - Mi Riego										
394	2.6.1		CCIN_28. Contratación de consultor para la elaboración de estudios para la sistematización de experiencias del Programa	215 days	Mon 5/9/22	Fri 30/6/23	\$30.000,00											
395	2.6.1.1		Etapas Previas	12 days	Mon 5/9/22	Tue 20/9/22	\$0,00	EA - BO-L1188										
396	2.6.1.2		Etapas de contratación	24 days	Wed 21/9/22	Mon 24/10/22	\$0,00	EA - BO-L1188										
397	2.6.1.3		Ejecución del contrato	179 days	Tue 25/10/22	Fri 30/6/23	\$30.000,00											
398	2.6.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Tue 25/10/22	Thu 27/10/22	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
399	2.6.1.3.2		Ejecución del contrato	176 days	Fri 28/10/22	Fri 30/6/23	\$30.000,00	CI										
400	2.6.1.3.3		Estudios para la sistematización de experiencias del Programa elaborados	0 days	Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0,00											
401	3		Administración, Auditoría y Evaluación	1406 days	Fri 9/2/18	Fri 30/6/23	\$2.387.600,00	UCEP - Mi Riego										
402	3.1		Administración del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$1.787.600,00	UCEP - Mi Riego										
403	3.1.1		Equipo Técnico del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$1.290.000,00	UCEP - Mi Riego										
404	3.1.1.1	CEE	CCIN_29. Contratación de Responsable Técnico en Riesgos Climáticos BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$180.000,00											
405	3.1.1.1.1		Etapas Previas	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
406	3.1.1.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
407	3.1.1.1.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
408	3.1.1.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										

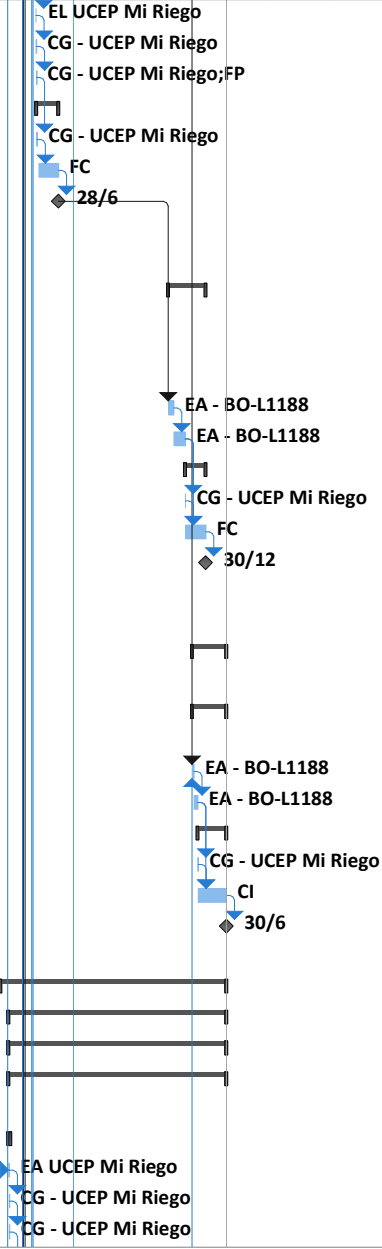

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
409	3.1.1.1.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
410	3.1.1.1.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
411	3.1.1.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
412	3.1.1.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
413	3.1.1.1.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
414	3.1.1.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
415	3.1.1.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
416	3.1.1.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
417	3.1.1.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
418	3.1.1.1.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$180.000,00											
419	3.1.1.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
420	3.1.1.1.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$180.000,00	CI										
421	3.1.1.2	GRP	CCIN_30. Contratación de Especialista de Adquisiciones BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
422	3.1.1.2.1		Etapas Previas	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
423	3.1.1.2.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
424	3.1.1.2.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
425	3.1.1.2.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
426	3.1.1.2.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
427	3.1.1.2.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
428	3.1.1.2.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
429	3.1.1.2.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
430	3.1.1.2.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
431	3.1.1.2.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
432	3.1.1.2.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
433	3.1.1.2.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
434	3.1.1.2.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
435	3.1.1.2.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
436	3.1.1.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
437	3.1.1.2.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										
438	3.1.1.3	GRP	CCIN_31. Contratación de Especialista Financiero BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
439	3.1.1.3.1		Etapas Previas	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
440	3.1.1.3.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
441	3.1.1.3.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
442	3.1.1.3.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
443	3.1.1.3.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
444	3.1.1.3.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
445	3.1.1.3.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
446	3.1.1.3.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
447	3.1.1.3.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
448	3.1.1.3.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
449	3.1.1.3.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
450	3.1.1.3.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
451	3.1.1.3.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
452	3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
453	3.1.1.3.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
454	3.1.1.3.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										
455	3.1.1.1.4		CCIN_32. Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
456	3.1.1.1.4.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
457	3.1.1.4.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
458	3.1.1.4.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
459	3.1.1.4.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
460	3.1.1.4.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
461	3.1.1.4.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
462	3.1.1.4.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
463	3.1.1.4.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
464	3.1.1.4.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
465	3.1.1.4.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
466	3.1.1.4.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
467	3.1.1.4.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
468	3.1.1.4.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
469	3.1.1.4.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
470	3.1.1.4.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
471	3.1.1.4.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										
472	3.1.1.1.5		CCIN_33. Contratación de Enlace para Gestión del Conocimiento BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
473	3.1.1.5.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
474	3.1.1.5.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
475	3.1.1.5.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
476	3.1.1.5.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
477	3.1.1.5.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
478	3.1.1.5.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
479	3.1.1.5.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
480	3.1.1.5.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
481	3.1.1.5.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
482	3.1.1.5.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
483	3.1.1.5.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
484	3.1.1.5.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
485	3.1.1.5.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
486	3.1.1.5.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
487	3.1.1.5.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
488	3.1.1.5.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										
489	3.1.1.6		CCIN_34. Contratación de Especialista Ambiental del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
490	3.1.1.6.1		Etapa Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
491	3.1.1.6.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
492	3.1.1.6.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
493	3.1.1.6.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
494	3.1.1.6.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
495	3.1.1.6.2		Etapa de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
496	3.1.1.6.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
497	3.1.1.6.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
498	3.1.1.6.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
499	3.1.1.6.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
500	3.1.1.6.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
501	3.1.1.6.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
502	3.1.1.6.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
503	3.1.1.6.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
504	3.1.1.6.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
505	3.1.1.6.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										
506	3.1.1.7		CCIN_35. Contratación de Especialista Social del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
507	3.1.1.7.1		Etapa Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
508	3.1.7.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
509	3.1.7.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
510	3.1.7.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
511	3.1.7.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
512	3.1.1.7.2		Etapa de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
513	3.1.1.7.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
514	3.1.1.7.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
515	3.1.1.7.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
516	3.1.1.7.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
517	3.1.1.7.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
518	3.1.1.7.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
519	3.1.1.7.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
520	3.1.1.7.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
521	3.1.1.7.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
522	3.1.1.7.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
523	3.1.1.8		CCIN_36. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Río Rocha (Ingeniero Civil)	567 days	Fri 13/7/18	Mon 14/9/20	\$60.000,00											
524	3.1.1.8.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
525	3.1.1.8.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
526	3.1.1.8.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
527	3.1.1.8.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
528	3.1.1.8.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
529	3.1.1.8.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
530	3.1.1.8.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
531	3.1.1.8.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
532	3.1.1.8.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
533	3.1.1.8.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
534	3.1.1.8.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
535	3.1.1.8.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
536	3.1.1.8.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
537	3.1.1.8.3		Ejecución del contrato	531 days	Mon 3/9/18	Mon 14/9/20	\$60.000,00											
538	3.1.1.8.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
539	3.1.1.8.3.2		Ejecución y supervisión	528 days	Thu 6/9/18	Mon 14/9/20	\$60.000,00	CI										
540	3.1.1.9		CCIN_37. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Alpacoma (Ingeniero Civil)	303 days	Fri 13/7/18	Tue 10/9/19	\$30.000,00											
541	3.1.1.9.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
542	3.1.1.9.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
543	3.1.1.9.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
544	3.1.1.9.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
545	3.1.1.9.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
546	3.1.1.9.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
547	3.1.1.9.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
548	3.1.1.9.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
549	3.1.1.9.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
550	3.1.1.9.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
551	3.1.1.9.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
552	3.1.1.9.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
553	3.1.1.9.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
554	3.1.1.9.3		Ejecución del contrato	267 days	Mon 3/9/18	Tue 10/9/19	\$30.000,00											
555	3.1.1.9.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
556	3.1.1.9.3.2		Ejecución y supervisión	264 days	Thu 6/9/18	Tue 10/9/19	\$30.000,00	CI										
557	3.1.1.10		CCIN_38. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de otros proyectos (Ingeniero Civil)	831 days	Fri 13/7/18	Fri 17/9/21	\$180.000,00											
558	3.1.1.10.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
559	3.1.1.10.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
560	3.1.1.10.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
561	3.1.1.10.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
562	3.1.1.10.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
563	3.1.1.10.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
564	3.1.1.10.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
565	3.1.1.10.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
566	3.1.1.10.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
567	3.1.1.10.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
568	3.1.1.10.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
569	3.1.1.10.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
570	3.1.1.10.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
571	3.1.1.10.3		Ejecución del contrato	795 days	Mon 3/9/18	Fri 17/9/21	\$180.000,00											
572	3.1.1.10.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
573	3.1.1.10.3.2		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 1)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$90.000,00	CI						CI				
574	3.1.1.10.3.3		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 2)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$90.000,00	CI						CI				
575	3.1.1.11		CCIN_39. Contratación de Especialista / Profesional de Planificación y Monitoreo BO-L1188 (FPS)	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
576	3.1.1.11.1		Etapas Previas	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
577	3.1.11.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
578	3.1.11.1.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
579	3.1.11.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
580	3.1.11.1.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
581	3.1.1.11.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
582	3.1.1.11.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
583	3.1.1.11.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
584	3.1.1.11.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
585	3.1.1.11.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
586	3.1.1.11.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
587	3.1.1.11.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
588	3.1.1.11.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
589	3.1.1.11.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00											
590	3.1.1.11.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
591	3.1.1.11.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$120.000,00	CI										CI
592	3.1.2		Gastos administrativos y logísticos	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$497.600,00	UCEP - Mi Riego										
593	3.1.2.1		Gastos administrativos para la UCEP Mi Riego	1252 days	Thu 13/9/18	Fri 30/6/23	\$312.000,00											
594	3.1.2.2	PFI	Recursos para actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UCEP Mi Riego	339 days	Thu 13/9/18	Tue 31/12/19	\$120.000,00											
595	3.1.2.3		CP_6. Adquisición de vehículo para la UCEP Mi Riego	108 days	Fri 13/7/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00											
596	3.1.2.3.1		Etapas previas	18 days	Fri 13/7/18	Tue 7/8/18	\$0,00											
597	3.1.2.3.1.1		Preparación Esp. Técnicas	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188


ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
598	3.1.2.3.1.2		Recepción de información Técnica	7 days	Fri 20/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
599	3.1.2.3.1.3		Solicitud de no objeción	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
600	3.1.2.3.1.4		No objeción	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	BID										
601	3.1.2.3.2		Etapla de Contratación	43 days	Wed 8/8/18	Fri 5/10/18	\$0,00											
602	3.1.2.3.2.1		Publicación	1 day	Wed 8/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
603	3.1.2.3.2.2		Presentación de propuestas	15 days	Thu 9/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	Oferente										
604	3.1.2.3.2.3		Evaluación	10 days	Thu 30/8/18	Wed 12/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
605	3.1.2.3.2.4		Adjudicación	3 days	Thu 13/9/18	Mon 17/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
606	3.1.2.3.2.5		Presentación de documentos legales	10 days	Tue 18/9/18	Mon 1/10/18	\$0,00	Oferente										
607	3.1.2.3.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 2/10/18	Wed 3/10/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
608	3.1.2.3.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 4/10/18	Fri 5/10/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
609	3.1.2.3.3		Ejecución del contrato	47 days	Mon 8/10/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00											
610	3.1.2.3.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Mon 8/10/18	Wed 10/10/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
611	3.1.2.3.3.2		Provisión de equipamiento	44 days	Thu 11/10/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00	P										
612	3.1.2.3.3.3		<i>Vehículo adquirido</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 11/12/18</i>	<i>Tue 11/12/18</i>	<i>\$0,00</i>											
613	3.1.2.4		CP_5. Adquisición de equipamiento y mobiliario para la UCEP Mi Riego	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$25.600,00											
614	3.1.2.4.1		Ejecución del contrato	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$25.600,00											
615	3.1.2.4.1.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Wed 29/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
616	3.1.2.4.1.2		Provisión de mobiliarios	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$9.600,00	P										
617	3.1.2.4.1.3		Provisión de equipamiento	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$16.000,00	P										
618	3.1.2.4.1.4		<i>Equipamiento y mobiliario para la UCEP - Mi Riego adquiridos</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 1/11/18</i>	<i>Thu 1/11/18</i>	<i>\$0,00</i>											
619	3.1.3	GRP	Capacitaciones en políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											
620	3.1.3.1		Capacitaciones al personal de la UCEP Mi Riego y FPS en adquisiciones y gestión financiera con políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	Especialistas Fiduciarios BID										
621	3.2		Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$250.000,00	UCEP - Mi Riego										
622	3.2.1		SCC_20. Contratación de Servicios para Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$250.000,00											
623	3.2.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 18/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
624	3.2.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 18/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
625	3.2.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
626	3.2.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
627	3.2.1.1.4		No objeción	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	BID										
628	3.2.1.1.5		Publicación	1 day	Wed 25/7/18	Wed 25/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
629	3.2.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 26/7/18	Tue 14/8/18	\$0,00	FP										
630	3.2.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
631	3.2.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 15/8/18	Thu 23/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
632	3.2.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 24/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
633	3.2.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 27/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	BID										
634	3.2.1.2		Etapla de contratación	71 days	Mon 3/9/18	Mon 10/12/18	\$0,00											
635	3.2.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
636	3.2.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 4/9/18	Mon 15/10/18	\$0,00	FP				FP						
637	3.2.1.2.3		Evaluación	14 days	Tue 16/10/18	Fri 2/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
638	3.2.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Mon 5/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP				CG - UCEP Mi Riego;FP						
639	3.2.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Fri 9/11/18	Thu 29/11/18	\$0,00	FP				FP						
640	3.2.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego				EL UCEP Mi Riego						
641	3.2.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Mon 3/12/18	Tue 4/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego				EL UCEP Mi Riego						
642	3.2.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Wed 5/12/18	Thu 6/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
643	3.2.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Fri 7/12/18	Mon 10/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP				CG - UCEP Mi Riego;FP						
644	3.2.1.3		Ejecución del contrato	1128 days	Tue 11/12/18	Thu 6/4/23	\$250.000,00											
645	3.2.1.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Tue 11/12/18	Thu 13/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
646	7.2.1.3.2		Auditoría Externa Annual	1089 days	Mon 4/2/19	Thu 6/4/23	\$250.000,00											
647	7.2.1.3.2.1		Auditoría Externa Annual 1	44 days	Mon 4/2/19	Thu 4/4/19	\$50.000,00	FA				FA						
648	7.2.1.3.2.2		Auditoría Externa Annual 2	44 days	Mon 3/2/20	Thu 2/4/20	\$50.000,00	FA					FA					
649	7.2.1.3.2.3		Auditoría Externa Annual 3	44 days	Mon 1/2/21	Thu 1/4/21	\$50.000,00	FA						FA				
650	7.2.1.3.2.4		Auditoría Externa Annual 4	44 days	Mon 7/2/22	Thu 7/4/22	\$50.000,00	FA							FA			
651	7.2.1.3.2.5		Auditoría Externa Annual 5	44 days	Mon 6/2/23	Thu 6/4/23	\$50.000,00	FA								FA		
652	3.3		Evaluaciones del Programa	1378 days	Fri 9/2/18	Tue 23/5/23	\$350.000,00	UCEP - Mi Riego										
653	3.3.1		SCC_21. Contratación de firma para realizar la 2° Encuesta para la Evaluación de Impacto	232 days	Fri 9/2/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00											
654	3.3.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 9/2/18	Tue 27/3/18	\$0,00											
655	3.3.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Fri 9/2/18	Mon 12/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
656	3.3.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Tue 13/2/18	Tue 13/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
657	3.3.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Wed 14/2/18	Wed 14/2/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
658	3.3.1.1.4		No objeción	1 day	Thu 15/2/18	Thu 15/2/18	\$0,00	BID				BID						
659	3.3.1.1.5		Publicación	1 day	Fri 16/2/18	Fri 16/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
660	3.3.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Mon 19/2/18	Thu 8/3/18	\$0,00	FP				FP						
661	3.3.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Fri 9/3/18	Thu 22/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
662	3.3.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Fri 9/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
663	3.3.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Tue 20/3/18	Tue 20/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
664	3.3.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Wed 21/3/18	Tue 27/3/18	\$0,00	BID				BID						
665	3.3.1.2		Etapas de contratación	71 days	Wed 28/3/18	Wed 4/7/18	\$0,00											
666	3.3.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Wed 28/3/18	Wed 28/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
667	3.3.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Thu 29/3/18	Wed 9/5/18	\$0,00	FP				FP						
668	3.3.1.2.3		Evaluación	14 days	Thu 10/5/18	Tue 29/5/18	\$0,00	EA - BO-L1188				EA - BO-L1188						
669	3.3.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Wed 30/5/18	Mon 4/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP				CG - UCEP Mi Riego;FP						
670	3.3.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 5/6/18	Mon 25/6/18	\$0,00	FP				FP						
671	3.3.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego				EL UCEP Mi Riego						
672	3.3.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 27/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego				EL UCEP Mi Riego						
673	3.3.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Fri 29/6/18	Mon 2/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
674	3.3.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Tue 3/7/18	Wed 4/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP				CG - UCEP Mi Riego;FP						

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
675	3.3.1.3		Ejecución del contrato	128 days	Thu 5/7/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00											
676	3.3.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 5/7/18	Mon 9/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
677	3.3.1.3.2		Ejecución del contrato	125 days	Tue 10/7/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00	FC										
678	3.3.1.3.3		2° Encuesta para la Evaluación de Impacto realizada	0 days	Mon 31/12/18	Mon 31/12/18	\$0,00											
679	3.3.2		CCIN_40. Contratación de consultor para la Evaluación intermedia del Programa	105 days	Wed 12/5/21	Tue 5/10/21	\$50.000,00											
680	3.3.2.1		Etapla Previa	12 days	Wed 12/5/21	Thu 27/5/21	\$0,00	EA - BO-L1188										
681	3.3.2.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 28/5/21	Wed 30/6/21	\$0,00	EA - BO-L1188										
682	3.3.2.3		Ejecución del contrato	69 days	Thu 1/7/21	Tue 5/10/21	\$50.000,00											
683	3.3.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 1/7/21	Mon 5/7/21	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
684	3.3.2.3.2		Ejecución y supervisión	66 days	Tue 6/7/21	Tue 5/10/21	\$50.000,00	CI										
685	3.3.2.3.3		Evaluación intermedia del Proyecto realizada	0 days	Tue 5/10/21	Tue 5/10/21	\$0,00											
686	3.3.3		CCIN_41. Contratación de consultor para la Evaluación final del Programa	105 days	Wed 28/12/22	Tue 23/5/23	\$50.000,00											
687	3.3.3.1		Etapla Previa	12 days	Wed 28/12/22	Thu 12/1/23	\$0,00	EA - BO-L1188										
688	3.3.3.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 13/1/23	Wed 15/2/23	\$0,00	EA - BO-L1188										
689	3.3.3.3		Ejecución del contrato	69 days	Thu 16/2/23	Tue 23/5/23	\$50.000,00											
690	3.3.3.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 16/2/23	Mon 20/2/23	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
691	3.3.3.3.2		Ejecución y supervisión	66 days	Tue 21/2/23	Tue 23/5/23	\$50.000,00	CI										
692	3.3.3.3.3		Evaluación Final del Programa realizada	0 days	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	\$0,00											
693	3.3.4		SCC_22. Contratación de firma para la Evaluación de Impacto del Programa	195 days	Wed 24/8/22	Tue 23/5/23	\$150.000,00											
694	3.3.4.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 24/8/22	Fri 7/10/22	\$0,00	EA - BO-L1188										
695	3.3.4.2		Etapla de contratación	71 days	Mon 10/10/22	Mon 16/1/23	\$0,00	EA - BO-L1188										
696	3.3.4.3		Ejecución del contrato	91 days	Tue 17/1/23	Tue 23/5/23	\$150.000,00											
697	3.3.4.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Tue 17/1/23	Thu 19/1/23	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
698	3.3.4.3.2		Ejecución del contrato	88 days	Fri 20/1/23	Tue 23/5/23	\$150.000,00	FC										
699	3.3.4.3.3		Evaluación de Impacto del Programa realizada	0 days	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	\$0,00											
700	3.4		Monitoreo del Programa	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											
701	3.4.1		Actividades 2018	144 days	Wed 13/6/18	Mon 31/12/18	\$0,00											
702	3.4.1.1		Actualización de Instrumentos de Gestión del Programa (PEP/POA/PA/PF/PD/GRP)	44 days	Wed 13/6/18	Mon 13/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
703	3.4.1.2		Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de Riesgos	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
704	3.4.1.3		Ajustes a los Instrumentos de Gestión del Programa y establecimiento de la línea de base del POA Año 1	5 days	Wed 15/8/18	Tue 21/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
705	3.4.1.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	94 days	Wed 22/8/18	Mon 31/12/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
706	3.4.2		Actividades 2019	261 days	Tue 1/1/19	Tue 31/12/19	\$0,00											
707	3.4.2.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	32 days	Tue 1/1/19	Wed 13/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
708	3.4.2.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Thu 14/2/19	Thu 14/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS										

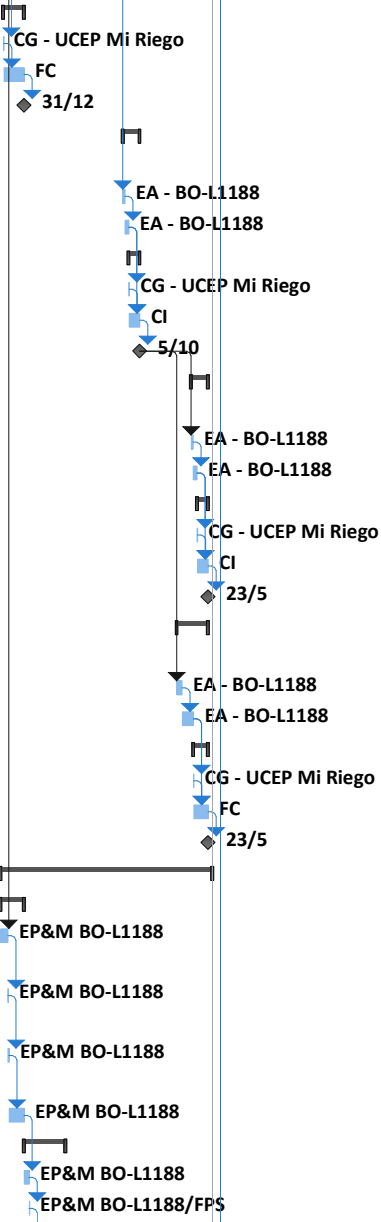


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188




















ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
709	3.4.2.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2018	10 days	Fri 15/2/19	Thu 28/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
710	3.4.2.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2018 Presentado al BID	0 days	Thu 28/2/19	Thu 28/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188					28/2					
711	3.4.2.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	120 days	Fri 1/3/19	Thu 15/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
712	3.4.2.6		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
713	3.4.2.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2019	10 days	Mon 19/8/19	Fri 30/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
714	3.4.2.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2019 Presentado al BID	0 days	Fri 30/8/19	Fri 30/8/19	\$0,00						30/8					
715	3.4.2.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	87 days	Mon 2/9/19	Tue 31/12/19	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
716	3.4.3		Actividades 2020	262 days	Wed 1/1/20	Thu 31/12/20	\$0,00											
717	3.4.3.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	32 days	Wed 1/1/20	Thu 13/2/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
718	3.4.3.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
719	3.4.3.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2019	10 days	Mon 17/2/20	Fri 28/2/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
720	3.4.3.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2019 Presentado al BID	0 days	Fri 28/2/20	Fri 28/2/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					28/2					
721	3.4.3.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	120 days	Mon 2/3/20	Fri 14/8/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
722	3.4.3.6		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
723	3.4.3.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2020	10 days	Tue 18/8/20	Mon 31/8/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
724	3.4.3.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2020 Presentado al BID	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0,00						31/8					
725	3.4.3.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	88 days	Tue 1/9/20	Thu 31/12/20	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
726	3.4.4		Actividades 2021	261 days	Fri 1/1/21	Fri 31/12/21	\$0,00											
727	3.4.4.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	30 days	Fri 1/1/21	Thu 11/2/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
728	3.4.4.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Fri 12/2/21	Fri 12/2/21	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
729	3.4.4.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2020	10 days	Mon 15/2/21	Fri 26/2/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
730	3.4.4.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2020 Presentado al BID	0 days	Fri 26/2/21	Fri 26/2/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					26/2					
731	3.4.4.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	121 days	Mon 1/3/21	Mon 16/8/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
732	3.4.4.6		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Tue 17/8/21	Tue 17/8/21	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
733	3.4.4.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2021	10 days	Wed 18/8/21	Tue 31/8/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
734	3.4.4.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2021 Presentado al BID	0 days	Tue 31/8/21	Tue 31/8/21	\$0,00						31/8					
735	3.4.4.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	88 days	Wed 1/9/21	Fri 31/12/21	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
736	3.4.5		Actividades 2022	260 days	Mon 3/1/22	Fri 30/12/22	\$0,00											
737	3.4.5.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	30 days	Mon 3/1/22	Fri 11/2/22	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
738	3.4.5.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Mon 14/2/22	Mon 14/2/22	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					
739	3.4.5.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2021	10 days	Tue 15/2/22	Mon 28/2/22	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
740	3.4.5.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2021 Presentado al BID	0 days	Mon 28/2/22	Mon 28/2/22	\$0,00	EP&M BO-L1188					28/2					
741	3.4.5.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	121 days	Tue 1/3/22	Tue 16/8/22	\$0,00	EP&M BO-L1188					EP&M BO-L1188					
742	3.4.5.6		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Wed 17/8/22	Wed 17/8/22	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS					EP&M BO-L1188/FPS					

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
743	3.4.5.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2022	10 days	Thu 18/8/22	Wed 31/8/22	\$0,00	EP&M BO-L1188										
744	3.4.5.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2022 Presentado al BID	0 days	Wed 31/8/22	Wed 31/8/22	\$0,00											
745	3.4.5.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	87 days	Thu 1/9/22	Fri 30/12/22	\$0,00	EP&M BO-L1188										
746	3.4.6		Actividades 2023	130 days	Mon 2/1/23	Fri 30/6/23	\$0,00											
747	3.4.6.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	31 days	Mon 2/1/23	Mon 13/2/23	\$0,00	EP&M BO-L1188										
748	3.4.6.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Tue 14/2/23	Tue 14/2/23	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS										
749	3.4.6.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2022	10 days	Wed 15/2/23	Tue 28/2/23	\$0,00	EP&M BO-L1188										
750	3.4.6.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2022 Presentado al BID	0 days	Tue 28/2/23	Tue 28/2/23	\$0,00											
751	3.4.6.5		Actividades de monitoreo y seguimiento	88 days	Wed 1/3/23	Fri 30/6/23	\$0,00											
752	4		Fin del Proyecto	0 days	Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0,00											



Proyecto: PEP-POA del Programa
Fecha: Fri 20/10/17

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
0	0		PEP-POA del Programa BO-L1188	1715 days	Mon 5/12/16	Fri 30/6/23	\$1.032.747,00											
1	0		Inicio de preparación del Programa	0 days	Mon 5/12/16	Mon 5/12/16	\$0,00				5/12							
2	0		Actividades previas de preparación del Programa	309 days	Mon 5/12/16	Thu 8/2/18	\$0,00											
3	0		Misión de Identificación	4 days	Mon 5/12/16	Thu 8/12/16	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
4	0		Misión de Orientación	4 days	Mon 19/6/17	Thu 22/6/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
5	0		Misión de Análisis	8 days	Tue 29/8/17	Thu 7/9/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
6	0		Distribución del POD	1 day	Fri 15/9/17	Fri 15/9/17	\$0,00	BID										
7	0		Misión de Negociación MEFP / MMAYa / MPD-FPS / BID	5 days	Mon 16/10/17	Fri 20/10/17	\$0,00	BID;MEFP;MMAYa;MDP - FPS										
8	0		Aprobación del Préstamo por el Directorio del BID	1 day	Thu 30/11/17	Thu 30/11/17	\$0,00	BID										
9	0		Autorización de firma del Contrato de Préstamo mediante Decreto Supremo	1 day	Thu 1/2/18	Thu 1/2/18	\$0,00	GDB										
10	0		Firma del Contrato de Préstamo	5 days	Fri 2/2/18	Thu 8/2/18	\$0,00	BID;MEFP										
11	0		Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00											
12	0	CPPD	Tramitación de la Resolución Ministerial del MMAYa de Aprobación del ROP	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
13	0		ROP aprobado	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00											
14	0	CPPD	Selección del Personal Clave del Programa BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00											
15	0		Responsable Técnico BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;A - UCEP Mi Riego										
16	0		Especialista de Adquisiciones BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	A - UCEP Mi Riego;CG - UCEP Mi Riego;RT - BO-L1188										
17	0		Especialista Financiero BO-L1188	1 day	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;A - UCEP Mi Riego;RT - BO-L1188										
18	0		Personal clave de la UCEP Mi Riego seleccionado	0 days	Fri 8/6/18	Fri 8/6/18	\$0,00											
19	0	CPPD	Tramitación de la Resolución Ministerial del MMAYa que incorpore el Programa BO-L1188 a la cartera de programas y proyectos de la UCEP Mi Riego	88 days	Fri 9/2/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
20	0		Resolución Ministerial emitida	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00											
21	0		Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Tue 12/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00											
22	1		Componente I: Reducción del Riesgo Climático	1500 days	Mon 2/10/17	Fri 30/6/23	\$678.580,00											
23	1.1		Producto 1: Proyectos de la muestra en la cuenca del río Rocha para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	763 days	Mon 2/10/17	Wed 2/9/20	\$188.940,00	FPS										
24	1.1.1	CEE	Suscripción del Convenio Subsidiario MEFP/MMAYa/MPD-FPS	21 days	Wed 27/6/18	Wed 25/7/18	\$0,00	MEFP/MMAYa/MPD-FPS										
25	1.1.2	CEE	Suscripción de Convenios Intergubernativos MMAYa/FPS/Municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe y emisión de las licencias ambientales	30 days	Wed 27/6/18	Tue 7/8/18	\$0,00	MMAYa;FPS;Municipio										
26	1.1.3	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	30 days	Wed 27/6/18	Tue 7/8/18	\$0,00	RD UCEP Mi Riego;ES BO-L1188										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
27	1.1.4	GRP	Incorporar personal para la tramitación, seguimiento y monitoreo hasta la obtención de las licencias ambientales de las obras de la muestra	88 days	Mon 2/10/17	Wed 31/1/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
28	1.1.5		LPI_1. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	496 days	Wed 8/8/18	Wed 1/7/20	\$0,00											
29	1.1.5.1		Etapas previa	13 days	Wed 8/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00											
30	1.1.5.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Wed 8/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	GT - C										
31	1.1.5.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Thu 9/8/18	Thu 9/8/18	\$0,00	GT - C										
32	1.1.5.1.3	GRP	Preparación del documento que incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	GT - C										
33	1.1.5.1.4		Solicitud de no objeción	1 day	Fri 17/8/18	Fri 17/8/18	\$0,00	GD										
34	1.1.5.1.5		No objeción	5 days	Mon 20/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	BID										
35	1.1.5.2		Etapas de Contratación	84 days	Mon 27/8/18	Thu 20/12/18	\$0,00											
36	1.1.5.2.1		Publicación	1 day	Mon 27/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	PL-D										
37	1.1.5.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Tue 28/8/18	Mon 29/10/18	\$0,00	Oferente										
38	1.1.5.2.3		Evaluación	7 days	Tue 30/10/18	Wed 7/11/18	\$0,00	PL-D										
39	1.1.5.2.4		Solicitud de NO	1 day	Thu 8/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	GD										
40	1.1.5.2.5		No objeción	5 days	Fri 9/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	BID										
41	1.1.5.2.6		Presentación de documentos legales	15 days	Fri 16/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00	Oferente										
42	1.1.5.2.7		Preparación del contrato	3 days	Fri 7/12/18	Tue 11/12/18	\$0,00	PL - D										
43	1.1.5.2.8		Solicitud de informe jurídico	1 day	Wed 12/12/18	Wed 12/12/18	\$0,00	PL - D										
44	1.1.5.2.9		Se adjudica y firma	2 days	Thu 13/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	JAF-D										
45	1.1.5.2.10		Firma del contrato	4 days	Mon 17/12/18	Thu 20/12/18	\$0,00	P;GD										
46	1.1.5.3		Ejecución del contrato	399 days	Fri 21/12/18	Wed 1/7/20	\$0,00											
47	1.1.5.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Fri 21/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	FS										
48	1.1.5.3.2		Ejecución de Obras (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PMPASA)	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$0,00	EC										
50	1.1.6		Compensaciones sociales en las áreas de intervención	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$0,00	EAM-BO-L1188										
51	1.1.7		SBCC_9. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de inundación en la cuenca del río Rocha, incluye los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe	559 days	Wed 13/6/18	Mon 3/8/20	\$188.940,00											
52	1.1.7.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 13/6/18	Fri 27/7/18	\$0,00											
53	1.1.7.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 13/6/18	Thu 14/6/18	\$0,00	PL - D										
54	1.1.7.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 15/6/18	Fri 15/6/18	\$0,00	PL - D										
55	1.1.7.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0,00	GD										
56	1.1.7.1.4		No objeción	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	BID										
57	1.1.7.1.5		Publicación	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	PL - D										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188


ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
58	1.1.7.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 21/6/18	Tue 10/7/18	\$0,00	FP				FP						
59	1.1.7.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 11/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
60	1.1.7.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 11/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
61	1.1.7.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	GD				GD						
62	1.1.7.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 23/7/18	Fri 27/7/18	\$0,00	BID				BID						
63	1.1.7.2		Etapas de contratación	83 days	Mon 30/7/18	Wed 21/11/18	\$0,00											
64	1.1.7.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 30/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
65	1.1.7.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 31/7/18	Mon 10/9/18	\$0,00	FP				FP						
66	1.1.7.2.3		Evaluación - Sobre 1	7 days	Tue 11/9/18	Wed 19/9/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
67	1.1.7.2.4		Solicitud de NO a adjudicación y confir. Contrato negociado	1 day	Thu 20/9/18	Thu 20/9/18	\$0,00	GD				GD						
68	1.1.7.2.5		No objeción	5 days	Fri 21/9/18	Thu 27/9/18	\$0,00	BID				BID						
69	1.1.7.2.6		Apertura y evaluación - Sobre 2	7 days	Fri 28/9/18	Mon 8/10/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
70	1.1.7.2.7		Negociación de contrato	4 days	Tue 9/10/18	Fri 12/10/18	\$0,00	JAF-D;FP				JAF-D;FP						
71	1.1.7.2.8		Solicitud de NO a adjudicación y confir. Contrato negociado	1 day	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0,00	GD				GD						
72	1.1.7.2.9		NO del Banco	5 days	Tue 16/10/18	Mon 22/10/18	\$0,00	BID				BID						
73	1.1.7.2.10		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 23/10/18	Mon 12/11/18	\$0,00	FP				FP						
74	1.1.7.2.11		Preparación de contrato	1 day	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
75	1.1.7.2.12		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 14/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	PL - D				PL - D						
76	1.1.7.2.13		Se adjudica y firma	2 days	Fri 16/11/18	Mon 19/11/18	\$0,00	GD;P				GD;P						
77	1.1.7.2.14		Firma del contrato	2 days	Tue 20/11/18	Wed 21/11/18	\$0,00	P;GD				P;GD						
78	1.1.7.3		Ejecución del contrato	443 days	Thu 22/11/18	Mon 3/8/20	\$188.940,00											
79	1.1.7.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Thu 22/11/18	Mon 26/11/18	\$0,00	PT - D				PT - D						
80	1.1.7.3.2		Ejecución del contrato	440 days	Tue 27/11/18	Mon 3/8/20	\$188.940,00	FS					FS					
82	1.1.8		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	440 days	Thu 27/12/18	Wed 2/9/20	\$0,00	FPS					FPS					
83	1.2		Producto 2: Proyectos de la muestra en la cuenca Alpacoma para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	586 days	Mon 2/10/17	Mon 30/12/19	\$8.640,00	FPS										
84	1.2.1	CEE	Suscripción del Convenio Intergubernativo MMAyA/FPS/Municipio de la cuenca del río Alpacoma y emisión de la licencia ambiental	30 days	Wed 8/8/18	Tue 18/9/18	\$0,00	MMAyA;FPS;Munucipio				MMAyA;FPS;Munucipio						
85	1.2.2	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	30 days	Wed 8/8/18	Tue 18/9/18	\$0,00	ES BO-L1188				ES BO-L1188						
86	1.2.3	GRP	Incorporar personal para la tramitación, seguimiento y monitoreo hasta la obtención de las licencias ambientales de las obras de la muestra	88 days	Mon 2/10/17	Wed 31/1/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego				CG - UCEP Mi Riego						
87	1.2.4		CP_2. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	322 days	Wed 19/9/18	Thu 12/12/19	\$0,00											
88	1.2.4.1		Etapas previas	12 days	Wed 19/9/18	Thu 4/10/18	\$0,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
89	1.2.4.1.1	GRP	Preparación del documento; incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0,00	GT - C										
90	1.2.4.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Wed 26/9/18	Wed 26/9/18	\$0,00	GT - C										
91	1.2.4.1.3		Solicitud de no objeción	1 day	Thu 27/9/18	Thu 27/9/18	\$0,00	GD										
92	1.2.4.1.4		No objeción	5 days	Fri 28/9/18	Thu 4/10/18	\$0,00	BID										
93	1.2.4.2		Etapas de Contratación	43 days	Fri 5/10/18	Tue 4/12/18	\$0,00											
94	1.2.4.2.1		Publicación	1 day	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0,00	PL-D										
95	1.2.4.2.2		Presentación de propuestas	15 days	Mon 8/10/18	Fri 26/10/18	\$0,00	Oferente										
96	1.2.4.2.3		Evaluación	10 days	Mon 29/10/18	Fri 9/11/18	\$0,00	PL - D										
97	1.2.4.2.4		Adjudicación	3 days	Mon 12/11/18	Wed 14/11/18	\$0,00	PL-D										
98	1.2.4.2.5		Presentación de documentos legales	10 days	Thu 15/11/18	Wed 28/11/18	\$0,00	Oferente										
99	1.2.4.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Thu 29/11/18	Fri 30/11/18	\$0,00	PL-D										
100	1.2.4.2.7		Firma del contrato	2 days	Mon 3/12/18	Tue 4/12/18	\$0,00	P;GD										
101	1.2.4.3		Ejecución del contrato	267 days	Wed 5/12/18	Thu 12/12/19	\$0,00											
102	1.2.4.3.1		Emisión de la orden de proceder o de inicio	3 days	Wed 5/12/18	Fri 7/12/18	\$0,00	FS										
103	1.2.4.3.2		Ejecución del contrato (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PPMPASA)	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$0,00	EC										
105	1.2.6		SCC_10. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma	384 days	Wed 13/6/18	Mon 2/12/19	\$8.640,00	FS										
106	1.2.6.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 13/6/18	Fri 27/7/18	\$0,00											
107	1.2.6.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 13/6/18	Thu 14/6/18	\$0,00	PL - D										
108	1.2.6.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 15/6/18	Fri 15/6/18	\$0,00	PL - D										
109	1.2.6.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0,00	GD										
110	1.2.6.1.4		No objeción	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	BID										
111	1.2.6.1.5		Publicación	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	PL - D										
112	1.2.6.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 21/6/18	Tue 10/7/18	\$0,00	FP										
113	1.2.6.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 11/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	PL - D										
114	1.2.6.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 11/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	PL - D										
115	1.2.6.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	GD										
116	1.2.6.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 23/7/18	Fri 27/7/18	\$0,00	BID										
117	1.2.6.2		Etapas de contratación	71 days	Mon 30/7/18	Mon 5/11/18	\$0,00											
118	1.2.6.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 30/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	PL - D										
119	1.2.6.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 31/7/18	Mon 10/9/18	\$0,00	FP										
120	1.2.6.2.3		Evaluación	14 days	Tue 11/9/18	Fri 28/9/18	\$0,00	PL - D										
121	1.2.6.2.4		Negociación de contrato	4 days	Mon 1/10/18	Thu 4/10/18	\$0,00	FP;JAF-D										
122	1.2.6.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Fri 5/10/18	Thu 25/10/18	\$0,00	FP										
123	1.2.6.2.6		Preparación de contrato	1 day	Fri 26/10/18	Fri 26/10/18	\$0,00	PL - D										
124	1.2.6.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Mon 29/10/18	Tue 30/10/18	\$0,00	PL - D										
125	1.2.6.2.8		Se adjudica y firma	2 days	Wed 31/10/18	Thu 1/11/18	\$0,00	GD;P										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
126	1.2.6.2.9		Firma del contrato	2 days	Fri 2/11/18	Mon 5/11/18	\$0,00	GD;P										
127	1.2.6.3		Ejecución del contrato	280 days	Tue 6/11/18	Mon 2/12/19	\$8.640,00											
128	1.2.6.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Tue 6/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	PT - D										
129	1.2.6.3.2		Ejecución del contrato	277 days	Fri 9/11/18	Mon 2/12/19	\$8.640,00	FS										
131	1.2.7		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	275 days	Tue 11/12/18	Mon 30/12/19	\$0,00	FPS										
132	1.3		Producto 3: Evaluaciones de riesgos probabilísticos y diseños ejecutivos por zonas de intervención, elaborados	704 days	Mon 6/11/17	Thu 16/7/20	\$481.000,00	UCEP - Mi Riego										
133	1.3.1		LPCPI-SN_11. Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos de riesgos climáticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación	268 days	Mon 6/11/17	Wed 14/11/18	\$370.000,00											
134	1.3.1.1		Etapla previa	7 days	Mon 6/11/17	Tue 14/11/17	\$0,00											
135	1.3.1.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Mon 6/11/17	Mon 6/11/17	\$0,00	RT Designado										
136	1.3.1.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Tue 7/11/17	Tue 7/11/17	\$0,00	RT Designado										
137	1.3.1.1.3		Preparación del documento	5 days	Wed 8/11/17	Tue 14/11/17	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
138	1.3.1.2		Etapla de Contratación	78 days	Wed 15/11/17	Fri 2/3/18	\$0,00											
139	1.3.1.2.1		Publicación	1 day	Wed 15/11/17	Wed 15/11/17	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
140	1.3.1.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Thu 16/11/17	Wed 17/1/18	\$0,00	Oferente										
141	1.3.1.2.3		Evaluación	7 days	Thu 18/1/18	Fri 26/1/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
142	1.3.1.2.4		Presentación de documentos legales	15 days	Mon 29/1/18	Fri 16/2/18	\$0,00	Oferente										
143	1.3.1.2.5		Preparación del contrato	3 days	Mon 19/2/18	Wed 21/2/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
144	1.3.1.2.6		Solicitud de informe jurídico	1 day	Thu 22/2/18	Thu 22/2/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
145	1.3.1.2.7		Se adjudica y firma	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
146	1.3.1.2.8		Firma del contrato	4 days	Tue 27/2/18	Fri 2/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;P										
147	1.3.1.3		Ejecución del contrato	183 days	Mon 5/3/18	Wed 14/11/18	\$370.000,00											
148	1.3.1.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Mon 5/3/18	Wed 7/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
149	1.3.1.3.2		Ejecución del contrato	180 days	Thu 8/3/18	Wed 14/11/18	\$370.000,00	FC										
150	1.3.1.3.3		<i>Evaluaciones de Riesgos probabilísticos del 1° Grupo realizadas</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 14/11/18</i>	<i>Wed 14/11/18</i>	<i>\$0,00</i>											
151	1.3.2		LPCPI-SN_12. Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos de riesgos climáticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación	268 days	Tue 22/5/18	Thu 30/5/19	\$111.000,00											
152	1.3.2.1		Etapla previa	7 days	Tue 22/5/18	Wed 30/5/18	\$0,00											
153	1.3.2.1.1		Preparación de Datos técnicos	1 day	Tue 22/5/18	Tue 22/5/18	\$0,00	RT Designado										
154	1.3.2.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Wed 23/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	RT Designado										
155	1.3.2.1.3		Preparación del documento	5 days	Thu 24/5/18	Wed 30/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
156	1.3.2.2		Etapla de Contratación	78 days	Thu 31/5/18	Mon 17/9/18	\$0,00											
157	1.3.2.2.1		Publicación	1 day	Thu 31/5/18	Thu 31/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
158	1.3.2.2.2		Presentación de propuestas	45 days	Fri 1/6/18	Thu 2/8/18	\$0,00	Oferente										
159	1.3.2.2.3		Evaluación	7 days	Fri 3/8/18	Mon 13/8/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
160	1.3.2.2.4		Presentación de documentos legales	15 days	Tue 14/8/18	Mon 3/9/18	\$0,00	Oferente										
161	1.3.2.2.5		Preparación del contrato	3 days	Tue 4/9/18	Thu 6/9/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
162	1.3.2.2.6		Solicitud de informe jurídico	1 day	Fri 7/9/18	Fri 7/9/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										



Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
163	1.3.2.2.7		Se adjudica y firma	2 days	Mon 10/9/18	Tue 11/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
164	1.3.2.2.8		Firma del contrato	4 days	Wed 12/9/18	Mon 17/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;P										
165	1.3.2.3		Ejecución del contrato	183 days	Tue 18/9/18	Thu 30/5/19	\$111.000,00											
166	1.3.2.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Tue 18/9/18	Thu 20/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
167	1.3.2.3.2		Ejecución del contrato	180 days	Fri 21/9/18	Thu 30/5/19	\$111.000,00	FC										
169	1.3.3		SBCC_13. Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	251 days	Fri 21/12/18	Fri 6/12/19	\$0,00											
170	1.3.3.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 21/12/18	Tue 5/2/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
222	1.5		Producto 5: Protocolos para el mantenimiento de obras de mitigación de riesgos climáticos, por municipio, elaborados y socializados	1119 days	Mon 10/12/18	Thu 23/3/23	\$0,00	FPS										
223	1.5.1	GRP	LPI_1. Elaboración de protocolos para mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Rocha	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$0,00											
224	1.5.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$0,00											
225	1.5.1.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$0,00	EC										
227	1.5.2	GRP	CP_2. Elaboración de los protocolos de mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Alpacoma	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$0,00											
228	1.5.2.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$0,00											
229	1.5.2.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$0,00	EC										
272	2		Componente II: Gestión del Conocimiento sobre Riesgos Climáticos	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$35.049,00											
273	2.1		Producto 8: Total de personal técnico del gobierno central y ETAs capacitados en análisis de riesgos y vulnerabilidad climáticos	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
274	2.1.1		CCIN_24. Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal técnico del gobierno central y gobiernos sub-nacionales	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$0,00											
275	2.1.1.1		Etapla Previa	12 days	Wed 21/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00											
276	2.1.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Wed 21/11/18	Tue 27/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
277	2.1.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Wed 28/11/18	Wed 28/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
278	2.1.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
279	2.1.1.1.4		NO del Banco	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0,00	BD										
280	2.1.1.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 7/12/18	Wed 9/1/19	\$0,00											
281	2.1.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Fri 7/12/18	Fri 7/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
282	2.1.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Mon 10/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	CI										
283	2.1.1.2.3		Evaluación	7 days	Mon 17/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
284	2.1.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Wed 26/12/18	Thu 27/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
285	2.1.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Fri 28/12/18	Thu 3/1/19	\$0,00	CI										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
302	2.3		Producto 10: Unidad de Gestión de Riesgos Hidrológicos, Proyectos y Temas Estratégicos fortalecida	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$35.049,00	UCEP - Mi Riego										
303	2.3.1		CCIN_26. Contratación de un Especialista en Gestión de Riesgos Hidrológicos y Cambio Climático	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$15.849,00											
304	2.3.1.1		Etapla Previa	12 days	Wed 13/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00											
305	2.3.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Wed 13/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
306	2.3.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
307	2.3.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Thu 21/6/18	Thu 21/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
308	2.3.1.1.4		NO del Banco	5 days	Fri 22/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	BD										
309	2.3.1.2		Etapla de contratación	24 days	Fri 29/6/18	Wed 1/8/18	\$0,00											
310	2.3.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
311	2.3.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Mon 2/7/18	Fri 6/7/18	\$0,00	CI										
312	2.3.1.2.3		Evaluación	7 days	Mon 9/7/18	Tue 17/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
313	2.3.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Wed 18/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
314	2.3.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Fri 20/7/18	Thu 26/7/18	\$0,00	CI										
315	2.3.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Fri 27/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
316	2.3.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Tue 31/7/18	Wed 1/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
317	2.3.1.3		Ejecución del contrato	1152 days	Thu 2/8/18	Fri 30/12/22	\$15.849,00											
318	2.3.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 2/8/18	Mon 6/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
319	2.3.1.3.2		Ejecución del contrato	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$15.849,00	CI										
320	2.3.2		CP_5. Adquisición de equipamiento y mobiliario para la UCEP Mi Riego	102 days	Wed 13/6/18	Thu 1/11/18	\$19.200,00											
321	2.3.2.1		Etapla previa	12 days	Wed 13/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00											
322	2.3.2.1.1		Preparación Esp. Técnicas	5 days	Wed 13/6/18	Tue 19/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
323	2.3.2.1.2		Recepción de información Técnica	1 day	Wed 20/6/18	Wed 20/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
324	2.3.2.1.3		Solicitud de no objeción	1 day	Thu 21/6/18	Thu 21/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
325	2.3.2.1.4		No objeción	5 days	Fri 22/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	BID										
326	2.3.2.2		Etapla de Contratación	43 days	Fri 29/6/18	Tue 28/8/18	\$0,00											
327	2.3.2.2.1		Publicación	1 day	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
328	2.3.2.2.2		Presentación de propuestas	15 days	Mon 2/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	Oferente										
329	2.3.2.2.3		Evaluación	10 days	Mon 23/7/18	Fri 3/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
330	2.3.2.2.4		Adjudicación	3 days	Mon 6/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
331	2.3.2.2.5		Presentación de documentos legales	10 days	Thu 9/8/18	Wed 22/8/18	\$0,00	Oferente										
332	2.3.2.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Thu 23/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
333	2.3.2.2.7		Firma del contrato	2 days	Mon 27/8/18	Tue 28/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
334	2.3.2.3		Ejecución del contrato	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$19.200,00											
335	2.3.2.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Wed 29/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
336	2.3.2.3.2		Provisión de equipamiento	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$12.000,00	P										
337	2.3.2.3.3		Provisión de mobiliario	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$7.200,00	P										
338	2.3.2.3.4		Equipamiento y mobiliario para la UCEP - Mi Riego adquiridos	0 days	Thu 1/11/18	Thu 1/11/18	\$0,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
339	2.3.3		Gastos operativos	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$0,00											
340	2.4		Producto 11: Total de personal técnico de ETAs capacitados en la integración del enfoque de GRD y ACC en los PTDis y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
341	2.4.1		CCIN_27. Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal de las ETAs en el enfoque de GRD y CC para su incorporación en los PTDis y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$0,00											
342	2.4.1.1		Etapas Previas	12 days	Thu 8/11/18	Fri 23/11/18	\$0,00											
343	2.4.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 8/11/18	Wed 14/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
344	2.4.1.1.2		Recepción de TDR's	1 day	Thu 15/11/18	Thu 15/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
345	2.4.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 16/11/18	Fri 16/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
346	2.4.1.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 19/11/18	Fri 23/11/18	\$0,00	BID										
347	2.4.1.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 26/11/18	Thu 27/12/18	\$0,00											
348	2.4.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 26/11/18	Mon 26/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
349	2.4.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 27/11/18	Mon 3/12/18	\$0,00	CI										
350	2.4.1.2.3		Evaluación	7 days	Tue 4/12/18	Wed 12/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
351	2.4.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 13/12/18	Fri 14/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
352	2.4.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 17/12/18	Fri 21/12/18	\$0,00	CI										
353	2.4.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 24/12/18	Tue 25/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
354	2.4.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 26/12/18	Thu 27/12/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
355	2.4.1.3		Ejecución del contrato	1046 days	Fri 28/12/18	Fri 30/12/22	\$0,00											
356	2.4.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 28/12/18	Tue 1/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
359	2.5		Producto 12: Estudio de la caracterización de la población originaria, indígena y multicultural y su exposición al riesgo, realizado	1156 days	Fri 27/7/18	Fri 30/12/22	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
360	2.5.1		SCC_18. Contratación de firma para la Elaboración del estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo, Fase I situación previa del proyecto	241 days	Fri 27/7/18	Fri 28/6/19	\$0,00											
361	2.5.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 27/7/18	Tue 11/9/18	\$0,00											
362	2.5.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Fri 27/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
363	2.5.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
364	2.5.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Wed 1/8/18	Wed 1/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
365	2.5.1.1.4		No objeción	1 day	Thu 2/8/18	Thu 2/8/18	\$0,00	BID										
366	2.5.1.1.5		Publicación	1 day	Fri 3/8/18	Fri 3/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
367	2.5.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Mon 6/8/18	Thu 23/8/18	\$0,00	FP										
368	2.5.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Fri 24/8/18	Thu 6/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
369	2.5.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Fri 24/8/18	Mon 3/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
370	2.5.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Tue 4/9/18	Tue 4/9/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
371	2.5.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Wed 5/9/18	Tue 11/9/18	\$0,00	BID										
372	2.5.1.2		Etapas de contratación	71 days	Wed 12/9/18	Wed 19/12/18	\$0,00											
373	2.5.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Wed 12/9/18	Wed 12/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
374	2.5.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Thu 13/9/18	Wed 24/10/18	\$0,00	FP										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
375	2.5.1.2.3		Evaluación	14 days	Thu 25/10/18	Tue 13/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
376	2.5.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Wed 14/11/18	Mon 19/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
377	2.5.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 20/11/18	Mon 10/12/18	\$0,00	FP										
378	2.5.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Tue 11/12/18	Tue 11/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
379	2.5.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 12/12/18	Thu 13/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
380	2.5.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Fri 14/12/18	Mon 17/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
381	2.5.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Tue 18/12/18	Wed 19/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
382	2.5.1.3		Ejecución del contrato	137 days	Thu 20/12/18	Fri 28/6/19	\$0,00											
383	2.5.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 20/12/18	Mon 24/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
401	3		Administración, Auditoría y Evaluación	1406 days	Fri 9/2/18	Fri 30/6/23	\$319.118,00	UCEP - Mi Riego										
402	3.1		Administración del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$219.118,00	UCEP - Mi Riego										
403	3.1.1		Equipo Técnico del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$102.002,00	UCEP - Mi Riego										
404	3.1.1.1	CEE	CCIN_29. Contratación de Responsable Técnico en Riesgos Climáticos BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$18.000,00											
405	3.1.1.1.1		Etapas Previas	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
406	3.1.1.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
407	3.1.1.1.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
408	3.1.1.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
409	3.1.1.1.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
410	3.1.1.1.2		Etapas de Contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
411	3.1.1.1.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
412	3.1.1.1.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
413	3.1.1.1.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
414	3.1.1.1.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
415	3.1.1.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
416	3.1.1.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
417	3.1.1.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
418	3.1.1.1.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$18.000,00											
419	3.1.1.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
420	3.1.1.1.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$18.000,00	CI										
421	3.1.1.2	GRP	CCIN_30. Contratación de Especialista de Adquisiciones BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00											
422	3.1.1.2.1		Etapas Previas	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
423	3.1.1.2.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
424	3.1.1.2.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
425	3.1.1.2.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
426	3.1.1.2.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
427	3.1.1.2.2		Etapas de Contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
428	3.1.1.2.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
429	3.1.1.2.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
430	3.1.1.2.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
431	3.1.1.2.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
432	3.1.1.2.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
433	3.1.1.2.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
434	3.1.1.2.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
435	3.1.1.2.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00											
436	3.1.1.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
437	3.1.1.2.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00	CI										
438	3.1.1.1.3	GRP	CCIN_31. Contratación de Especialista Financiero BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00											
439	3.1.1.3.1		Etapas Previa	12 days	Thu 19/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00											
440	3.1.1.3.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Thu 19/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
441	3.1.1.3.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Thu 26/4/18	Thu 26/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
442	3.1.1.3.1.3		Solicitud de NO	1 day	Fri 27/4/18	Fri 27/4/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
443	3.1.1.3.1.4		NO del Banco	5 days	Mon 30/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	BID										
444	3.1.1.3.2		Etapas de contratación	24 days	Mon 7/5/18	Thu 7/6/18	\$0,00											
445	3.1.1.3.2.1		Publicación o invitación	1 day	Mon 7/5/18	Mon 7/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
446	3.1.1.3.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Tue 8/5/18	Mon 14/5/18	\$0,00	CI										
447	3.1.1.3.2.3		Evaluación	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
448	3.1.1.3.2.4		Notifica los resultados	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0,00	EA UCEP Mi Riego										
449	3.1.1.3.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Mon 28/5/18	Fri 1/6/18	\$0,00	CI										
450	3.1.1.3.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Mon 4/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
451	3.1.1.3.2.7		Firma del contrato	2 days	Wed 6/6/18	Thu 7/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
452	3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00											
453	3.1.1.3.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 8/6/18	Tue 12/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
454	3.1.1.3.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$12.000,00	CI										
455	3.1.1.4		CCIN_32. Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
456	3.1.1.4.1		Etapas Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
457	3.1.1.4.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
458	3.1.1.4.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
459	3.1.1.4.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
460	3.1.1.4.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
461	3.1.1.4.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
462	3.1.1.4.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
463	3.1.1.4.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
464	3.1.1.4.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
465	3.1.1.4.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
466	3.1.1.4.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
467	3.1.1.4.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
468	3.1.1.4.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
469	3.1.1.4.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
470	3.1.1.4.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
471	3.1.1.4.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00	CI										
472	3.1.1.5		CCIN_33. Contratación de Enlace para Gestión del Conocimiento BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
473	3.1.1.5.1		Etapas Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
474	3.1.1.5.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
475	3.1.1.5.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
476	3.1.1.5.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
477	3.1.1.5.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
478	3.1.1.5.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
479	3.1.1.5.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
480	3.1.1.5.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
481	3.1.1.5.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
482	3.1.1.5.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
483	3.1.1.5.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
484	3.1.1.5.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
485	3.1.1.5.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
486	3.1.1.5.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
487	3.1.1.5.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
488	3.1.1.5.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00	CI										
489	3.1.1.6		CCIN_34. Contratación de Especialista Ambiental del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
490	3.1.1.6.1		Etapas Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
491	3.1.1.6.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
492	3.1.1.6.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
493	3.1.1.6.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
494	3.1.1.6.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
495	3.1.1.6.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
496	3.1.1.6.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
497	3.1.1.6.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
498	3.1.1.6.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
499	3.1.1.6.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
500	3.1.1.6.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
501	3.1.1.6.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
502	3.1.1.6.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
503	3.1.1.6.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
504	3.1.1.6.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
505	3.1.1.6.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00	CI										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
506	3.1.1.7		CCIN_35. Contratación de Especialista Social del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
507	3.1.1.7.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
508	3.1.7.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
509	3.1.7.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
510	3.1.7.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
511	3.1.7.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
512	3.1.1.7.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
513	3.1.1.7.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
514	3.1.1.7.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
515	3.1.1.7.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
516	3.1.1.7.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
517	3.1.1.7.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
518	3.1.1.7.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
519	3.1.1.7.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
520	3.1.1.7.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00											
521	3.1.1.7.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
522	3.1.1.7.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$8.276,00	CI										
523	3.1.1.8		CCIN_36. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Río Rocha (Ingeniero Civil)	567 days	Fri 13/7/18	Mon 14/9/20	\$4.138,00											
524	3.1.1.8.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
525	3.1.1.8.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
526	3.1.1.8.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
527	3.1.1.8.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
528	3.1.1.8.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID										
529	3.1.1.8.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
530	3.1.1.8.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
531	3.1.1.8.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
532	3.1.1.8.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
533	3.1.1.8.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
534	3.1.1.8.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
535	3.1.1.8.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
536	3.1.1.8.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
537	3.1.1.8.3		Ejecución del contrato	531 days	Mon 3/9/18	Mon 14/9/20	\$4.138,00											
538	3.1.1.8.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
539	3.1.1.8.3.2		Ejecución y supervisión	528 days	Thu 6/9/18	Mon 14/9/20	\$4.138,00	CI										
540	3.1.1.9		CCIN_37. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Alpacoma (Ingeniero Civil)	303 days	Fri 13/7/18	Tue 10/9/19	\$2.069,00											
541	3.1.1.9.1		Etapla Previa	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
542	3.1.1.9.1.1		Preparación Términos de Refererencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
543	3.1.1.9.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
544	3.1.1.9.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
545	3.1.1.9.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
546	3.1.1.9.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
547	3.1.1.9.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
548	3.1.1.9.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
549	3.1.1.9.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
550	3.1.1.9.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
551	3.1.1.9.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
552	3.1.1.9.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
553	3.1.1.9.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
554	3.1.1.9.3		Ejecución del contrato	267 days	Mon 3/9/18	Tue 10/9/19	\$2.069,00											
555	3.1.1.9.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
556	3.1.1.9.3.2		Ejecución y supervisión	264 days	Thu 6/9/18	Tue 10/9/19	\$2.069,00	CI					CI					
557	3.1.1.10		CCIN_38. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de otros proyectos (Ingeniero Civil)	831 days	Fri 13/7/18	Fri 17/9/21	\$12.414,00											
558	3.1.1.10.1		Etapas Previas	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
559	3.1.1.10.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
560	3.1.1.10.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
561	3.1.1.10.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
562	3.1.1.10.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					
563	3.1.1.10.2		Etapas de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
564	3.1.1.10.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
565	3.1.1.10.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI					CI					
566	3.1.1.10.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
567	3.1.1.10.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
568	3.1.1.10.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI					CI					
569	3.1.1.10.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego					EL UCEP Mi Riego					
570	3.1.1.10.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI					CG - UCEP Mi Riego;CI					
571	3.1.1.10.3		Ejecución del contrato	795 days	Mon 3/9/18	Fri 17/9/21	\$12.414,00											
572	3.1.1.10.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
573	3.1.1.10.3.2		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 1)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$6.207,00	CI					CI					
574	3.1.1.10.3.3		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 2)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$6.207,00	CI					CI					
575	3.1.1.11		CCIN_39. Contratación de Especialista / Profesional de Planificación y Monitoreo BO-L1188 (FPS)	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$8.277,00											
576	3.1.1.11.1		Etapas Previas	12 days	Fri 13/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00											
577	3.1.11.1.1.1		Preparación Términos de Referencia	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188					EA - BO-L1188					
578	3.1.11.1.1.2		Aprobación de TDR's	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
579	3.1.11.1.1.3		Solicitud de NO	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego					CG - UCEP Mi Riego					
580	3.1.11.1.1.4		NO del Banco	5 days	Tue 24/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	BID					BID					

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
581	3.1.1.11.2		Etapla de contratación	24 days	Tue 31/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
582	3.1.1.11.2.1		Publicación o invitación	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
583	3.1.1.11.2.2		Presentación de propuestas	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	CI										
584	3.1.1.11.2.3		Evaluación	7 days	Wed 8/8/18	Thu 16/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
585	3.1.1.11.2.4		Notifica los resultados	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
586	3.1.1.11.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Tue 21/8/18	Mon 27/8/18	\$0,00	CI										
587	3.1.1.11.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 28/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
588	3.1.1.11.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 30/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
589	3.1.1.11.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$8.277,00											
590	3.1.1.11.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Mon 3/9/18	Wed 5/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
591	3.1.1.11.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$8.277,00	CI										
592	3.1.2		Gastos administrativos y logísticos	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$117.116,00	UCEP - Mi Riego										
593	3.1.2.1		Gastos administrativos para la UCEP Mi Riego	1252 days	Thu 13/9/18	Fri 30/6/23	\$21.516,00											
594	3.1.2.2	PFI	Recursos para actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UCEP Mi Riego	339 days	Thu 13/9/18	Tue 31/12/19	\$30.000,00											
595	3.1.2.3		CP_6. Adquisición de vehículo para la UCEP Mi Riego	108 days	Fri 13/7/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00											
596	3.1.2.3.1		Etapla previa	18 days	Fri 13/7/18	Tue 7/8/18	\$0,00											
597	3.1.2.3.1.1		Preparación Esp. Técnicas	5 days	Fri 13/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
598	3.1.2.3.1.2		Recepción de información Técnica	7 days	Fri 20/7/18	Mon 30/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
599	3.1.2.3.1.3		Solicitud de no objeción	1 day	Tue 31/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
600	3.1.2.3.1.4		No objeción	5 days	Wed 1/8/18	Tue 7/8/18	\$0,00	BID										
601	3.1.2.3.2		Etapla de Contratación	43 days	Wed 8/8/18	Fri 5/10/18	\$0,00											
602	3.1.2.3.2.1		Publicación	1 day	Wed 8/8/18	Wed 8/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
603	3.1.2.3.2.2		Presentación de propuestas	15 days	Thu 9/8/18	Wed 29/8/18	\$0,00	Oferente										
604	3.1.2.3.2.3		Evaluación	10 days	Thu 30/8/18	Wed 12/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
605	3.1.2.3.2.4		Adjudicación	3 days	Thu 13/9/18	Mon 17/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
606	3.1.2.3.2.5		Presentación de documentos legales	10 days	Tue 18/9/18	Mon 1/10/18	\$0,00	Oferente										
607	3.1.2.3.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Tue 2/10/18	Wed 3/10/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
608	3.1.2.3.2.7		Firma del contrato	2 days	Thu 4/10/18	Fri 5/10/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;CI										
609	3.1.2.3.3		Ejecución del contrato	47 days	Mon 8/10/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00											
610	3.1.2.3.3.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Mon 8/10/18	Wed 10/10/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
611	3.1.2.3.3.2		Provisión de equipamiento	44 days	Thu 11/10/18	Tue 11/12/18	\$40.000,00	P										
612	3.1.2.3.3.3		<i>Vehículo adquirido</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 11/12/18</i>	<i>Tue 11/12/18</i>	<i>\$0,00</i>											
613	3.1.2.4		CP_5. Adquisición de equipamiento y mobiliario para la UCEP Mi Riego	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$25.600,00											
614	3.1.2.4.1		Ejecución del contrato	47 days	Wed 29/8/18	Thu 1/11/18	\$25.600,00											
615	3.1.2.4.1.1		Emisión de la orden de proceder o de incio	3 days	Wed 29/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
616	3.1.2.4.1.2		Provisión de mobiliarios	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$9.600,00	P										
617	3.1.2.4.1.3		Provisión de equipamiento	44 days	Mon 3/9/18	Thu 1/11/18	\$16.000,00	P										
618	3.1.2.4.1.4		<i>Equipamiento y mobiliario para la UCEP - Mi Riego adquirido</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 1/11/18</i>	<i>Thu 1/11/18</i>	<i>\$0,00</i>											
619	3.1.3	GRP	Capacitaciones en políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											




















Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
620	3.1.3.1		Capacitaciones al personal de la UCEP Mi Riego y FPS en adquisiciones y gestión financiera con políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	Especialistas Fiduciarios BID										
621	3.2		Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
622	3.2.1		SCC_20. Contratación de Servicios para Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$0,00											
623	3.2.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Wed 18/7/18	Fri 31/8/18	\$0,00											
624	3.2.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Wed 18/7/18	Thu 19/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
625	3.2.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Fri 20/7/18	Fri 20/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
626	3.2.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
627	3.2.1.1.4		No objeción	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0,00	BID										
628	3.2.1.1.5		Publicación	1 day	Wed 25/7/18	Wed 25/7/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
629	3.2.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Thu 26/7/18	Tue 14/8/18	\$0,00	FP										
630	3.2.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
631	3.2.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Wed 15/8/18	Thu 23/8/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
632	3.2.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Fri 24/8/18	Fri 24/8/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
633	3.2.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Mon 27/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	BID										
634	3.2.1.2		Etapas de contratación	71 days	Mon 3/9/18	Mon 10/12/18	\$0,00											
635	3.2.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
636	3.2.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Tue 4/9/18	Mon 15/10/18	\$0,00	FP										
637	3.2.1.2.3		Evaluación	14 days	Tue 16/10/18	Fri 2/11/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
638	3.2.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Mon 5/11/18	Thu 8/11/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
639	3.2.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Fri 9/11/18	Thu 29/11/18	\$0,00	FP										
640	3.2.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
641	3.2.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Mon 3/12/18	Tue 4/12/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
642	3.2.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Wed 5/12/18	Thu 6/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
643	3.2.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Fri 7/12/18	Mon 10/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
644	3.2.1.3		Ejecución del contrato	1128 days	Tue 11/12/18	Thu 6/4/23	\$0,00											
645	3.2.1.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Tue 11/12/18	Thu 13/12/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
652	3.3		Evaluaciones del Programa	1378 days	Fri 9/2/18	Tue 23/5/23	\$100.000,00	UCEP - Mi Riego										
653	3.3.1		SCC_21. Contratación de firma para realizar la 2° Encuesta para la Evaluación de Impacto	232 days	Fri 9/2/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00											
654	3.3.1.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 9/2/18	Tue 27/3/18	\$0,00											
655	3.3.1.1.1		Recepción de información Basica	2 days	Fri 9/2/18	Mon 12/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
656	3.3.1.1.2		Preparación del anuncio	1 day	Tue 13/2/18	Tue 13/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
657	3.3.1.1.3		Solicitud de V° B° del Banco	1 day	Wed 14/2/18	Wed 14/2/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
658	3.3.1.1.4		No objeción	1 day	Thu 15/2/18	Thu 15/2/18	\$0,00	BID										
659	3.3.1.1.5		Publicación	1 day	Fri 16/2/18	Fri 16/2/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
660	3.3.1.1.6		Presentación de manifestación de interes	14 days	Mon 19/2/18	Thu 8/3/18	\$0,00	FP										
661	3.3.1.1.7		Elaboración y definición de lista corta	10 days	Fri 9/3/18	Thu 22/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
662	3.3.1.1.8		Preparación de los TDR's	7 days	Fri 9/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
663	3.3.1.1.9		Solicitud de NO SP	1 day	Tue 20/3/18	Tue 20/3/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188


ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
664	3.3.1.1.10		No objeción del Banco	5 days	Wed 21/3/18	Tue 27/3/18	\$0,00	BID										
665	3.3.1.2		Etapas de contratación	71 days	Wed 28/3/18	Wed 4/7/18	\$0,00											
666	3.3.1.2.1		Remisión de Carta de Invitación	1 day	Wed 28/3/18	Wed 28/3/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
667	3.3.1.2.2		Presentación de propuestas	30 days	Thu 29/3/18	Wed 9/5/18	\$0,00	FP										
668	3.3.1.2.3		Evaluación	14 days	Thu 10/5/18	Tue 29/5/18	\$0,00	EA - BO-L1188										
669	3.3.1.2.4		Negociación de contrato	4 days	Wed 30/5/18	Mon 4/6/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
670	3.3.1.2.5		Presentación de la documentación por parte de la firma	15 days	Tue 5/6/18	Mon 25/6/18	\$0,00	FP										
671	3.3.1.2.6		Preparación de contrato	1 day	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
672	3.3.1.2.7		Solicitud de informe jurídico	2 days	Wed 27/6/18	Thu 28/6/18	\$0,00	EL UCEP Mi Riego										
673	3.3.1.2.8		Se adjudica y firma el Coordinador	2 days	Fri 29/6/18	Mon 2/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
674	3.3.1.2.9		Firma del contrato	2 days	Tue 3/7/18	Wed 4/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego;FP										
675	3.3.1.3		Ejecución del contrato	128 days	Thu 5/7/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00											
676	3.3.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 5/7/18	Mon 9/7/18	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
677	3.3.1.3.2		Ejecución del contrato	125 days	Tue 10/7/18	Mon 31/12/18	\$100.000,00	FC										
678	3.3.1.3.3		2° Encuesta para la Evaluación de Impacto realizada	0 days	Mon 31/12/18	Mon 31/12/18	\$0,00											
700	3.4		Monitoreo del Programa	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											
701	3.4.1		Actividades 2018	144 days	Wed 13/6/18	Mon 31/12/18	\$0,00											
702	3.4.1.1		Actualización de Instrumentos de Gestión del Programa (PEP/POA/PA/PF/PD/GRP)	44 days	Wed 13/6/18	Mon 13/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
703	3.4.1.2		Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de Riesgos	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
704	3.4.1.3		Ajustes a los Instrumentos de Gestión del Programa y establecimiento de la línea de base del POA Año 1	5 days	Wed 15/8/18	Tue 21/8/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										
705	3.4.1.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	94 days	Wed 22/8/18	Mon 31/12/18	\$0,00	EP&M BO-L1188										

Proyecto: PEP-POA del Programa
Fecha: Fri 20/10/17

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
0	0		PEP-POA del Programa BO-L1188	1715 days	Mon 5/12/16	Fri 30/6/23	\$12.561.639,00											
22	1		Componente I: Reducción del Riesgo Climático	1500 days	Mon 2/10/17	Fri 30/6/23	\$11.906.549,00											
23	1.1		Producto 1: Proyectos de la muestra en la cuenca del río Rocha para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	763 days	Mon 2/10/17	Wed 2/9/20	\$10.325.301,00	FPS										
28	1.1.5		LPI_1. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	496 days	Wed 8/8/18	Wed 1/7/20	\$8.541.399,00											
46	1.1.5.3		Ejecución del contrato	399 days	Fri 21/12/18	Wed 1/7/20	\$8.541.399,00											
48	1.1.5.3.2		Ejecución de Obras (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PPMPASA)	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$8.541.399,00	EC										
50	1.1.6		Compensaciones sociales en las áreas de intervención	396 days	Wed 26/12/18	Wed 1/7/20	\$468.012,00	EAM-BO-L1188										
51	1.1.7		SBCC_9. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de inundación en la cuenca del río Rocha, incluye los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe	559 days	Wed 13/6/18	Mon 3/8/20	\$477.323,00											
78	1.1.7.3		Ejecución del contrato	443 days	Thu 22/11/18	Mon 3/8/20	\$477.323,00											
80	1.1.7.3.2		Ejecución del contrato	440 days	Tue 27/11/18	Mon 3/8/20	\$477.323,00	FS										
82	1.1.8		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	440 days	Thu 27/12/18	Wed 2/9/20	\$838.567,00	FPS										
83	1.2		Producto 2: Proyectos de la muestra en la cuenca Alpacoma para reducción de riesgo y adaptación al Cambio Climático, ejecutados	586 days	Mon 2/10/17	Mon 30/12/19	\$638.056,00	FPS										
87	1.2.4		CP_2. Contratación de firma para la construcción de obras de prevención de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma, incluye la elaboración de protocolos para el mantenimiento de obras	322 days	Wed 19/9/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00											
101	1.2.4.3		Ejecución del contrato	267 days	Wed 5/12/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00											
103	1.2.4.3.2		Ejecución del contrato (incluye obras y actividades de mitigación del PGAS y PPMPASA)	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$567.000,00	EC										
104	1.2.4.3.3		Obras de la cuenca de del Río Alpacoma ejecutadas	0 days	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	\$0,00											
105	1.2.6		SCC_10. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma	384 days	Wed 13/6/18	Mon 2/12/19	\$31.902,00	FS										
127	1.2.6.3		Ejecución del contrato	280 days	Tue 6/11/18	Mon 2/12/19	\$31.902,00											
129	1.2.6.3.2		Ejecución del contrato	277 days	Fri 9/11/18	Mon 2/12/19	\$31.902,00	FS										
130	1.2.6.3.3		Supervisión de Obras de la cuenca del Río Alpacoma realizada	0 days	Mon 2/12/19	Mon 2/12/19	\$0,00											
131	1.2.7		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	275 days	Tue 11/12/18	Mon 30/12/19	\$39.154,00	FPS										
132	1.3		Producto 3: Evaluaciones de riesgos probabilísticos y diseños ejecutivos por zonas de intervención, elaborados	704 days	Mon 6/11/17	Thu 16/7/20	\$869.000,00	UCEP - Mi Riego										
151	1.3.2		LPCPI-SN_12. Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos de riesgos climáticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación - 2° Grupo	268 days	Tue 22/5/18	Thu 30/5/19	\$259.000,00											

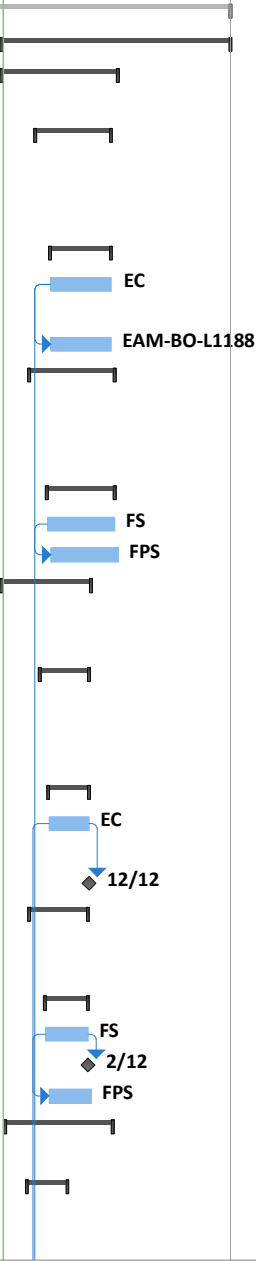


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
165	1.3.2.3		Ejecución del contrato	183 days	Tue 18/9/18	Thu 30/5/19	\$259.000,00											
167	1.3.2.3.2		Ejecución del contrato	180 days	Fri 21/9/18	Thu 30/5/19	\$259.000,00	FC										
168	1.3.2.3.3		Evaluaciones de Riesgos probabilísticos del 2° Grupo realizadas	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0,00											
169	1.3.3		SBCC_13. Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	251 days	Fri 21/12/18	Fri 6/12/19	\$610.000,00											
170	1.3.3.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Fri 21/12/18	Tue 5/2/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
171	1.3.3.2		Etapas de contratación	83 days	Wed 6/2/19	Fri 31/5/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
172	1.3.3.3		Ejecución del contrato	135 days	Mon 3/6/19	Fri 6/12/19	\$610.000,00											
173	1.3.3.3.1		Emisión de la orden de proceder	3 days	Mon 3/6/19	Wed 5/6/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
174	1.3.3.3.2		Ejecución del contrato	132 days	Thu 6/6/19	Fri 6/12/19	\$610.000,00	FC										
175	1.3.3.3.3		Diseños ejecutivos de Obras del 1° Grupo elaborados	0 days	Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0,00											
176	1.3.4		SBCC_14. Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 2° Grupo	251 days	Thu 1/8/19	Thu 16/7/20	\$0,00											
177	1.3.4.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Thu 1/8/19	Mon 16/9/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
178	1.3.4.2		Etapas de contratación	83 days	Tue 17/9/19	Thu 9/1/20	\$0,00	EA - BO-L1188										
183	1.4		Producto 4: Otros proyectos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático a nivel municipal, ejecutados	875 days	Mon 9/12/19	Fri 14/4/23	\$0,00	FPS										
184	1.4.1		Proyectos del 1° Grupo	532 days	Mon 9/12/19	Tue 21/12/21	\$0,00											
185	1.4.1.1	CEE	Suscripción del Convenio Intergubernativo MMAyA/FPS/Municipios de la zona de intervención del proyecto y emisión de la licencia ambiental	15 days	Mon 9/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	MMAyA;FPS;Munucipio										
186	1.4.1.2	GRP	Coordinación de actividades a realizar con los municipios, Gobernaciones o beneficiarios para la presentación y socialización del Programa	15 days	Mon 9/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	ES BO-L1188										
187	1.4.1.3		LPI_3. Contratación de firma para construcción de obras de prevención de riesgos de inundación o deslizamiento terrestre - 1° Grupo	496 days	Mon 30/12/19	Mon 22/11/21	\$0,00											
188	1.4.1.3.1	GRP	Etapas previas: preparación del documento que incluirá la exigencia para las Contratistas de elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos	13 days	Mon 30/12/19	Wed 15/1/20	\$0,00	GT - C										
195	1.4.1.5		SBCC_15. Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	532 days	Mon 9/12/19	Tue 21/12/21	\$0,00											
196	1.4.1.5.1		Expresión de Interes y preparación de la SP	33 days	Mon 9/12/19	Wed 22/1/20	\$0,00	PL - D										
222	1.5		Producto 5: Protocolos para el mantenimiento de obras de mitigación de riesgos climáticos, por municipio, elaborados y socializados	1119 days	Mon 10/12/18	Thu 23/3/23	\$52.100,00	FPS										
223	1.5.1	GRP	LPI_1. Elaboración de protocolos para mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Rocha	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00											
224	1.5.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00											

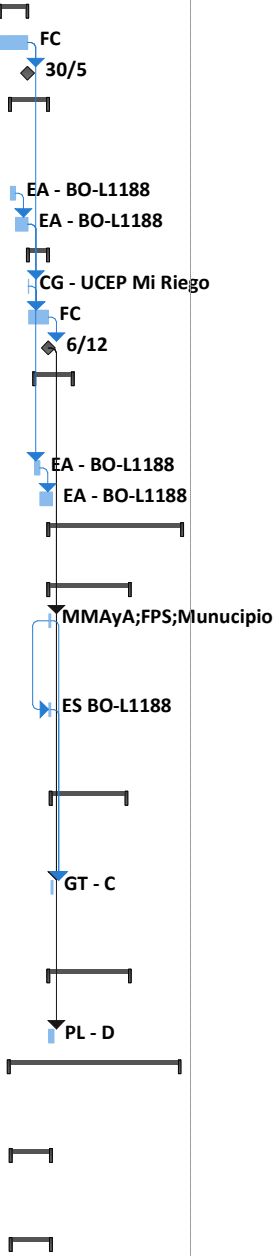


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
225	1.5.1.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Wed 26/12/18	Mon 30/12/19	\$47.500,00	EC										
226	1.5.1.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del Río Rocha elaborados	0 days	Mon 30/12/19	Mon 30/12/19	\$0,00											
227	1.5.2	GRP	CP_2. Elaboración de los protocolos de mantenimiento de obras de mitigación de riesgos, incluye socialización con los actores locales - río Alpacoma	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00											
228	1.5.2.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00											
229	1.5.2.1.1		Ejecución del contrato	264 days	Mon 10/12/18	Thu 12/12/19	\$2.500,00	EC										
230	1.5.2.1.2		Protocolos de mantenimiento de obras del Río Alpacoma elabora	0 days	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	\$0,00											
239	1.5.5		Actividades relativas a la Gerencia del Programa	1085 days	Fri 25/1/19	Thu 23/3/23	\$2.100,00	FPS										
240	1.6		Producto 6: Actividades de concientización ambiental dirigidas a la población, a nivel de zona de intervención, realizadas	1173 days	Wed 2/1/19	Fri 30/6/23	\$22.092,00	UCEP - Mi Riego										
241	1.6.1		CCIN_23. Contratación de un Especialista comunicacional para la elaboración del diseño del Plan Comunicacional del Programa e implementación	1173 days	Wed 2/1/19	Fri 30/6/23	\$10.092,00											
242	1.6.1.1		Etapa Previa	12 days	Wed 2/1/19	Thu 17/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
243	1.6.1.2		Etapa de contratación	24 days	Fri 18/1/19	Wed 20/2/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
244	1.6.1.3		Ejecución del contrato	1137 days	Thu 21/2/19	Fri 30/6/23	\$10.092,00											
245	1.6.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 21/2/19	Mon 25/2/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
246	1.6.1.3.2		Elaboración del Diseño del Plan Comunicacional del Programa	88 days	Tue 26/2/19	Thu 27/6/19	\$0,00	CI										
247	1.6.1.3.3		Diseño del Plan Comunicacional elaborado	0 days	Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0,00											
248	1.6.1.3.4		Acompañamiento en la implementación del Plan Comunicacional	1046 days	Fri 28/6/19	Fri 30/6/23	\$10.092,00	CI										
249	1.6.2		LPN_7. Contratación de firma para implementación del Plan Comunicacional - Año 3 y 4	673 days	Fri 28/6/19	Tue 25/1/22	\$12.000,00											
250	1.6.2.1		Etapa previa	13 days	Fri 28/6/19	Tue 16/7/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
251	1.6.2.2		Etapa de contratación	59 days	Wed 17/7/19	Mon 7/10/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
252	1.6.2.3		Ejecución del contrato	601 days	Tue 8/10/19	Tue 25/1/22	\$12.000,00											
253	1.6.2.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Tue 8/10/19	Thu 10/10/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
254	1.6.2.3.2		Ejecución del contrato	598 days	Fri 11/10/19	Tue 25/1/22	\$12.000,00	P										
272	2		Componente II: Gestión del Conocimiento sobre Riesgos Climáticos	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$186.538,00											
273	2.1		Producto 8: Total de personal técnico del gobierno central y ETAs capacitados en análisis de riesgos y vulnerabilidad climáticos	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$18.000,00	UCEP - Mi Riego										
274	2.1.1		CCIN_24. Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal técnico del gobierno central y gobiernos sub-nacionales	1073 days	Wed 21/11/18	Fri 30/12/22	\$18.000,00											
280	2.1.1.2		Etapa de contratación	24 days	Fri 7/12/18	Wed 9/1/19	\$0,00											
285	2.1.1.2.5		Presentación de documentos legales	5 days	Fri 28/12/18	Thu 3/1/19	\$0,00	CI										
286	2.1.1.2.6		Preparación del contrato e informe jurídico	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
287	2.1.1.2.7		Firma del contrato	2 days	Tue 8/1/19	Wed 9/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										



Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
288	2.1.1.3		Ejecución del contrato	1037 days	Thu 10/1/19	Fri 30/12/22	\$18.000,00											
289	2.1.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Thu 10/1/19	Mon 14/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
290	2.1.1.3.2		Ejecución del contrato	1034 days	Tue 15/1/19	Fri 30/12/22	\$18.000,00	CI										
292	2.2		Producto 9: Plan de Acción del Componente de Riesgos Hidrológicos y Cambios Climáticos del Plan Nacional de Cuencas, elaborado	563 days	Tue 5/11/19	Thu 30/12/21	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
293	2.2.1		CCIN_25. Contratación de Experto para la elaboración del diseño del Plan de Acción de Gestión de Riesgos Hidrológicos	563 days	Tue 5/11/19	Thu 30/12/21	\$0,00											
294	2.2.1.1		Etapa Previa	12 days	Tue 5/11/19	Wed 20/11/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
295	2.2.1.2		Etapa de contratación	24 days	Thu 21/11/19	Tue 24/12/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
296	2.2.1.3		Ejecución del contrato	527 days	Wed 25/12/19	Thu 30/12/21	\$0,00											
297	2.2.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Wed 25/12/19	Fri 27/12/19	\$0,00	CG - UCEP Mi Riego										
298	2.2.1.3.2		Ejecución del contrato	264 days	Mon 30/12/19	Thu 31/12/20	\$0,00	CI										
302	2.3		Producto 10: Unidad de Gestión de Riesgos Hidrológicos, Proyectos y Temas Estratégicos fortalecida	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$50.538,00	UCEP - Mi Riego										
303	2.3.1		CCIN_26. Contratación de un Especialista en Gestión de Riesgos Hidrológicos y Cambio Climático	1188 days	Wed 13/6/18	Fri 30/12/22	\$38.038,00											
317	2.3.1.3		Ejecución del contrato	1152 days	Thu 2/8/18	Fri 30/12/22	\$38.038,00											
319	2.3.1.3.2		Ejecución del contrato	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$38.038,00	CI										
339	2.3.3		Gastos operativos	1149 days	Tue 7/8/18	Fri 30/12/22	\$12.500,00											
340	2.4		Producto 11: Total de personal técnico de ETAs capacitados en la integración del enfoque de GRD y ACC en los PTDis y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$18.000,00	UCEP - Mi Riego										
341	2.4.1		CCIN_27. Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal de las ETAs en el enfoque de GRD y CC para su incorporación en los PTDis y POAs	1082 days	Thu 8/11/18	Fri 30/12/22	\$18.000,00											
355	2.4.1.3		Ejecución del contrato	1046 days	Fri 28/12/18	Fri 30/12/22	\$18.000,00											
356	2.4.1.3.1		Emisión de la Orden de Inicio	3 days	Fri 28/12/18	Tue 1/1/19	\$0,00	EA - BO-L1188										
357	2.4.1.3.2		Ejecución del contrato	1043 days	Wed 2/1/19	Fri 30/12/22	\$18.000,00	CI										
359	2.5		Producto 12: Estudio de la caracterización de la población originaria, indígena y multicultural y su exposición al riesgo, realizado	1156 days	Fri 27/7/18	Fri 30/12/22	\$100.000,00	UCEP - Mi Riego										
360	2.5.1		SCC_18. Contratación de firma para la Elaboración del estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo, Fase I situación previa del proyecto	241 days	Fri 27/7/18	Fri 28/6/19	\$100.000,00											
382	2.5.1.3		Ejecución del contrato	137 days	Thu 20/12/18	Fri 28/6/19	\$100.000,00											
384	2.5.1.3.2		Ejecución del contrato	124 days	Tue 8/1/19	Fri 28/6/19	\$100.000,00	FC										
385	2.5.1.3.3		Estudio de campo de economía de comportamiento sobre los determinantes económicos y sociales de la exposición al riesgo (situación previa del proyecto) realizado	0 days	Fri 28/6/19	Fri 28/6/19	\$0,00											
401	3		Administración, Auditoría y Evaluación	1406 days	Fri 9/2/18	Fri 30/6/23	\$468.552,00	UCEP - Mi Riego										
402	3.1		Administración del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$418.552,00	UCEP - Mi Riego										

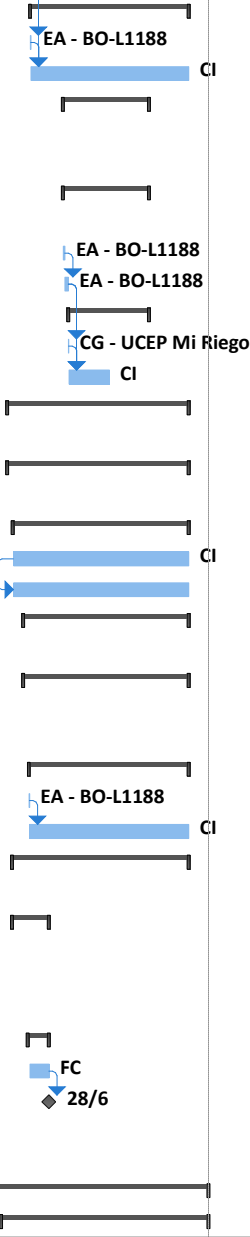


Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188








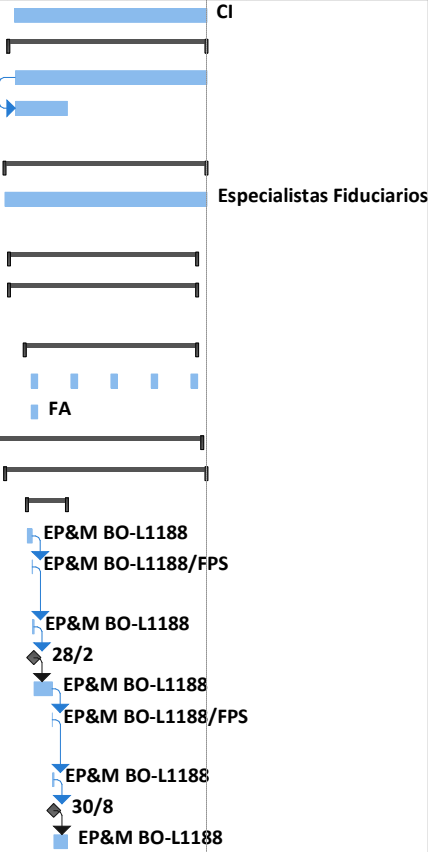










ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
403	3.1.1		Equipo Técnico del Programa	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$264.000,00	UCEP - Mi Riego										
404	3.1.1.1	CEE	CCIN_29. Contratación de Responsable Técnico en Riesgos Climáticos BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$36.000,00											
418	3.1.1.1.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$36.000,00											
420	3.1.1.1.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	CI										
421	3.1.1.2	GRP	CCIN_30. Contratación de Especialista de Adquisiciones BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00											
435	3.1.1.2.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00											
437	3.1.1.2.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00	CI										
438	3.1.1.3	GRP	CCIN_31. Contratación de Especialista Financiero BO-L1188	1357 days	Thu 19/4/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00											
452	3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00											
454	3.1.1.3.3.2		Ejecución y supervisión	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$24.000,00	CI										
455	3.1.1.4		CCIN_32. Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
469	3.1.1.4.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
471	3.1.1.4.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00	CI										
472	3.1.1.5		CCIN_33. Contratación de Enlace para Gestión del Conocimiento BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
486	3.1.1.5.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
488	3.1.1.5.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00	CI										
489	3.1.1.6		CCIN_34. Contratación de Especialista Ambiental del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
503	3.1.1.6.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
505	3.1.1.6.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00	CI										
506	3.1.1.7		CCIN_35. Contratación de Especialista Social del Programa BO-L1188	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
520	3.1.1.7.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00											
522	3.1.1.7.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$24.828,00	CI										
523	3.1.1.8		CCIN_36. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Río Rocha (Ingeniero Civil)	567 days	Fri 13/7/18	Mon 14/9/20	\$12.414,00											
537	3.1.1.8.3		Ejecución del contrato	531 days	Mon 3/9/18	Mon 14/9/20	\$12.414,00											
539	3.1.1.8.3.2		Ejecución y supervisión	528 days	Thu 6/9/18	Mon 14/9/20	\$12.414,00	CI										
540	3.1.1.9		CCIN_37. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de los proyectos de Alpacoma (Ingeniero Civil)	303 days	Fri 13/7/18	Tue 10/9/19	\$6.207,00											
554	3.1.1.9.3		Ejecución del contrato	267 days	Mon 3/9/18	Tue 10/9/19	\$6.207,00											
556	3.1.1.9.3.2		Ejecución y supervisión	264 days	Thu 6/9/18	Tue 10/9/19	\$6.207,00	CI										
557	3.1.1.10		CCIN_38. Contratación de Especialista para el monitoreo técnico de otros proyectos (Ingeniero Civil)	831 days	Fri 13/7/18	Fri 17/9/21	\$37.241,00											
571	3.1.1.10.3		Ejecución del contrato	795 days	Mon 3/9/18	Fri 17/9/21	\$37.241,00											
573	3.1.1.10.3.2		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 1)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$37.241,00	CI										
574	3.1.1.10.3.3		Ejecución y supervisión (Ingeniero Civil 2)	792 days	Thu 6/9/18	Fri 17/9/21	\$0,00	CI										
575	3.1.1.11		CCIN_39. Contratación de Especialista / Profesional de Planificación y Monitoreo BO-L1188 (EPS)	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$24.826,00											
589	3.1.1.11.3		Ejecución del contrato	1260 days	Mon 3/9/18	Fri 30/6/23	\$24.826,00											

Plan de Ejecución del Programa "Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos" BO-L1188

ID	EDT	Req	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 2	Responsable	2014 H1	H2	2017 H1	H2	2020 H1	H2	2023 H1	H2	2026 H1	H2
591	3.1.1.11.3.2		Ejecución y supervisión	1257 days	Thu 6/9/18	Fri 30/6/23	\$24.826,00	CI										
592	3.1.2		Gastos administrativos y logísticos	1296 days	Fri 13/7/18	Fri 30/6/23	\$154.552,00	UCEP - Mi Riego										
593	3.1.2.1		Gastos administrativos para la UCEP Mi Riego	1252 days	Thu 13/9/18	Fri 30/6/23	\$64.552,00											
594	3.1.2.2	PFI	Recursos para actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UCEP Mi Riego	339 days	Thu 13/9/18	Tue 31/12/19	\$90.000,00											
619	3.1.3	GRP	Capacitaciones en políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											
620	3.1.3.1		Capacitaciones al personal de la UCEP Mi Riego y FPS en adquisiciones y gestión financiera con políticas del BID	1321 days	Fri 8/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	Especialistas Fiduciarios BID										
621	3.2		Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$50.000,00	UCEP - Mi Riego										
622	3.2.1		SCC_20. Contratación de Servicios para Auditoría Externa del Programa	1232 days	Wed 18/7/18	Thu 6/4/23	\$50.000,00											
644	3.2.1.3		Ejecución del contrato	1128 days	Tue 11/12/18	Thu 6/4/23	\$50.000,00											
646	7.2.1.3.2		Auditoría Externa Annual	1089 days	Mon 4/2/19	Thu 6/4/23	\$50.000,00											
647	7.2.1.3.2.1		Auditoría Externa Annual 1	44 days	Mon 4/2/19	Thu 4/4/19	\$50.000,00	FA										
652	3.3		Evaluaciones del Programa	1378 days	Fri 9/2/18	Tue 23/5/23	\$0,00	UCEP - Mi Riego										
700	3.4		Monitoreo del Programa	1318 days	Wed 13/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00											
706	3.4.2		Actividades 2019	261 days	Tue 1/1/19	Tue 31/12/19	\$0,00											
707	3.4.2.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	32 days	Tue 1/1/19	Wed 13/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
708	3.4.2.2		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Thu 14/2/19	Thu 14/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS										
709	3.4.2.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2018	10 days	Fri 15/2/19	Thu 28/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
710	3.4.2.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2018 Presentado al BID	0 days	Thu 28/2/19	Thu 28/2/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
711	3.4.2.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	120 days	Fri 1/3/19	Thu 15/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
712	3.4.2.6		Envío de información de avance físico y financiero de la ejecución del FPS	1 day	Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188/FPS										
713	3.4.2.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2019	10 days	Mon 19/8/19	Fri 30/8/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										
714	3.4.2.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2019 Presentado al BID	0 days	Fri 30/8/19	Fri 30/8/19	\$0,00											
715	3.4.2.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	87 days	Mon 2/9/19	Tue 31/12/19	\$0,00	EP&M BO-L1188										



Proyecto: PEP-POA del Programa
Fecha: Fri 20/10/17

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
