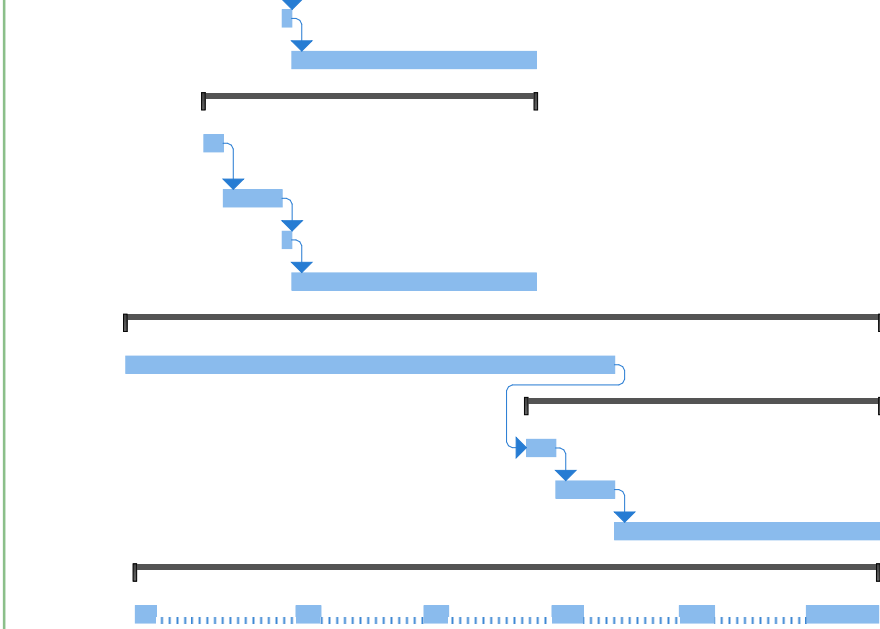


Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6																												
										S2	2017	S1	S2	2018	S1	S2	2019	S1	S2	2020	S1	S2	2021	S1	S2	2022	S1	S2	2023	S1	S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2
1	Programa de Despoluição do Rio Tiete - Etapa IV	mar 03/01/17	mié 19/02/25	\$6,051	\$91,106	\$208,761	\$145,365	\$16,842	\$4,451																												
2	Elegibilidade dos Fundos do BID	lun 27/11/17	jue 21/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
13	Investimento	mar 03/01/17	mié 19/02/25	\$6,051	\$91,106	\$208,761	\$145,365	\$16,842	\$4,451																												
14	Componente 1 - Obras de Esgotamento Sanitário	mar 03/01/17	vie 26/07/24	\$5,801	\$87,476	\$204,791	\$137,795	\$16,842	\$4,451																												
15	Estudos e projetos	mar 03/01/17	lun 22/03/21	\$1,029	\$1,029	\$442	\$0	\$0	\$0																												
33	Obras	lun 28/05/18	lun 17/06/24	\$4,672	\$84,747	\$200,349	\$127,595	\$16,842	\$4,451																												
34	Obra 001 - Empreendimento A: Coletores e redes de coleta na Bacia TO-11 - Cotia e Itapevi.	mié 01/05/19	vie 30/06/23	\$0	\$7,743	\$18,970	\$10,646	\$1,355	\$0																												
35	Elaboração do Pacote Técnico para Licitação	mié 01/05/19	vie 30/08/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
36	Processo de Contratação (LPI)	lun 02/09/19	vie 14/02/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
37	Assinatura do Contrato	lun 17/02/20	vie 13/03/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
38	Execução do Contrato	lun 16/03/20	vie 30/06/23	\$0	\$7,743	\$18,970	\$10,646	\$1,355	\$0																												
39	Coletores Tronco	lun 16/03/20	vie 30/06/23	\$0	\$5,305	\$12,997	\$7,294	\$928	\$0																												
40	Redes e Ligações Domiciliarias	lun 16/03/20	vie 30/06/23	\$0	\$2,438	\$5,973	\$3,352	\$427	\$0																												
41	Obra 002 - Empreendimento B: Coletores e Redes de Coleta na Bacia TO-01, TO-03, TO-05, TJ-07, TO-07 - Santana da Parnaíba e Barueri.	mar 17/03/20	jue 16/05/24	\$0	\$4,212	\$10,319	\$5,791	\$736	\$0																												
42	Preparação de documentos de licitação	mar 17/03/20	jue 16/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
43	Processo de Contratação - (LPN)	vie 17/07/20	jue 31/12/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
44	Assinatura do Contrato	vie 01/01/21	jue 28/01/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
45	Execução do Contrato	vie 29/01/21	jue 16/05/24	\$0	\$4,212	\$10,319	\$5,791	\$736	\$0																												
46	Coletores Tronco	vie 29/01/21	jue 16/05/24	\$0	\$3,976	\$9,740	\$5,466	\$695	\$0																												
47	Redes e Ligações Domiciliarias	vie 29/01/21	jue 16/05/24	\$0	\$236	\$579	\$325	\$41	\$0																												
48	Obra 003 - Empreendimento C na Bacia JU-05, JU-07, TO-20, TO-07 - São Paulo.	lun 28/05/18	jue 22/09/22	\$4,672	\$13,054	\$8,521	\$1,236	\$0	\$0																												
49	Preparação de documentos de licitação	lun 28/05/18	vie 28/09/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
50	Processo de Contratação - (LPN)	lun 01/10/18	vie 15/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
51	Assinatura do Contrato	lun 18/03/19	vie 12/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
52	Execução do Contrato	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$4,672	\$13,054	\$8,521	\$1,236	\$0	\$0																												
53	Coletores Tronco	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$4,311	\$12,046	\$7,862	\$1,141	\$0	\$0																												
54	Redes e Ligações Domiciliarias	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$361	\$1,008	\$659	\$95	\$0	\$0																												
55	Obra 004 - Empreendimento D - ETE Parque Novo Mundo	mar 28/04/20	lun 17/06/24	\$0	\$0	\$8,051	\$22,750	\$14,751	\$4,451																												
56	Preparação de documentos de licitação	mar 28/04/20	lun 31/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
57	Processo de Contratação - (LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
58	Assinatura do Contrato	mar 16/02/21	lun 15/03/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
59	Execução do Contrato	mar 16/03/21	lun 17/06/24	\$0	\$0	\$8,051	\$22,750	\$14,751	\$4,451																												
60	ETE construída	mar 16/03/21	lun 17/06/24	\$0	\$0	\$8,051	\$22,750	\$14,751	\$4,450																												
61	Obras - Outros empreendimentos	mar 02/07/19	lun 11/09/23	\$0	\$59,738	\$154,488	\$87,172	\$0	\$0																												
62	Preparação de documentos de licitação	mar 02/07/19	lun 30/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
63	Processo de Contratação - (LPI)	mar 01/10/19	lun 16/03/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
64	Assinatura do Contrato	mar 17/03/20	lun 13/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
65	Execução do Contrato	mar 14/04/20	lun 11/09/23	\$0	\$59,738	\$154,488	\$87,172	\$0	\$0																												
66	Coletores Tronco, Redes e Ligações	mar 14/04/20	lun 11/09/23	\$0	\$37,738	\$90,538	\$47,522	\$8,567	\$128																												

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	S2	2017		2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
											S1	S2		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
67	ETE construída	mar 14/04/20	lun 17/07/23	\$0	\$22,000	\$63,950	\$39,650	\$3,850	\$0																				
68	Fiscalização das obras	lun 16/03/20	vie 03/12/21	\$0	\$0	\$0	\$7,700	\$0	\$0																				
69	Contrato Gerenciadora do programa	lun 16/03/20	vie 03/12/21	\$0	\$0	\$0	\$7,700	\$0	\$0																				
70	Execução da Fiscalização das obras	lun 16/03/20	vie 03/12/21	\$0	\$0	\$0	\$7,700	\$5,700	\$1,900																				
71	Auditoria de Obras (Ambiental/Qualidade)	lun 20/08/18	vie 26/07/24	\$100	\$1,700	\$4,000	\$2,500	\$0	\$0																				
72	Elaboração dos termos de referência	lun 20/08/18	vie 21/12/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
73	Processo de Contratação	lun 24/12/18	vie 26/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
74	Execução do serviço	lun 29/04/19	vie 26/07/24	\$100	\$1,700	\$4,000	\$2,500	\$600	\$100																				
75	Componente 2 - Sustentabilidade Institucional e Operacional	vie 06/09/19	jue 09/06/22	\$250	\$3,630	\$3,970	\$3,570	\$0	\$0																				
76	Fortalecimento da capacidade da SABESP na gestão dos sistemas de esgotos	vie 06/09/19	jue 12/05/22	\$0	\$730	\$770	\$770	\$0	\$0																				
77	Aquisição de Equipamentos	vie 06/09/19	jue 14/04/22	\$0	\$730	\$740	\$730	\$0	\$0																				
78	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 06/09/19	jue 31/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
79	Processo de Contratação (LPI)	vie 01/11/19	jue 16/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
80	Assinatura do Contrato	vie 17/04/20	jue 14/05/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
81	Execução da Consultoria	vie 15/05/20	jue 14/04/22	\$0	\$730	\$740	\$730	\$0	\$0																				
82	Capacitação	vie 04/10/19	jue 12/05/22	\$0	\$0	\$30	\$40	\$0	\$0																				
83	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 04/10/19	jue 28/11/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
84	Processo de Contratação (LPN)	vie 29/11/19	jue 14/05/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
85	Assinatura do Contrato	vie 15/05/20	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
86	Execução da Capacitação	vie 12/06/20	jue 12/05/22	\$0	\$0	\$30	\$40	\$30	\$0																				
87	Apoio ao desenvolvimento de tecnologias operacionais inovadoras	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$250	\$2,600	\$2,800	\$2,500	\$0	\$0																				
88	Estudo de Concepção da ETE Demonstração (Projeto Básico)	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$250	\$400	\$600	\$150	\$0	\$0																				
89	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
90	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
91	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
92	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/06/22	\$250	\$400	\$600	\$150	\$0	\$0																				
93	Implantação da ETE Demonstração - FASE I (Projeto Executivo)	vie 01/11/19	jue 09/12/21	\$0	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$0	\$0																				
94	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
95	Processo de Contratação (LPI)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
96	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
97	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/12/21	\$0	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,100	\$0																				
98	Capacitação	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$0	\$0	\$0	\$150	\$0	\$0																				
99	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
100	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
101	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
102	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/06/22	\$0	\$0	\$0	\$150	\$300	\$150																				
103	Apoio a SABESP para atender os requerimentos do ente regulador	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$0	\$300	\$400	\$300	\$0	\$0																				
104	Consultoria	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$0	\$150	\$150	\$150	\$0	\$0																				
105	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
106	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6		2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
											S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
107	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
108	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/06/22	\$0	\$150	\$150	\$150	\$0	\$0																						
109	Capacitação	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$0	\$150	\$250	\$150	\$0	\$0																						
110	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
111	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
112	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
113	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/06/22	\$0	\$150	\$250	\$150	\$0	\$0																						
114	Apoio a Gestão, Monitoramento e Avaliação	vie 22/03/19	mié 19/02/25	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0																						
115	Gerenciadora contratada - Etapa III / IV	vie 22/03/19	jue 19/01/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
116	Gerenciadora contratada - Etapa IV	vie 13/05/22	mié 19/02/25	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0																						
117	Elaboração do pacote de licitação	vie 13/05/22	jue 04/08/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
118	Processo de contratação	vie 05/08/22	jue 19/01/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
119	Execução do Contrato	vie 20/01/23	mié 19/02/25	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$3,000	\$1,000																						
120	Auditoria Contável	vie 19/04/19	jue 13/02/25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
121	Executada no marco da Auditoria Institucional da SABESP	vie 19/04/19	jue 13/02/25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Ano 1	S2	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	Programa de Despoluição do Rio Tiete - Etapa IV	mar 03/01/17	jue 13/02/25	\$6,051																		13/02	
2	Elegibilidade dos Fundos do BID	lun 27/11/17	jue 21/03/19	\$0																			
13	Investimento	mar 03/01/17	jue 13/02/25	\$6,051																			
14	Componente 1 - Obras de Esgotamento Sanitário	mar 03/01/17	mié 31/07/24	\$5,801																			
15	Estudos e projetos	mar 03/01/17	lun 22/03/21	\$1,029																			
33	Obras	lun 28/05/18	jue 22/09/22	\$4,672																			
34	Obra 001 - Empreendimento A: Coletores e redes de coleta na Bacia TO-11 - Cotia e Itapevi.	mié 01/05/19	vie 13/03/20	\$0																			
35	Elaboração do Pacote Técnico para Licitação	mié 01/05/19	vie 30/08/19	\$0																			
36	Processo de Contratação (LPI)	lun 02/09/19	vie 14/02/20	\$0																			
37	Assinatura do Contrato	lun 17/02/20	vie 13/03/20	\$0																			
38	Obra 002 - Empreendimento B: Coletores e Redes de Coleta na Bacia TO-01, TO-03, TO-05, TJ-07, TO-07 - Santana da Parnaíba e Barueri.	mar 17/03/20	jue 28/01/21	\$0																			
39	Preparação de documentos de licitação	mar 17/03/20	jue 16/07/20	\$0																			
40	Processo de Contratação - (LPN)	vie 17/07/20	jue 31/12/20	\$0																			
41	Assinatura do Contrato	vie 01/01/21	jue 28/01/21	\$0																			
42	Obra 003 - Empreendimento C na Bacia JU-05, JU-07, TO-20, TO-07 - São Paulo.	lun 28/05/18	jue 22/09/22	\$4,672																			
43	Preparação de documentos de licitação	lun 28/05/18	vie 28/09/18	\$0																			
44	Processo de Contratação - (LPN)	lun 01/10/18	vie 15/03/19	\$0																			
45	Assinatura do Contrato	lun 18/03/19	vie 12/04/19	\$0																			
46	Execução do Contrato	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$4,672																			
47	Coletores Tronco	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$4,311																			
48	Redes e Ligações Domiciliaras	lun 15/04/19	jue 22/09/22	\$361																			
49	Obras - Outros empreendimentos	mar 02/07/19	lun 13/04/20	\$0																			
50	Preparação de documentos de licitação	mar 02/07/19	lun 30/09/19	\$0																			
51	Processo de Contratação - (LPI)	mar 01/10/19	lun 16/03/20	\$0																			
52	Assinatura do Contrato	mar 17/03/20	lun 13/04/20	\$0																			
53	Fiscalização das obras	mar 03/10/17	mié 31/07/24	\$0																			
54	Contrato Gerenciadora do programa	mar 03/10/17	mié 31/07/24	\$0																			
55	Execução da Fiscalização das obras	mar 03/10/17	mié 31/07/24	\$0																			
56	Auditoria de Obras (Ambiental/Qualidade)	lun 20/08/18	vie 26/07/24	\$100																			
57	Elaboração dos termos de referência	lun 20/08/18	vie 21/12/18	\$0																			
58	Processo de Contratação	lun 24/12/18	vie 26/04/19	\$0																			
59	Execução do serviço	lun 29/04/19	vie 26/07/24	\$100																			
60	Componente 2 - Sustentabilidade Institucional e Operacional	vie 06/09/19	jue 09/06/22	\$250																			
61	Fortalecimento da capacidade da SABESP na gestão dos sistemas de esgotos	vie 06/09/19	jue 14/05/20	\$0																			
62	Aquisição de Equipamentos	vie 06/09/19	jue 14/05/20	\$0																			
63	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 06/09/19	jue 31/10/19	\$0																			
64	Processo de Contratação (LPI)	vie 01/11/19	jue 16/04/20	\$0																			
65	Assinatura do Contrato	vie 17/04/20	jue 14/05/20	\$0																			
66	Capacitação	vie 04/10/19	jue 14/05/20	\$0																			
67	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 04/10/19	jue 28/11/19	\$0																			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Ano 1	S2	2017		S2	2018		S2	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						S1	S2		S1	S2		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
68	Processo de Contratação (LPN)	vie 29/11/19	jue 14/05/20	\$0																					
69	Apoio ao desenvolvimento de tecnologias operacionais inovadoras	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$250																					
70	Estudo de Concepção da ETE Demonstração (Projeto Básico)	vie 01/11/19	jue 09/06/22	\$250																					
71	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0																					
72	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0																					
73	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0																					
74	Execução da Consultoria	vie 10/07/20	jue 09/06/22	\$250																					
75	Implantação da ETE Demonstração - FASE I (Projeto Executivo)	vie 01/11/19	jue 09/07/20	\$0																					
76	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0																					
77	Processo de Contratação (LPI)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0																					
78	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0																					
79	Capacitação	vie 01/11/19	jue 11/06/20	\$0																					
80	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0																					
81	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0																					
82	Apoio a SABESP para atender os requerimentos do ente regulador	vie 01/11/19	jue 09/07/20	\$0																					
83	Consultoria	vie 01/11/19	jue 09/07/20	\$0																					
84	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0																					
85	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0																					
86	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0																					
87	Capacitação	vie 01/11/19	jue 09/07/20	\$0																					
88	Elaboração das especificações técnicas e documentos de licitação	vie 01/11/19	jue 26/12/19	\$0																					
89	Processo de Contratação (SQC)	vie 27/12/19	jue 11/06/20	\$0																					
90	Assinatura do Contrato	vie 12/06/20	jue 09/07/20	\$0																					
91	Apoio a Gestão, Monitoramento e Avaliação	vie 22/03/19	jue 13/02/25	\$0																					
92	Gerenciadora contratada - Etapa III / IV	vie 22/03/19	jue 19/01/23	\$0																					
93	Auditoria Contável	vie 19/04/19	jue 13/02/25	\$0																					
94	Executada no marco da Auditoria Institucional da SABESP	vie 19/04/19	jue 13/02/25	\$0																					
