
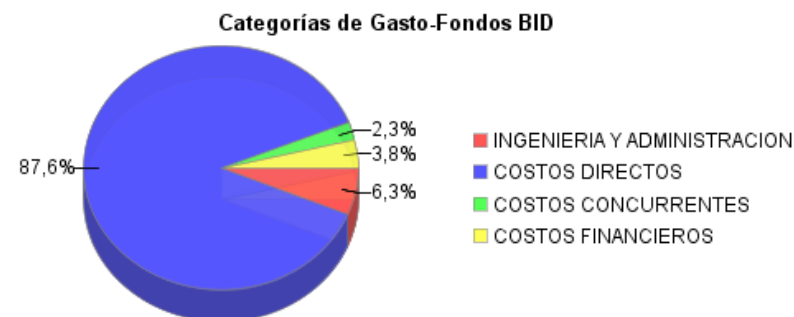
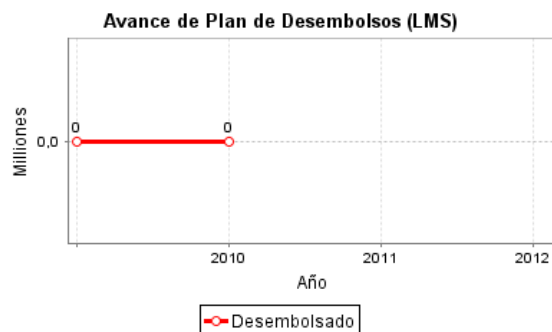



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	ALCALDIA DE MANAGUA		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	2243/BL-NI	Monto Aprobado Actual: 13.000.000,00	BID Original: 13.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 13.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	NI-P1013, NI-T1042, NI-T1047	Saldo: 13.000.000,00	Co-financiamiento/País: 6.797.600,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 19.797.600,00
			Período de Amortización (meses): 287

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 15, 2011

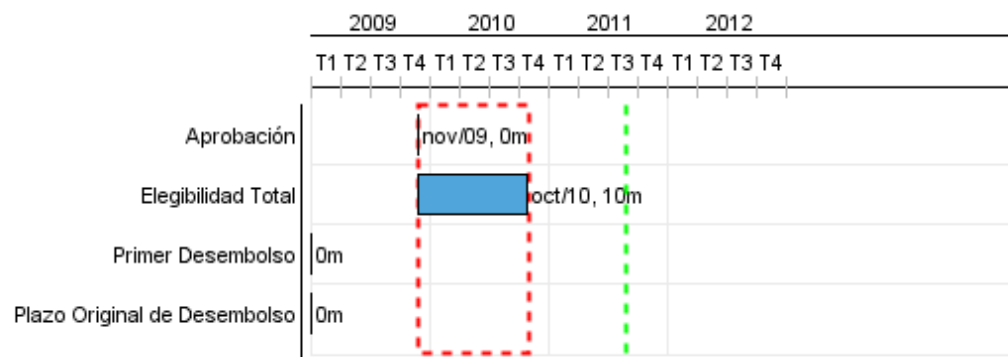

Progreso Acumulado al 2010

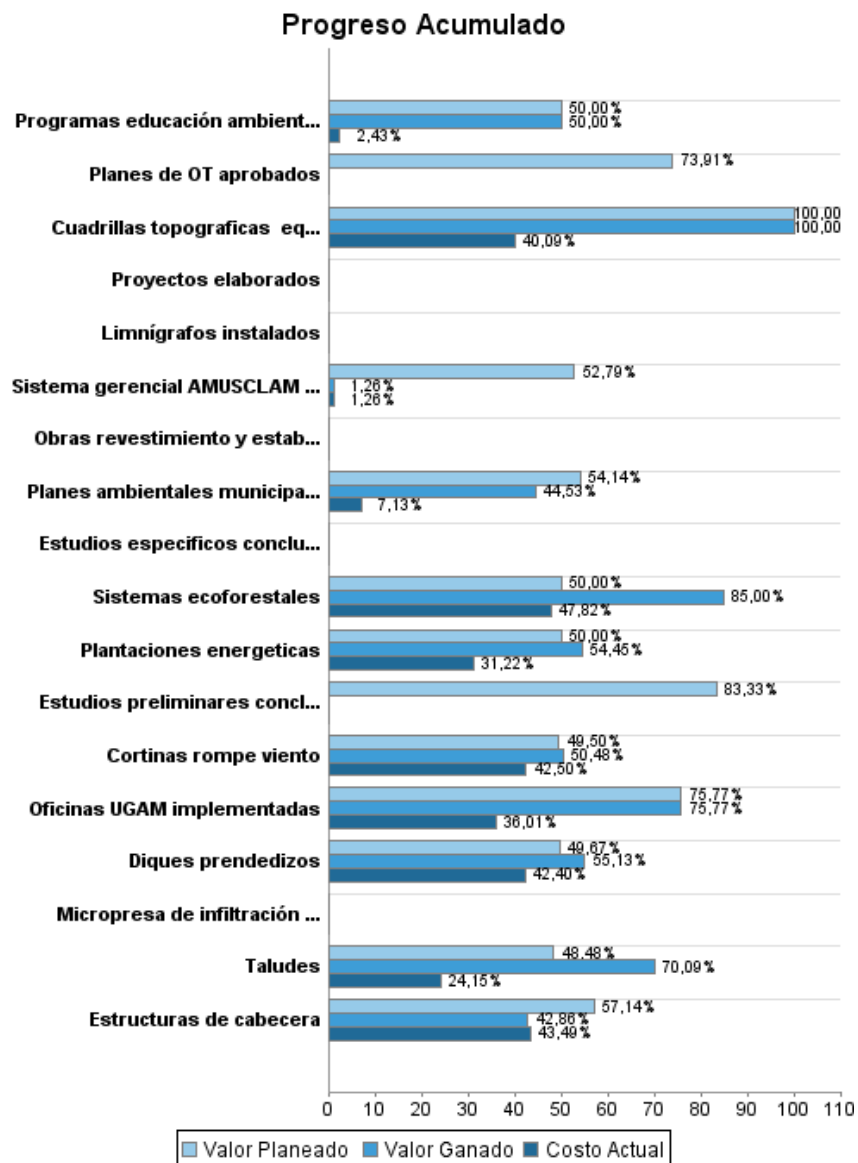


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1010 - Drenaje Pluvial y Gestión Desarrollo Subcuenca III Managua
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 14/04/2011

Progreso Acumulado

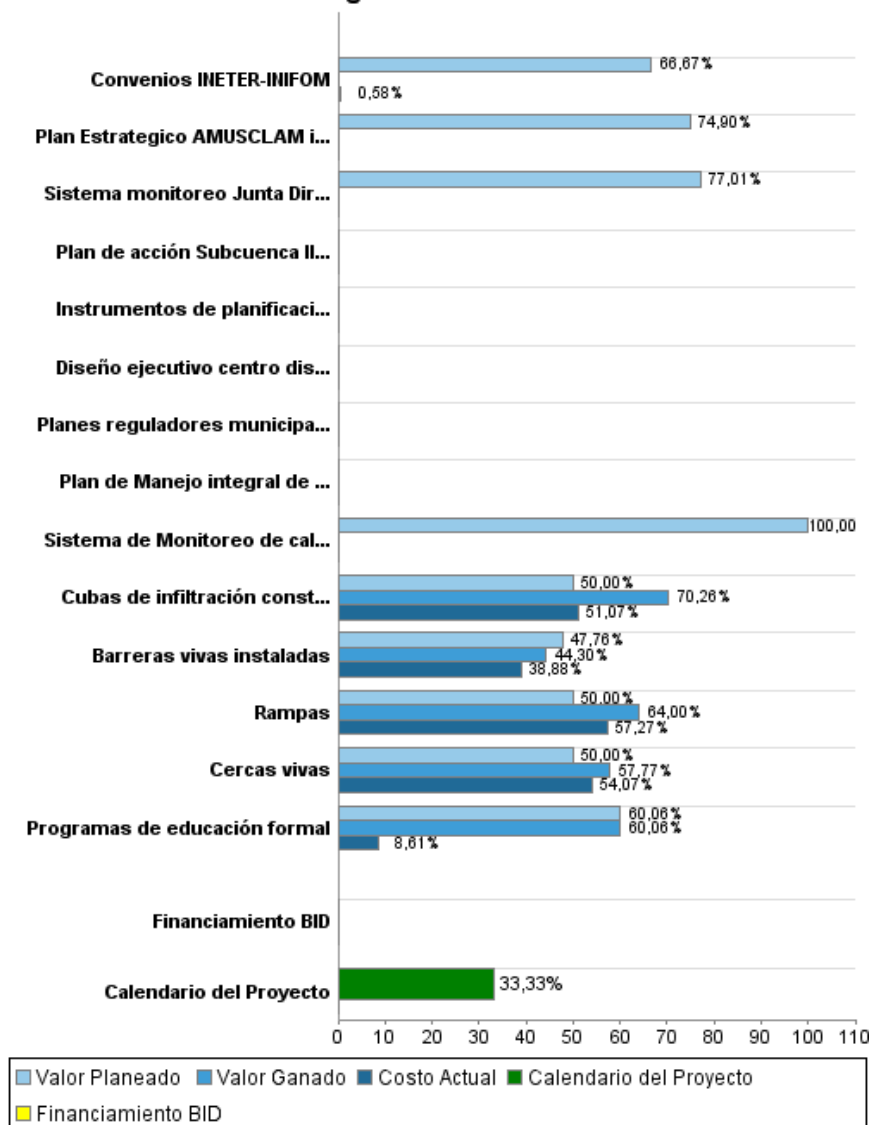

Resultados

Resultado: Habitantes en riesgo de inundación reducido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Habitantes en riesgo de inundación reducido	Habitantes		2009	P A			600,00	600,00

Resultado: Área de cauce recuperada (m2)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Área de cauce recuperada	metros cuadrados		2009	P A			12.800,00	12.800,00

Resultado: Extensión de la mancha de inundación en la parte baja del Cauce 31 de Diciembre para un evento de lluvia con periodo de retorno de 25 años (Hectáreas) reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Extensión de la mancha de inundación reducida(periodo de retorno 25 años)	hectáreas		2009	P A			177,00	177,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Drenaje pluvial y gestión de residuos sólidos									
Micropresa de infiltración y regulación construida	Micropresa				1,00				2.500.000,00
Obras revestimiento y estabilización del cauce contruidas	metros lineales				2.560,00				7.629.100,00
Limnigrafos instalados	limnigrafos				6,00				690.000,00
Plan de Manejo integral de gestión desechos sólidos mancomunado en 4 municipios implementado	plan				1,00				400.000,00
Diseño ejecutivo centro disposición final completado	Diseño				1,00				808.300,00
Fortalecimiento Institucional									
Sistema monitoreo Junta Directiva AMUSCLAM implementado	Sistema				1,00				6.480,00
Plan Estrategico AMUSCLAM implementado	Plan				1,00				16.055,00
Oficinas UGAM implementadas	Oficinas	1,00	1,00		4,00	90.780,00	84.840,00		415.050,00
Sistema gerencial AMUSCLAM implementado	sistema				1,00	11.660,00	550,00		43.782,00
Sistema de Monitoreo de calidad ambiental implementado	sistema				1,00				10.000,00
Reducción y control de erosión									
Cubas de infiltración construidas	Cubas	2.550,00	2.625,00		7.850,00	95.670,00	72.770,00		333.780,00
Barreras vivas instaladas	ml	116.500,00	102.218,00		412.500,00	71.060,00	66.030,00		251.620,00
Cortinas rompe viento	ml	30.500,00	31.489,00		101.000,00	38.430,00	32.930,00		127.260,00
Diques prendedizos	ml	2.200,00	2.612,00		7.550,00	74.910,00	68.550,00		257.080,00
Rampas	unidades	16,00	17,00		50,00	128.000,00	148.800,00		400.000,00
Taludes	m2	950,00	1.930,00		3.300,00	237.500,00	116.110,00		825.000,00
Estructuras de cabecera	unidades	12,00	4,00		35,00	36.000,00	4.510,00		105.000,00
Cercas vivas	ml	25.000,00	37.770,00		100.000,00	17.880,00	23.410,00		71.520,00
Sistemas ecoforestales	ha	25,00	59,00		100,00	66.140,00	82.440,00		264.580,00
Plantaciones energeticas	ha	50,00	64,90		200,00	67.060,00	50.090,00		268.240,00
Programas de educación formal	programa	1,00	1,00		4,00	83.500,00	6.400,00		308.000,00
Talleres educación no formal	talleres	1,00	1,00		4,00	45.000,00	16.600,00		180.000,00
Programas educación ambiental no formal	programa	1,00	1,00		4,00	35.840,00	580,00		143.360,00
Planificación territorial y ambiental									
Planes ambientales municipales implementados	Planes				5,00		4.690,00		77.000,00
Planes de OT aprobados	Planes	3,00			5,00	120.000,00			230.000,00
Planes reguladores municipales aprobados	Planes				5,00				120.000,00
Convenios INETER-INIFOM	convenios	1,00			4,00	20.000,00			60.000,00
Estudios preliminares concluidos	estudios	20,00			50,00	50.000,00			120.000,00
Plan de acción Subcuenca III aprobado	plan				1,00				1.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1010 - Drenaje Pluvial y Gestión Desarrollo Subcuenca III Managua
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/04/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Estudios específicos concluidos	estudios				10,00				100.000,00
Proyectos elaborados	proyectos				20,00				100.000,00
Instrumentos de planificación divulgados	instrumentos				11,00				50.000,00
Sistema de monitoreo urbano implementado	sistema				1,00				50.000,00
Cuadrillas topograficas equipada y capacitadas	cuadrillas	3,00	3,00		7,00	20.530,00	20.260,00		50.530,00
Coordinacion & Administracion, Auditoría y Evaluación, Gastos Financieros									
TOTAL						1.309.960,00	799.560,00		17.012.737,00
