
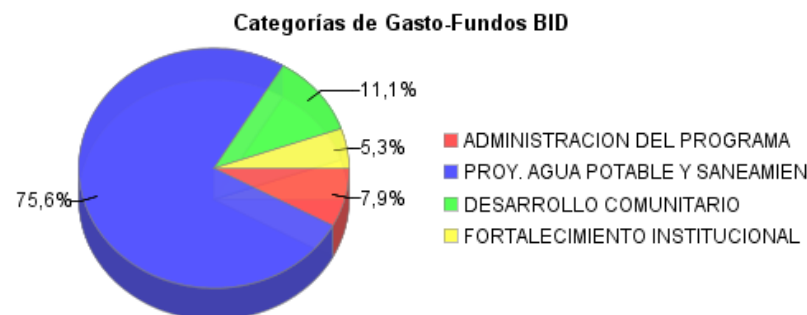
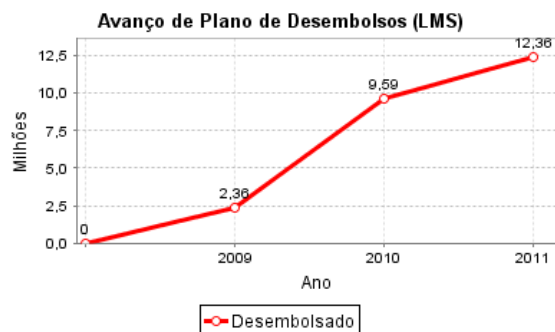



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 1927/BL-BO	Atual: 21.000.000,00	Original BID: 21.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 11.219.542,71	Corrente BID: 21.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 53,43	Pari-passu: 86,00
Operação Relacionada:	Saldo: 9.780.457,29	Cofinanciamento/País: 3.500.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 24.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 276

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 19, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

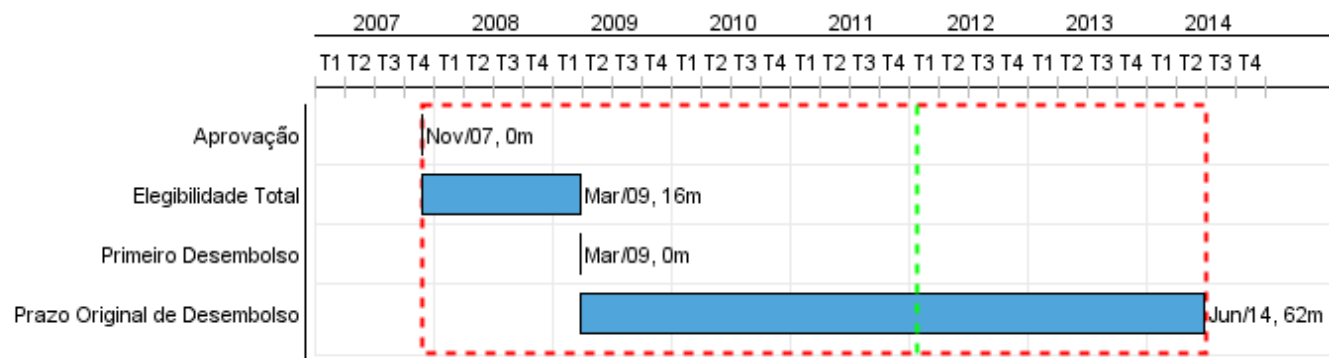

## Progresso Acumulado até 2011

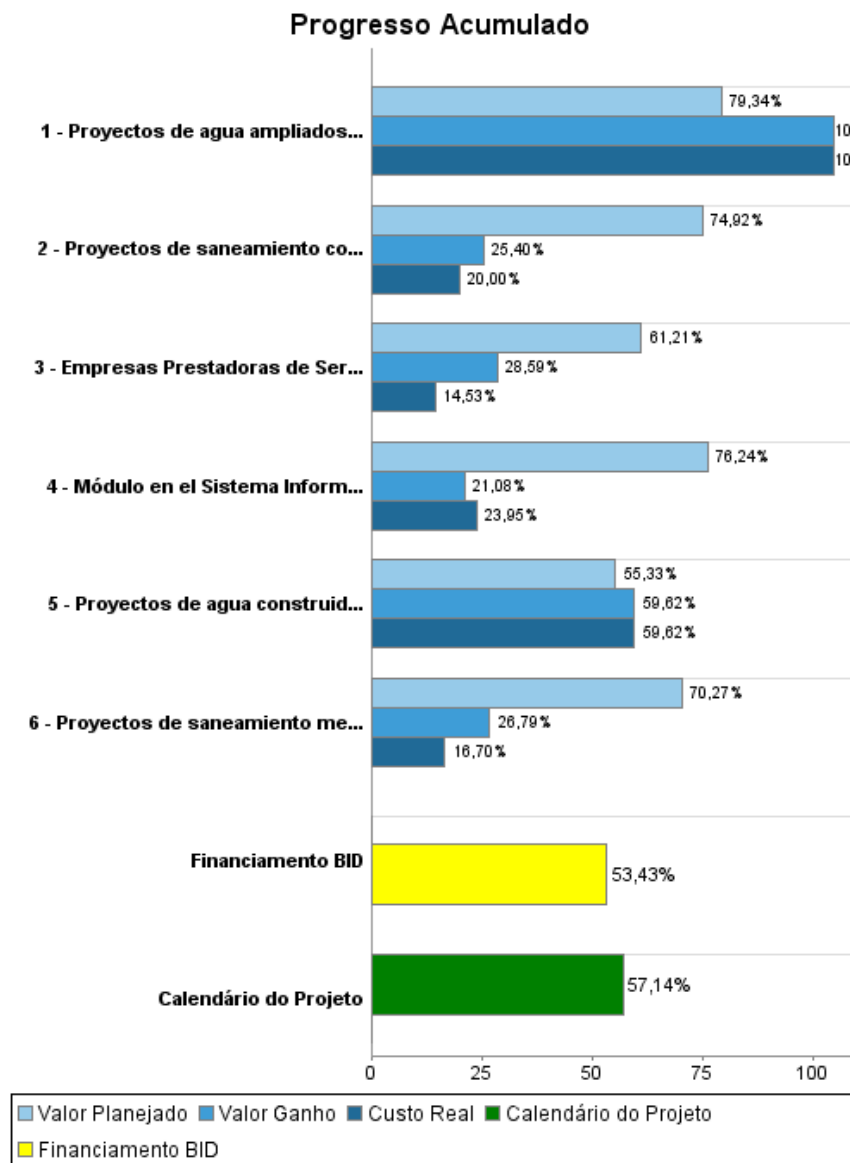

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Calidad de vida de los beneficiarios mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Hogares con suministro de agua mejorado	Hogares		2010	P A	9.127,00	9.127,00
Hogares con suministro de agua nuevo	Hogares		2010	P A	2.930,00	2.930,00
Hogares con conexiones sanitarias mejoradas	Hogares		2010	P A	4.751,00	4.751,00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Hogares		2010	P A	1.993,00	1.993,00

<b>Resultado:</b>	Sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Empresas con equilibrio financiero	Empresas		2010	P A	34,00	34,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Proyectos de agua potable y saneamiento básico</b>									
Proyectos de agua construidos hasta el final del programa	Proyectos		1,00		15,00	2.117.504,00	562.432,38		8.795.876,00
Proyectos de agua ampliados hasta el final del programa (incluye mejoramiento)	Proyectos		1,00		9,00	282.667,00	288.502,67		1.308.809,00
Proyectos de saneamiento construidos hasta el final del programa	Proyectos	8,00	2,00		21,00	2.044.103,00	95.128,92		7.705.770,00
Proyectos de saneamiento mejorados hasta el final del programa	Proyectos	1,00	1,00		2,00	178.423,00	69.964,38		1.074.544,00
<b>Desarrollo Comunitario</b>									
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado EPSAS con estado financiero	Empresas	10,00	5,00		34,00	948.166,00	76.065,21		2.832.750,00
<b>Fortalecimiento institucional</b>									
Módulo en el Sistema Informático de administración de proyectos implementado	Módulo	1,00			1,00	659.262,00	32.092,66		1.121.363,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.230.125,00</b>	<b>1.124.186,22</b>		<b>22.839.112,00</b>
