
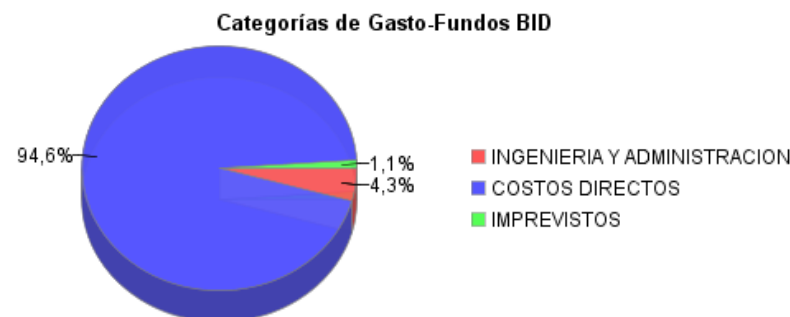
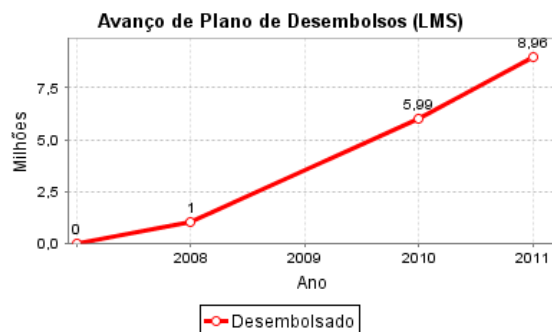



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Administradora Boliviana de Carreteras		
Sector: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS		
Número da Operação: 1940/BL-BO	Atual: 21.000.000,00	Original BID: 21.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 8.727.759,45	Corrente BID: 21.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 41,56	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1065	Saldo: 12.272.240,55	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 21.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

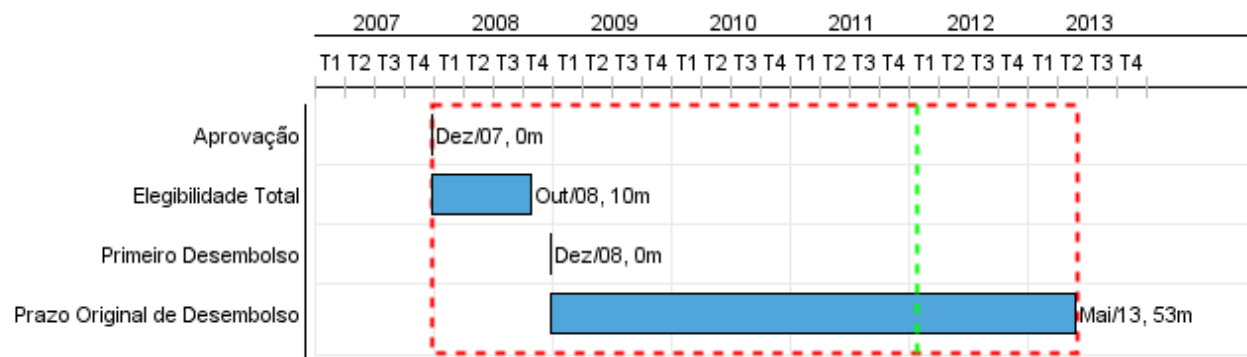

Progresso Acumulado até 2011

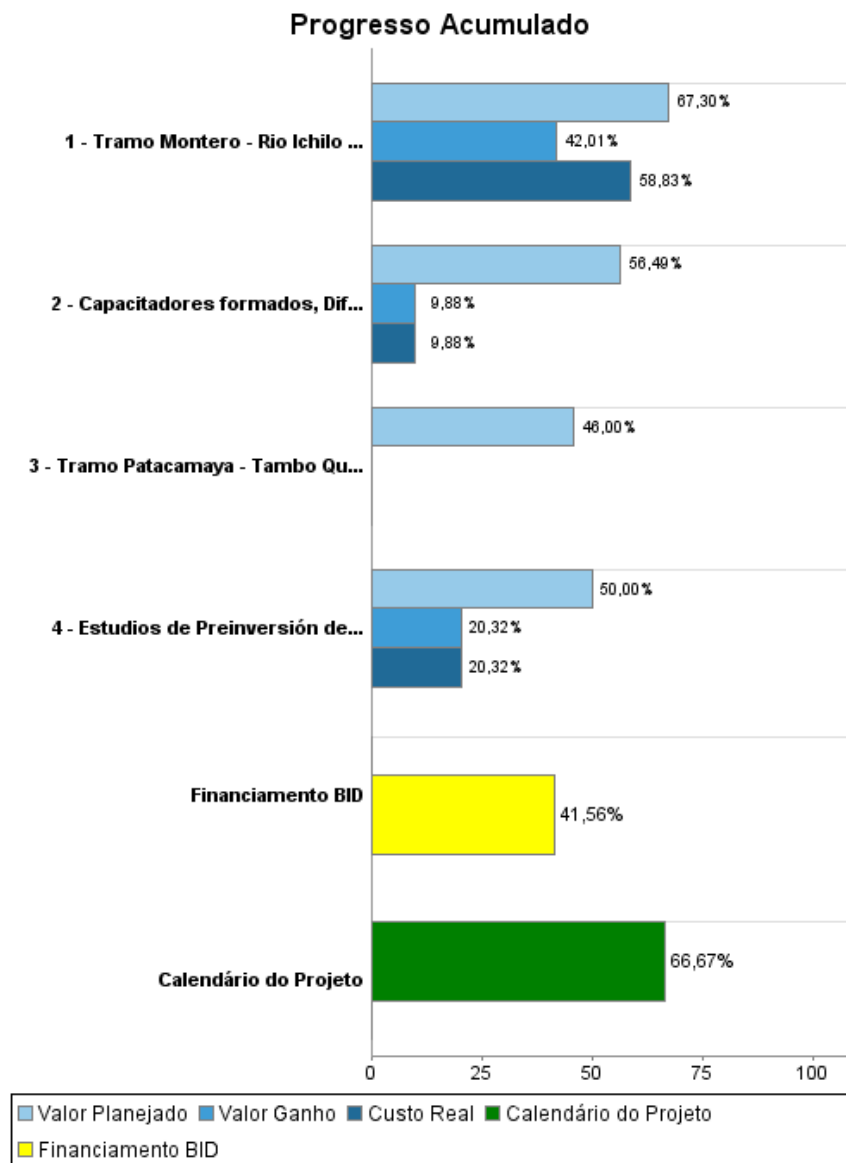

Resultados

Resultado: Patrimônio vial del país preservado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Índice promedio de estado en los Km pavimentados intervenidos.	Índice	60,00	2010	P A				90,00
Opinión favorable de los usuarios respecto a los Km intervenidos por el Programa.	Porcentaje	100,00	2010	P A				120,00

Resultado: Incremento de la seguridad vial en los tramos intervenidos por el programa.

Resultado: Costos de transporte reducidos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Costo de operación vehicular en los Km intervenidos por el Programa.	\$/Km/vehículo		2010	P A			3,00	3,00
Índice de Estado	Índice	50,00	2010	P A				90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Obras de mantenimiento vial por estándares									
Tramo Montero - Rio Ichilo - Ivirgarzama - Puerto Villarroel, Mantenido por Estandares.	Kilómetros	219,00			219,00	2.273.230,00	1.938.560,00		11.526.200,00
Tramo Patacamaya - Tambo Quemado, Mantenido por Estandares.	Kilómetros	188,00			188,00	2.520.750,00			8.130.000,00
Componente 2. Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de la ABC									
Capacitadores formados, Difusión Socio-Ambiental realizada, Contratistas y Microempresarios capacitados, Sistema de Gestión Ambiental implementada.	Personas				155,00	108.620,00	2.170,00		210.000,00
Componente 3. Ingeniería y Administración									
Estudios de Preinversión de proyectos que posibiliten replicar la modalidad al resto de la red ejecutados	Estudios				2,00	45.000,00			150.000,00
TOTAL						4.947.600,00	1.940.730,00		20.016.200,00
