
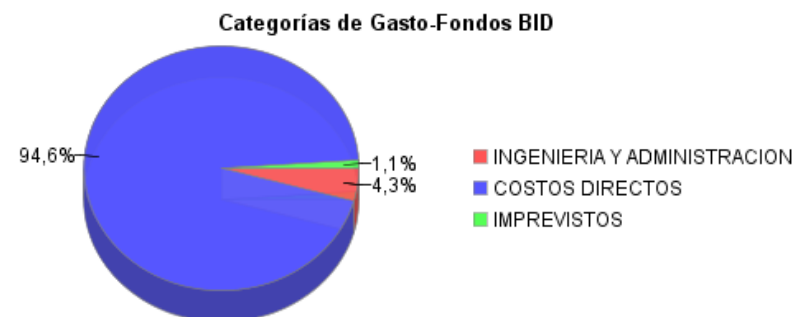
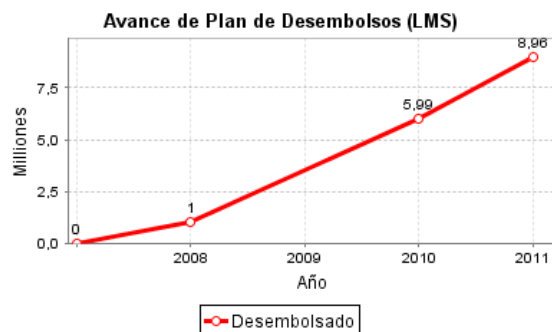



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Administradora Boliviana de Carreteras		
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS		
Número(s) de Préstamo:	1940/BL-BO	Monto Aprobado Actual: 21.000.000,00	BID Original: 21.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 8.727.759,45	Actual BID: 21.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 41,56	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1065	Saldo: 12.272.240,55	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 21.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011

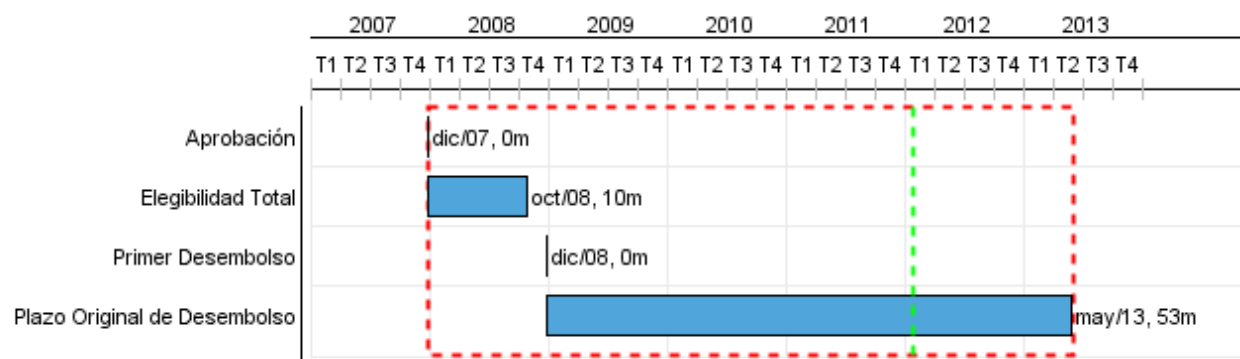

## Progreso Acumulado al 2011

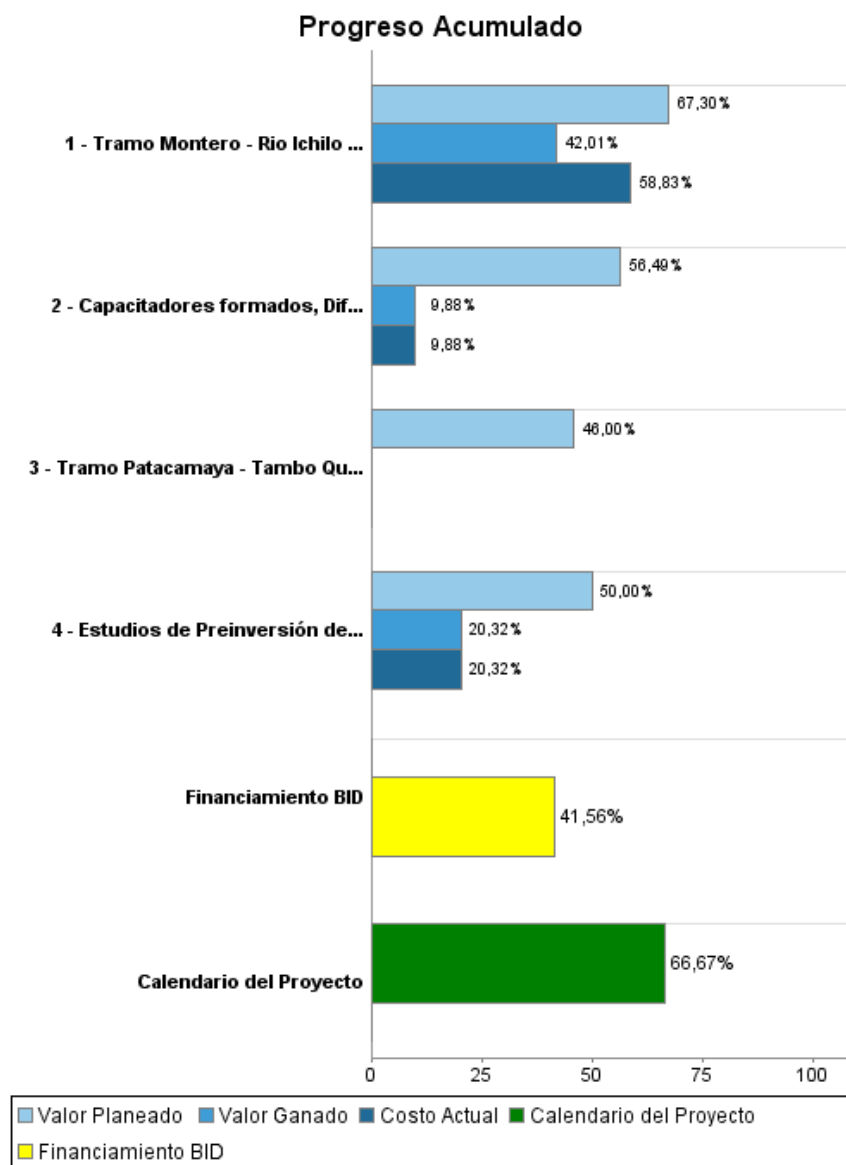

## Resultados

**Resultado:** Patrimonio vial del país preservado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Índice promedio de estado en los Km pavimentados intervenidos.	Índice	60,00	2010	P				90,00
				A				
Opinión favorable de los usuarios respecto a los Km intervenidos por el Programa.	Porcentaje	100,00	2010	P				120,00
				A				

**Resultado:** Incremento de la seguridad vial en los tramos intervenidos por el programa.

**Resultado:** Costos de transporte reducidos.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Costo de operación vehicular en los Km intervenidos por el Programa.	\$/Km/vehículo		2010	P			3,00	3,00
				A				
Índice de Estado	Índice	50,00	2010	P				90,00
				A				

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1. Obras de mantenimiento vial por estándares</b>									
Tramo Montero - Rio Ichilo - Ivirgarzama - Puerto Villarroel, Mantenido por Estandares.	Kilómetros	219,00			219,00	2.273.230,00	1.938.560,00		11.526.200,00
Tramo Patacamaya - Tambo Quemado, Mantenido por Estandares.	Kilómetros	188,00			188,00	2.520.750,00			8.130.000,00
<b>Componente 2. Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de la ABC</b>									
Capacitadores formados, Difusión Socio-Ambiental realizada, Contratistas y Microempresarios capacitados, Sistema de Gestión Ambiental implementada.	Personas				155,00	108.620,00	2.170,00		210.000,00
<b>Componente 3. Ingeniería y Administración</b>									
Estudios de Preinversión de proyectos que posibiliten replicar la modalidad al resto de la red ejecutados	Estudios				2,00	45.000,00			150.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.947.600,00</b>	<b>1.940.730,00</b>		<b>20.016.200,00</b>
