
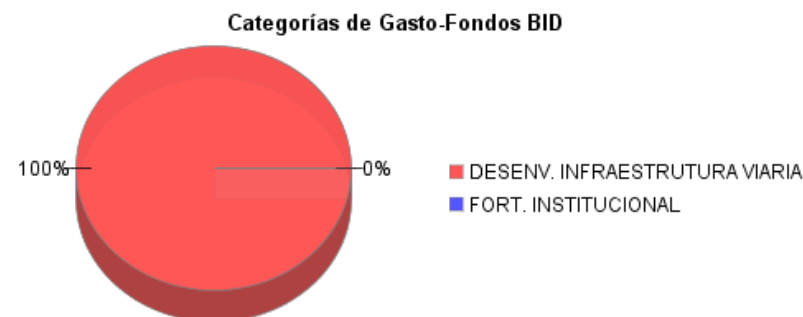
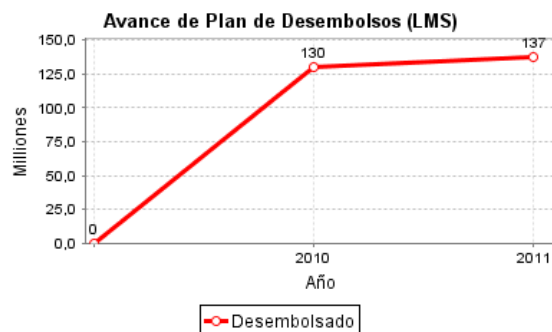



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MINAS GERAIS				
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Número(s) de Préstamo:	2306/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	137.000.000,00	BID Original:	137.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	130.000.000,00	Actual BID:	137.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	94,89	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	7.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples			Estimado Original:	137.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011 Validado por Representante de País: Sep 28, 2011

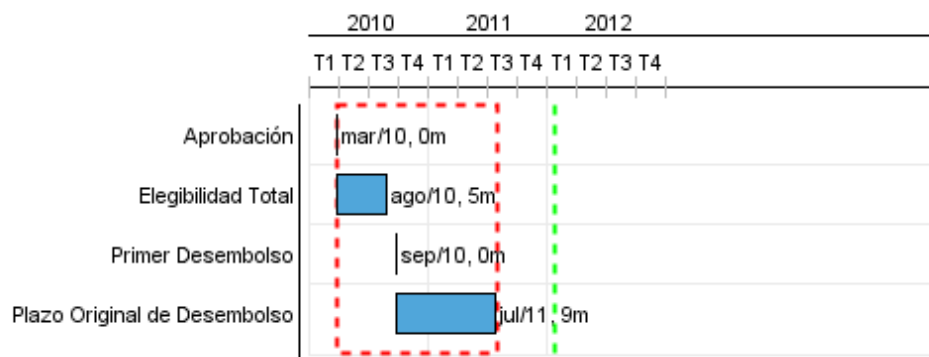

Progreso Acumulado al 2011

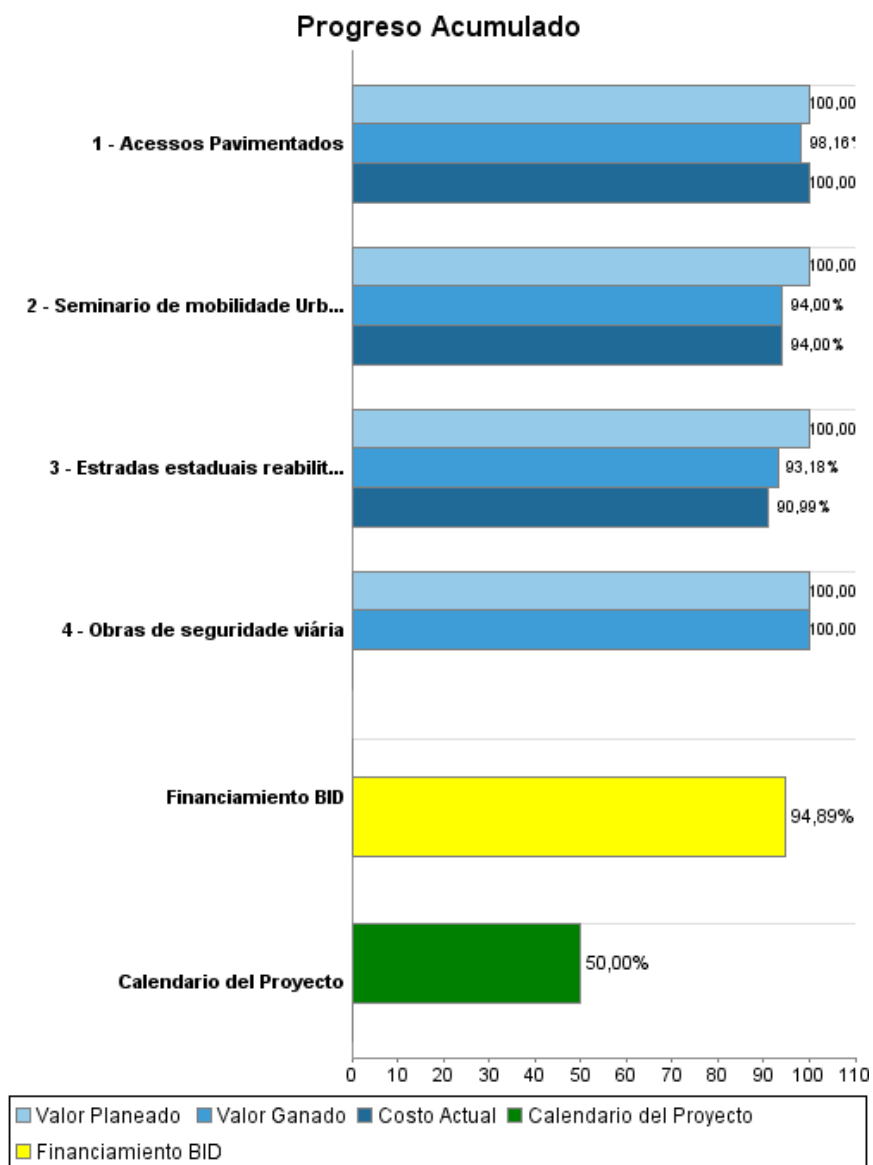

Resultados

Resultado:	Condições de transitabilidade melhoradas
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Rede viária pavimentada do Estado mantida com contratos do PROMG	km	15.700,00	2008	P A	22.294,00
Número de municípios com acesso pavimentado	Unidade	737,00	2008	P A	847,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Infraestructura viária estadual desenvolvida.									
Acessos Pavimentados	Quilômetro	1.020,00	500,00		5.100,00	3.735.000,00			103.735.000,00
Estradas estaduais reabilitadas	Quilômetro	2.510,00	1.000,00		9.340,00	3.265.000,00			28.815.000,00
Obras de seguridade viária	Quilômetro	60,00	40,00		120,00				4.400.000,00
Fortalecimento Institucional									
Seminario de mobilidade Urbana da RMBH realizado	seminario	1,00			1,00				50.000,00
TOTAL						7.000.000,00			137.000.000,00
