
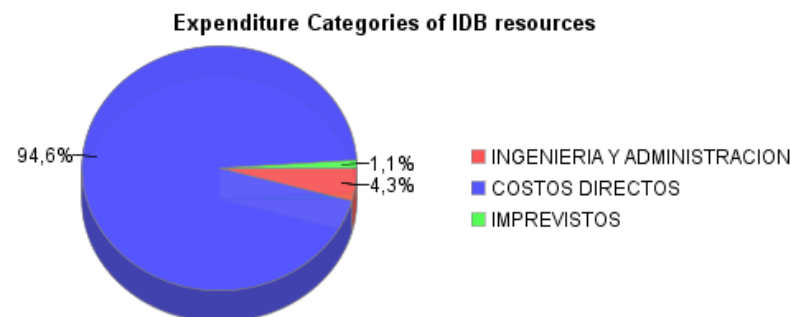
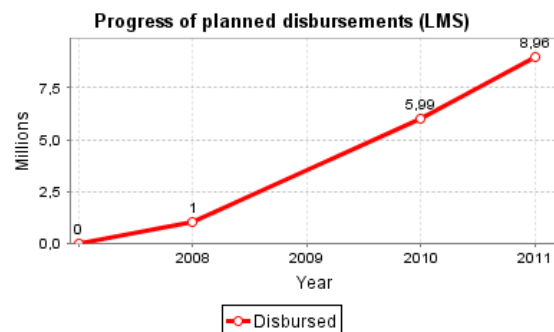



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Administradora Boliviana de Carreteras				
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Loan Number(s):	1940/BL-BO	Current Approved Amount:	21.000.000,00	Original IDB:	21.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	8.727.759,45	Current IDB:	21.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	41,56	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	BO-T1065	Balance:	12.272.240,55	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	21.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 23, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011

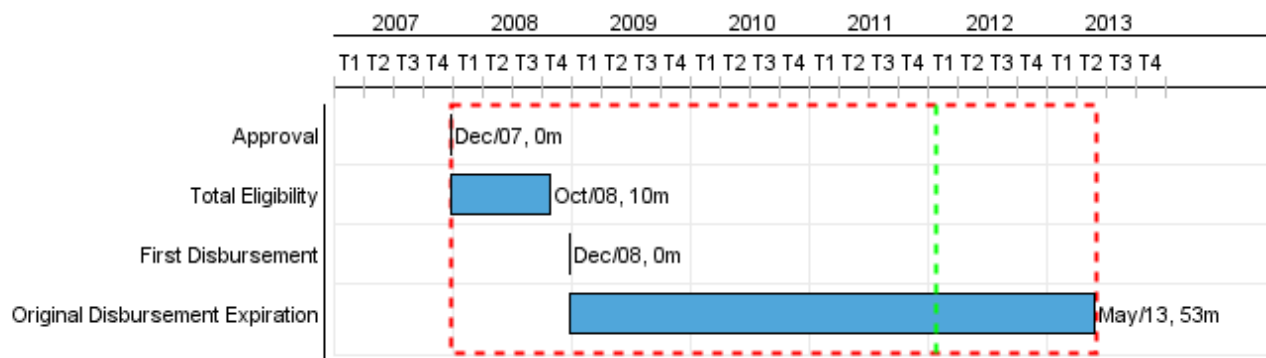

## Accumulated Progress as of 2011

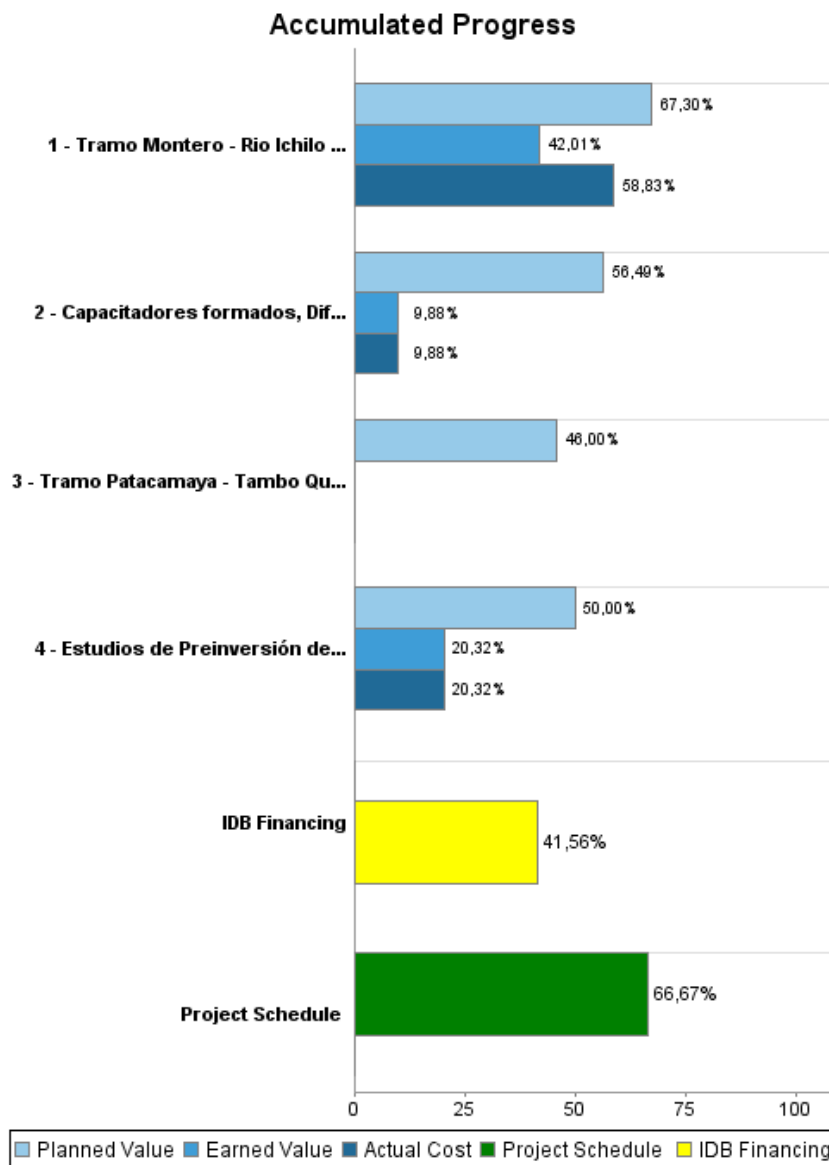

## Outcomes

**Outcome:** Patrimonio vial del país preservado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Índice promedio de estado en los Km pavimentados intervenidos.	Índice	60,00	2010	P A				90,00
Opinión favorable de los usuarios respecto a los Km intervenidos por el Programa.	Porcentaje	100,00	2010	P A				120,00

**Outcome:** Incremento de la seguridad vial en los tramos intervenidos por el programa.

**Outcome:** Costos de transporte reducidos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Costo de operación vehicular en los Km intervenidos por el Programa.	\$/Km/vehículo		2010	P A			3,00	3,00
Índice de Estado	Índice	50,00	2010	P A				90,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente 1. Obras de mantenimiento vial por estándares</b>									
Tramo Montero - Rio Ichilo - Ivirgarzama - Puerto Villarroel, Mantenido por Estándares.	Kilómetros	219,00			219,00	2.273.230,00	1.938.560,00		11.526.200,00
Tramo Patacamaya - Tambo Quemado, Mantenido por Estándares.	Kilómetros	188,00			188,00	2.520.750,00			8.130.000,00
<b>Componente 2. Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de la ABC</b>									
Capacitadores formados, Difusión Socio-Ambiental realizada, Contratistas y Microempresarios capacitados, Sistema de Gestión Ambiental implementada.	Personas				155,00	108.620,00	2.170,00		210.000,00
<b>Componente 3. Ingeniería y Administración</b>									
Estudios de Preinversión de proyectos que posibiliten replicar la modalidad al resto de la red ejecutados	Estudios				2,00	45.000,00			150.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.947.600,00</b>	<b>1.940.730,00</b>		<b>20.016.200,00</b>
