

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE VIVIENDA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número da Operação:	2072/OC-PN
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	30.000.000,00
Desembolsado:	3.664.172,81
% Desembolsado:	12,21
Saldo:	26.335.827,19

### Custo Total e Fonte

Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	91,35
Cofinanciamento/País:	1.500.000,00
Original Estimado:	31.500.000,00
Período de Amortização (meses):	246

### Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

### Reformulação


B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 7, 2011  
Validado pelo Representante do País: Apr 11, 2011

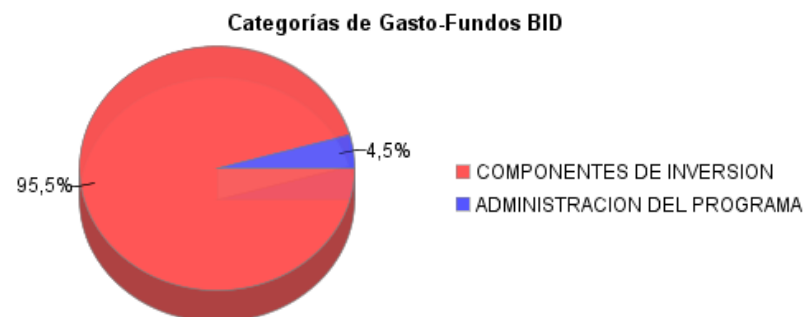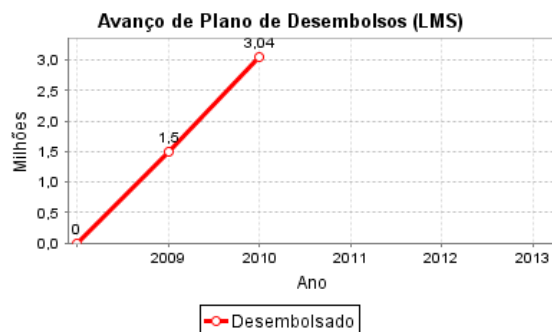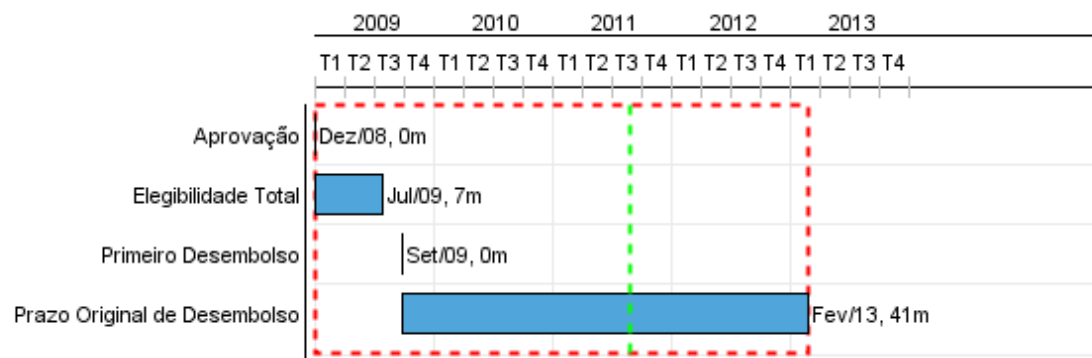

## Progresso Acumulado até 2010

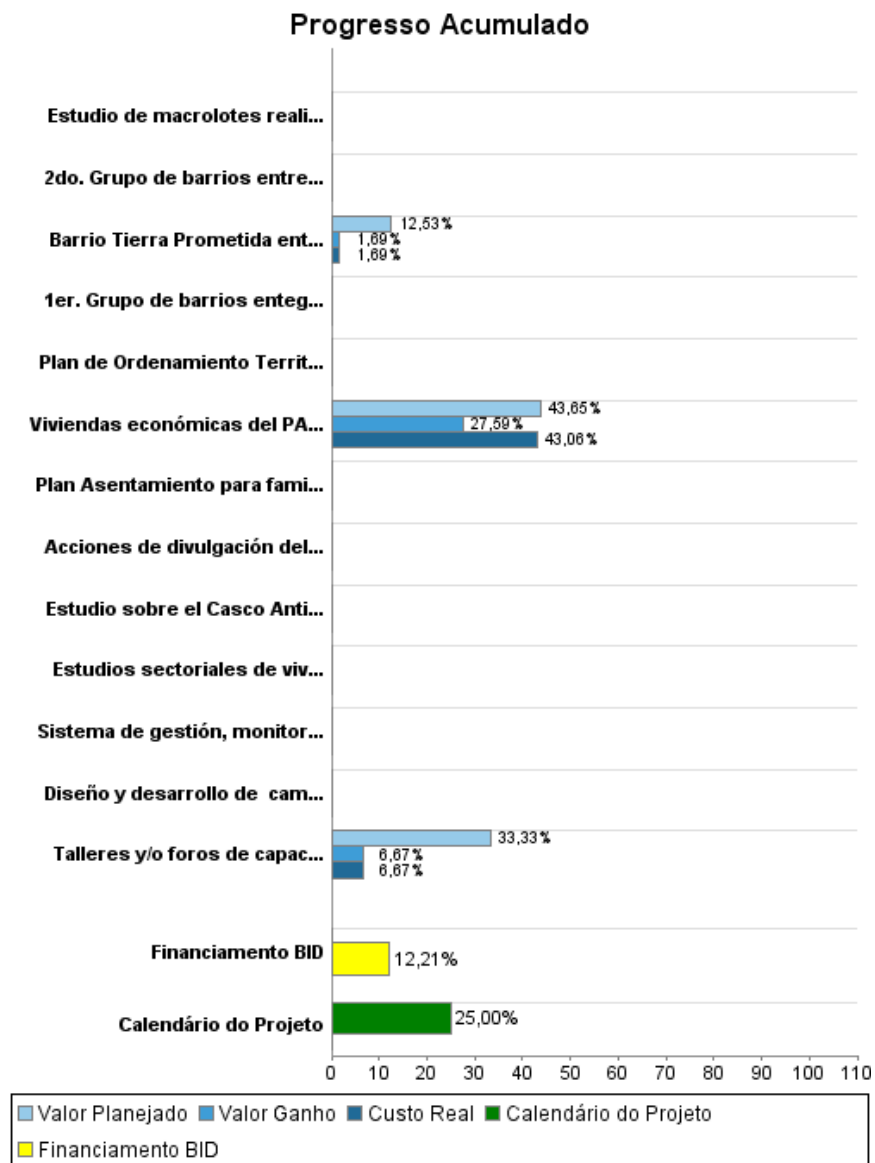

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Población residente en asentamientos informales	Familias	37.000,00	2005	P A	35.400,00	35.400,00
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza	Hogares	79.000,00	2005	P A	75.000,00	77.000,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA</b>									
Barrio Tierra Prometida entregado.	Barrio				1,00	1.000.000,00	135.000,00		7.980.000,00
1er. Grupo de barrios entregado (Edgardo Vernaza, Nva. Libia y Nao Gonzalillo)	Barrios				1,00				4.020.000,00
2do. Grupo de barrios entregado (Villa Milagros, Alto del Lirio, Progreso No.1 y La Primavera)	Barrios				1,00				9.000.000,00
<b>Componente II. Viviendas sociales - PARVIS</b>									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	250,00	158,00		592,00	3.300.000,00	3.255.600,00		7.560.000,00
<b>Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuration del proyecto (agosto 2010)</b>									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
<b>Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional</b>									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones		1,00		3,00	50.000,00	10.000,00		150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema				2,00				230.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00				70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano	Estudio				3,00				45.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa	campaña				1,00				50.000,00
Acciones de divulgación del Programa ( campañas anuales)	Campaña				3,00				175.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martin aprobado.	POT				1,00				300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora.	Plan				1,00				200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.350.000,00</b>	<b>3.400.600,00</b>		<b>29.880.000,00</b>
