
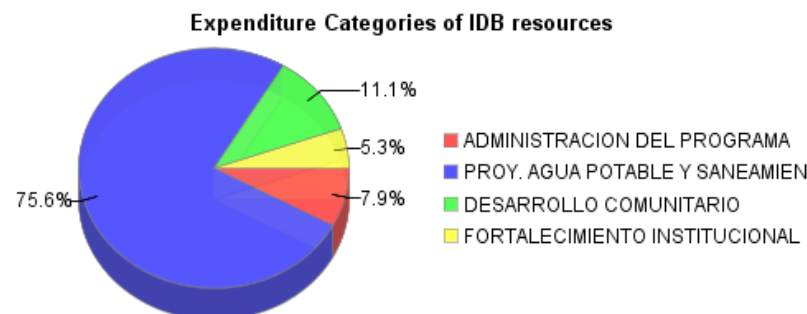
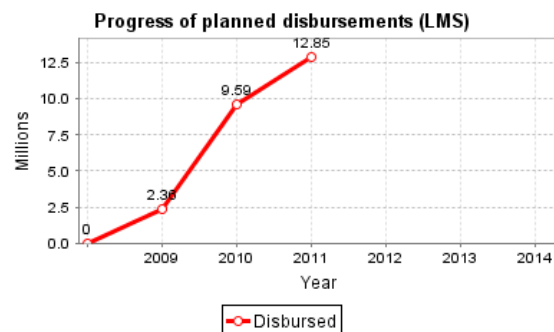



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	1927/BL-BO	Current Approved Amount:	21.000.000,00	Original IDB:	21.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	12.847.842,32	Current IDB:	21.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	61,18	Pari-passu:	86,00
Related Operation(s):		Balance:	8.152.157,68	Co-Financing/Country:	3.500.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	24.500.000,00
				Amortization Period (months):	276

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 15-mar-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012

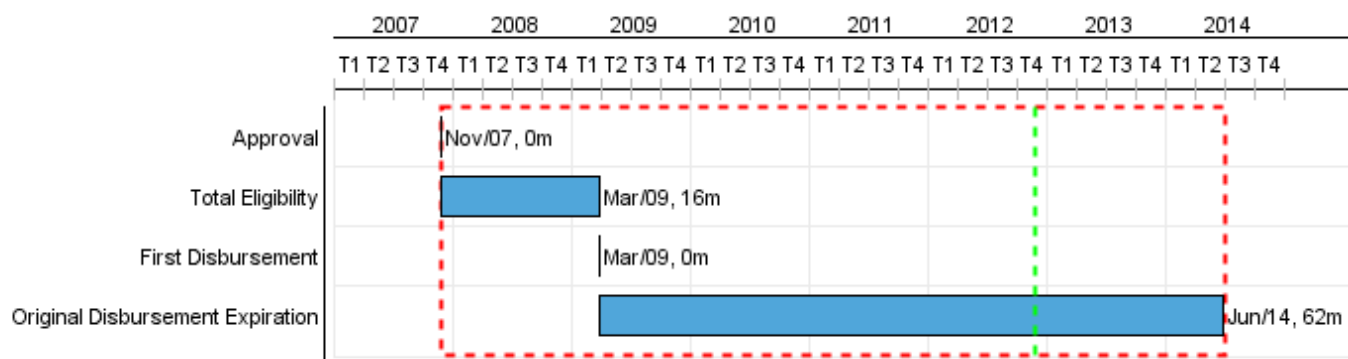

Accumulated Progress as of 2011

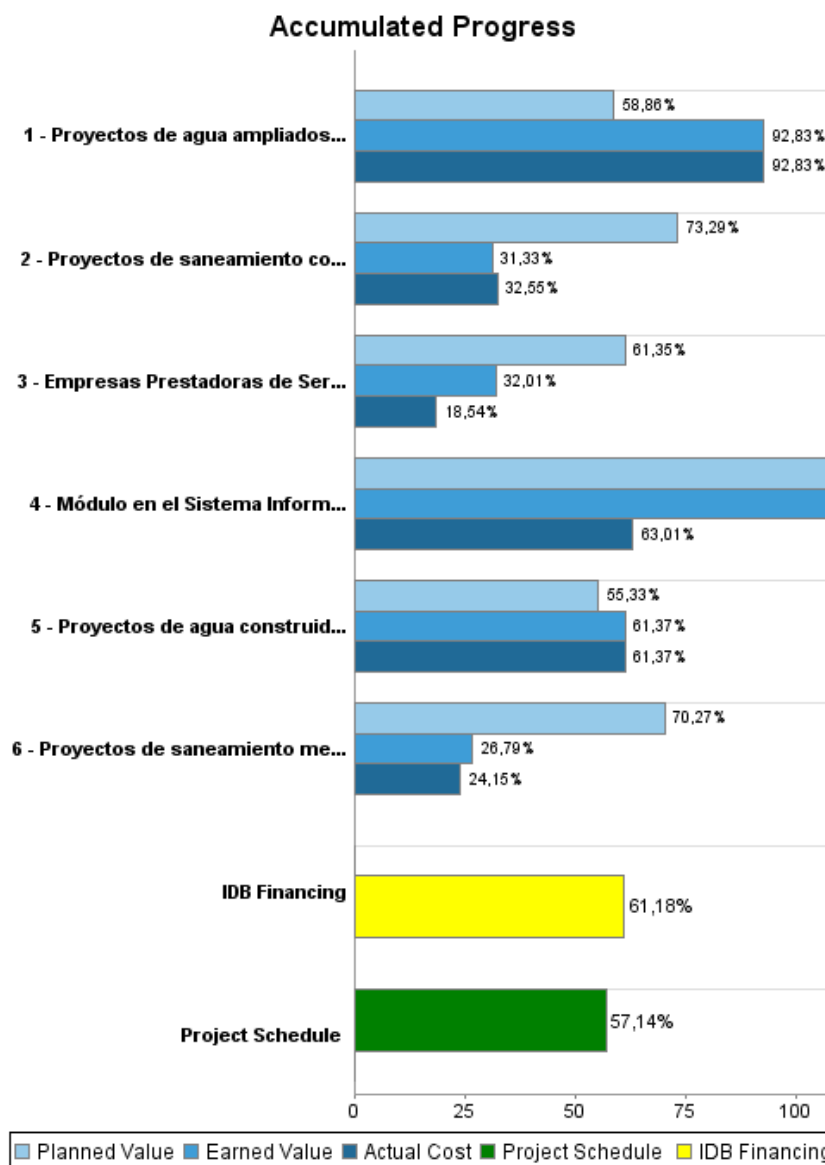

Outcomes

Outcome:	Calidad de vida de los beneficiarios mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Hogares con suministro de agua mejorado	Hogares	2,068.00	2008	P A	9.127,00
Hogares con suministro de agua nuevo	Hogares	3,450.00	2008	P A	2.930,00
Hogares con conexiones sanitarias mejoradas	Hogares		2008	P A	4.751,00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Hogares		2010	P A	1.993,00

Outcome:	Sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Empresas con equilibrio financiero	Empresas		2010	P A	34,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Proyectos de agua potable y saneamiento básico									
Proyectos de agua construidos hasta el final del programa	Proyectos		1,00		18,00	2.117.504,00	715.887,90		8.795.876,00
Proyectos de agua ampliados hasta el final del programa (incluye mejoramiento)	Proyectos		3,00		9,00	282.667,00	553.611,11		1.764.392,00
Proyectos de saneamiento construidos hasta el final del programa	Proyectos	8,00	4,00		21,00	2.044.103,00	1.118.247,70		7.877.063,00
Proyectos de saneamiento mejorados hasta el final del programa	Proyectos	1,00	1,00		3,00	178.423,00	149.999,69		1.074.544,00
Desarrollo Comunitario									
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado EPSAS con estado financiero	Empresas	10,00	6,00		39,00	948.166,00	188.386,13		2.826.000,00
Fortalecimiento institucional									
Módulo en el Sistema Informático de administración de proyectos implementado	Módulo	1,00	1,00		1,00	659.262,00	78.726,08		500.149,00
TOTAL						6.230.125,00	2.804.858,61		22.838.024,00
