
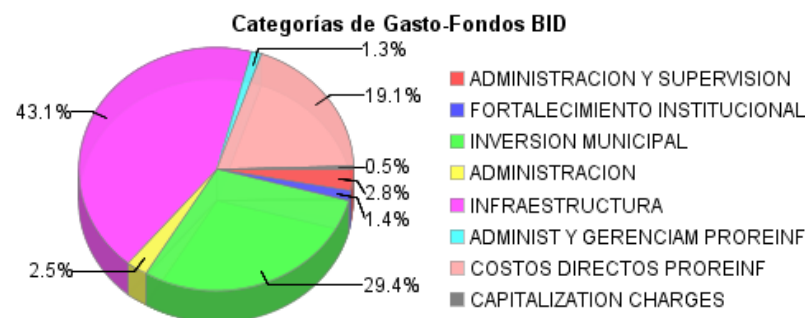
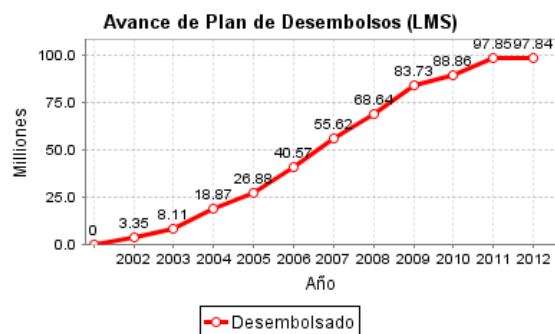



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS			
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH			
Número(s) de Préstamo:	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Monto Aprobado Actual:	162.323.183,63	BID Original: 151.600.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	162.323.183,63	Actual BID: 162.323.183,63
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu: 86,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:		Co-financiamiento/País: 7.600.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original: 159.200.000,00
				Período de Amortización (meses): 456

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 24-sep-2012 Validado por Representante de País: 26-sep-2012

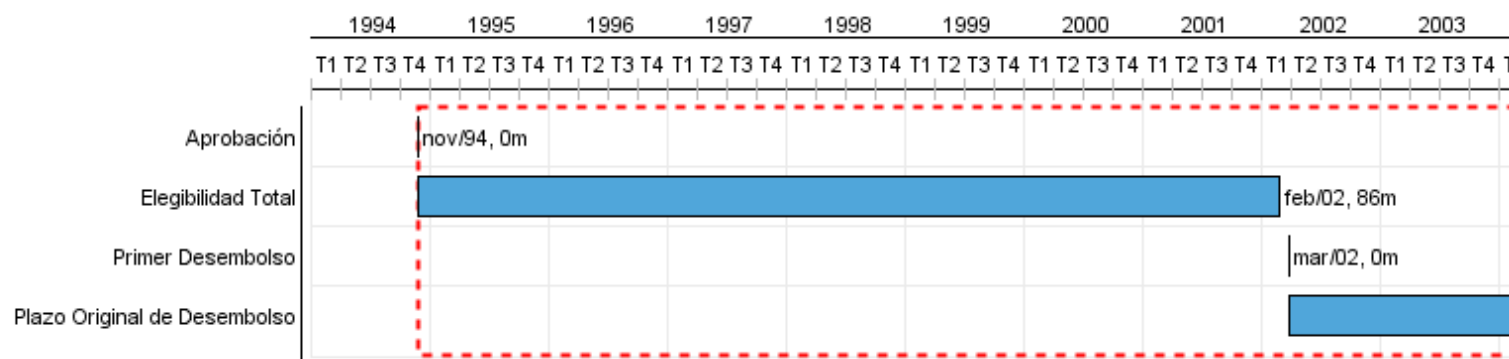

Progreso Acumulado al 2012

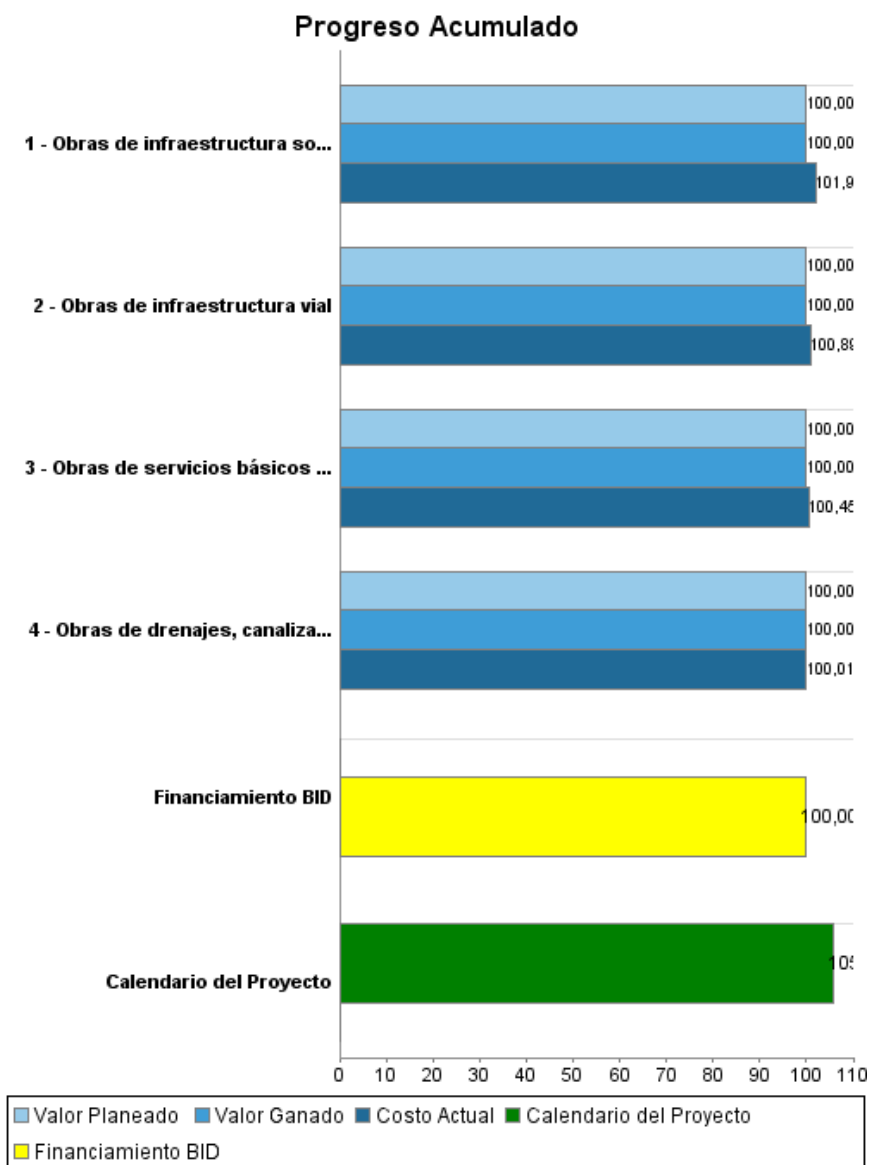

Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Obras de reposición									
Obras de infraestructura vial	Obras				97,00				6.905.603,00
Obras de drenajes, canalizaciones y protección y mitigación de riesgo	Obras				171,00				10.540.670,94
Obras de servicios básicos urbanos	Obras				2,00				40.730,31
Obras de infraestructura social	Obras				40,00				1.112.995,74
Administración del Programa									
Administración	N/A								1.400.000,00
TOTAL									19.999.999,99
