
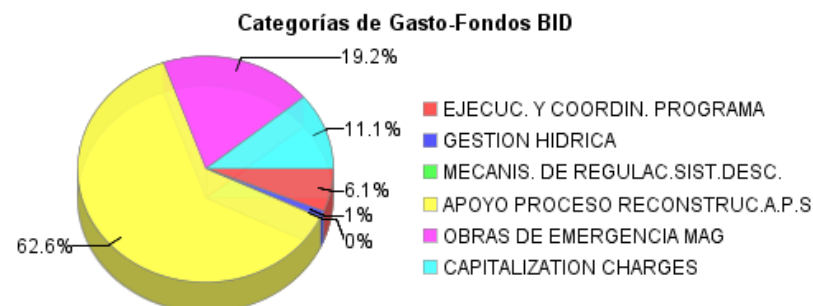




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	COMISION COORDINADORA DE REFORMA SECTORIAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	1102/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	41.575.465,57
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	41.575.465,57
Tipo de Operación:	LON - Operación de Prestamo	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC9911141	Saldo:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	43.700.000,00
		Actual BID:	41.575.465,57
		Pari-passu:	73,50
		Co-financiamiento/País:	11.300.000,00
		Estimado Original:	55.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	162

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R) ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 25-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012

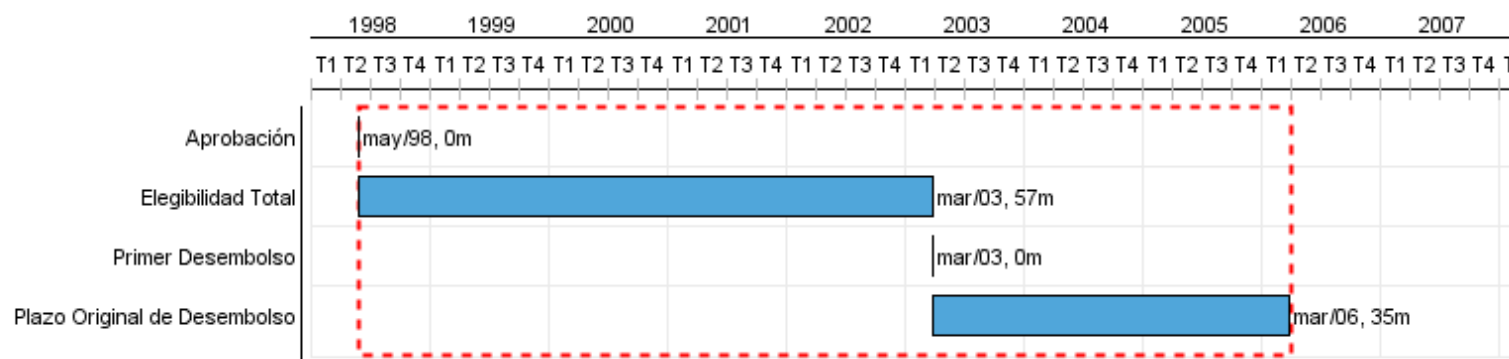

## Progreso Acumulado al 2012

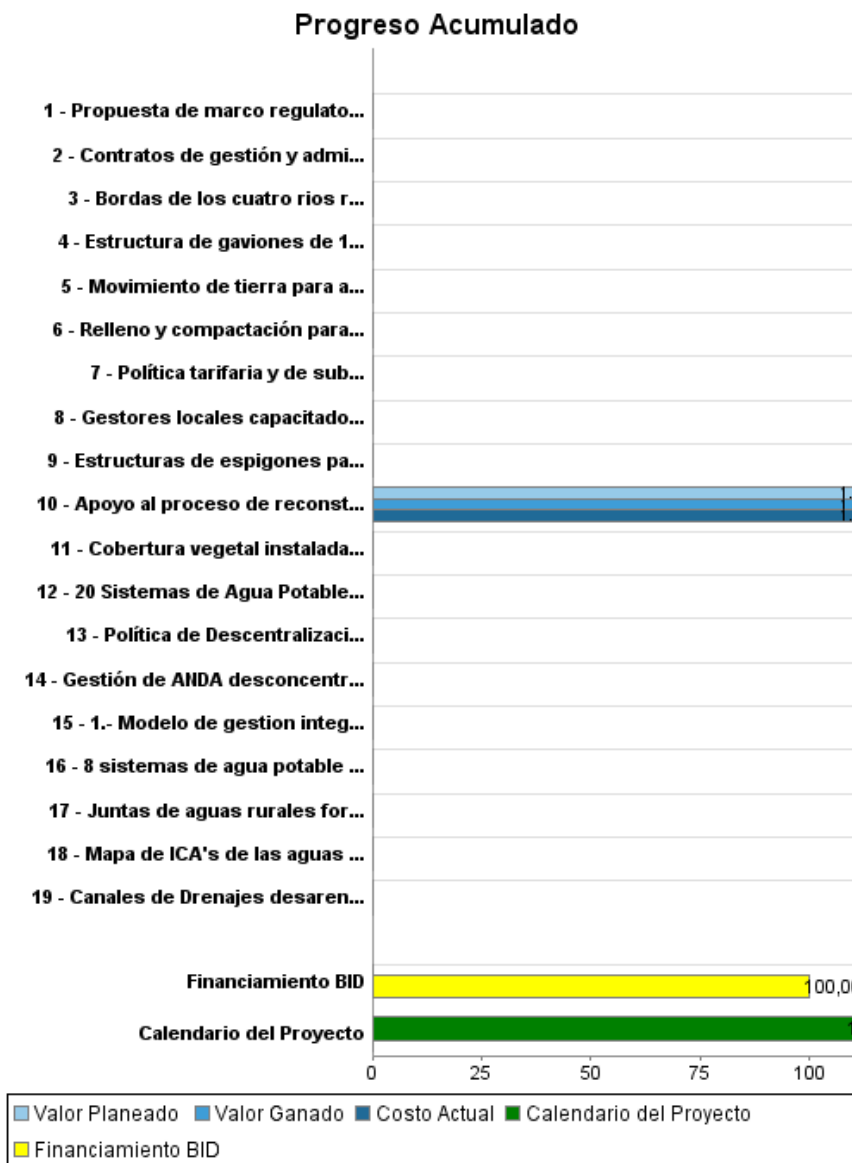

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicio de agua potable, por medio de la prestación del servicio por empresas descentralizadas Sostenibles
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	Fin de Proyecto
Empresas descentralizadas operando sistemas de agua potable cumplen con índices de sostenibilidad financiera y de eficiencia en la continuidad de la prestación del servicio de AP, publicado por la unidad de contratos de gestión y/o administración de s	Empresas		1998	P	12.00	16.00	16.00
				A	15.00	15.00	

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>1.- Gestión Hídrica en apoyo a la reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento descentralizados funcionando</b>									
1.- Modelo de gestión integral de cuenca hidrográfica implementado y operando en dos microregiones en donde existen Empresas descentralizadas	U.				2,00				
Mapa de ICA's de las aguas superficiales y subterráneas publicado y actualizado de dos microregiones en donde existen empresas descentralizadas	U.				2,00				
Gestores locales capacitados en gestión de recursos hídricos en empresas descentralizadas	U.				6,00				
<b>2. Mecanismos Reguladores desarrollados y operando en los sistemas de agua potable y saneamiento reconstruidos y descentralizados.</b>									
Propuesta de marco regulatorio y tarifario para la prestación de servicios de las APS	Propuesta presentada				1,00				
Contratos de gestión y administración para la prestación de los servicios de agua potable implementados con empresas descentralizadas	Contratos de administración				10,00				
Política tarifaria y de subsidios operando en empresas de APS descentralizadas	contratos de administración que incorporan las regulaciones del rubro de tarifas y subsidios				10,00				
Política de Descentralización y desconcentración de ANDA aprobada	documento de política aprobado				1,00				
<b>Obras de Emergencia del MAG</b>									
Bordas de los cuatro ríos rehabilitados y/o reconstruidas	metros lineales				9.500,00				
Canales de Drenajes desarenados y limpiados	metro lineal				33.500,00				
Cobertura vegetal instalada para proteger taludes de bordas	metros cuadrados				36.250,00				

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ES0068 - Progr. de Agua Potable y Alcantarillado  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 17/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Movimiento de tierra para ampliación de sección hidráulica de ríos	metros cúbicos				40.000,00				
Relleno y compactación para estabilización de bordas	metros cúbicos				10.366,00				
Estructura de gaviones de 1mt x 1mt x 1mt instalados	metro lineal				13.176,00				
Estructuras de espigones para protección de las bordas	Espigones				46,00				
<b>Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable</b>									
Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable	%				100,00				1.416.040,43
8 sistemas de agua potable rurales rehabilitados	No. de sistemas rurales rehabilitados				8,00				
20 Sistemas de Agua Potable rehabilitados y ampliados en empresas descentralizadas	No. de sistemas intervenidos				20,00				
Gestión de ANDA desconcentrada en aquellos sistemas no descentralizados	%				100,00				
Juntas de aguas rurales fortalecidas	Juntas de Agua				8,00				
<b>TOTAL</b>									<b>1.416.040,43</b>
