
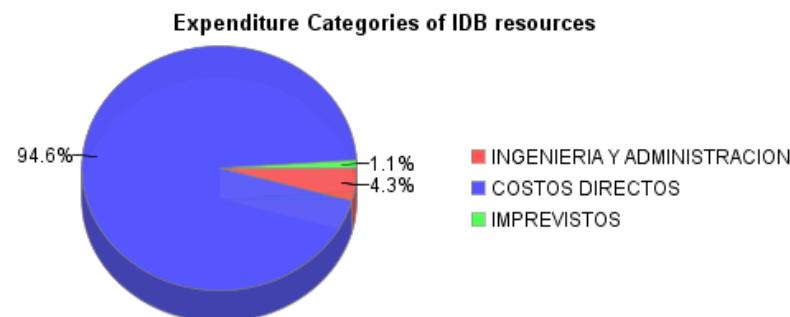
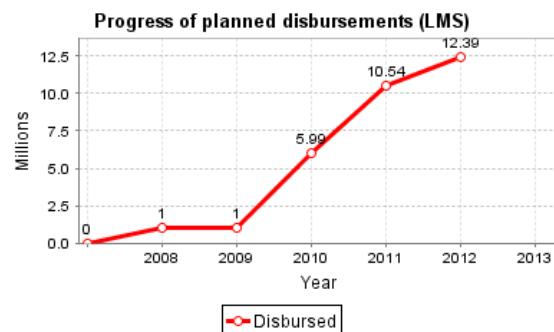



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Administradora Boliviana de Carreteras				
Sector:	TRANSPORT				
Loan Number(s):	1940/BL-BO	Current Approved Amount:	21.000.000,00	Original IDB:	21.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	10.637.114,26	Current IDB:	21.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	50,65	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	BO-T1065	Balance:	10.362.885,74	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	21.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012

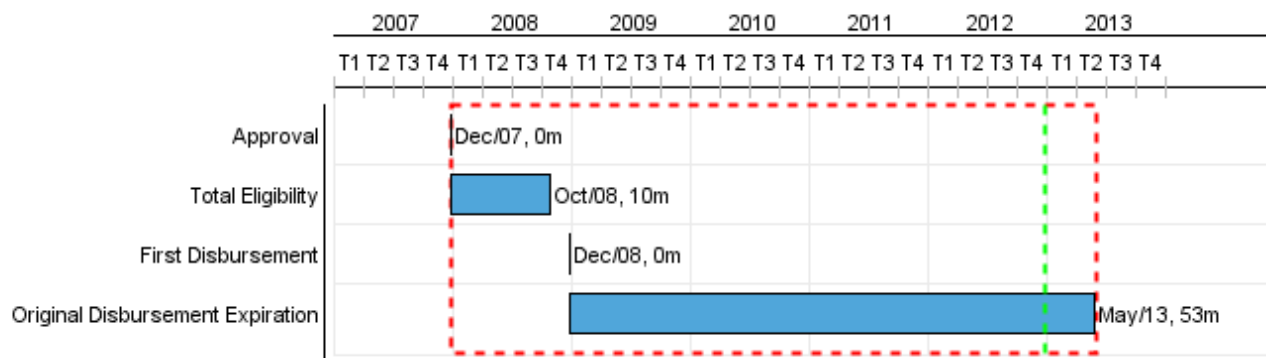

## Accumulated Progress as of 2012

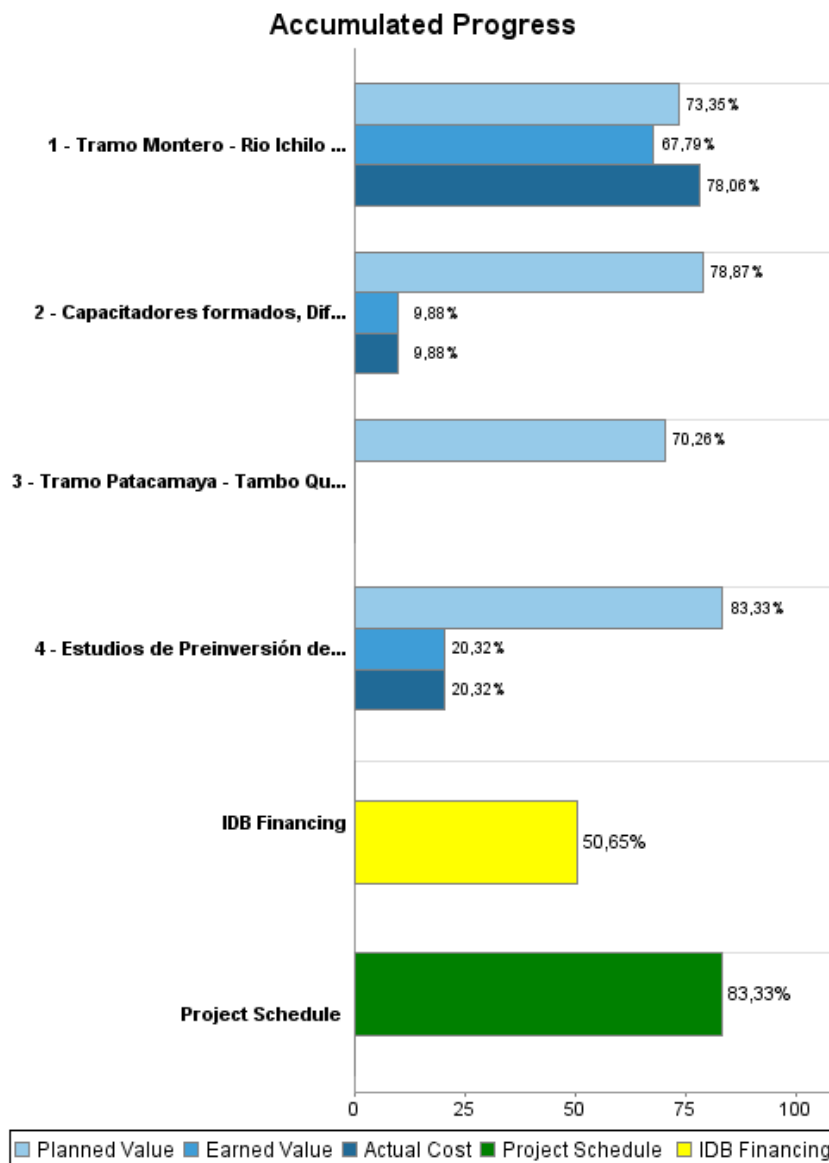

## Outcomes

**Outcome:** Patrimonio vial del país preservado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Indice promedio de estado en los Km pavimentados intervenidos.	Indice	60.00	2010	P A			90.00
Opinión favorable de los usuarios respecto a los Km intervenidos por el Programa.	Porcentaje	100.00	2010	P A			120.00

**Outcome:** Incremento de la seguridad vial en los tramos intervenidos por el programa.

**Outcome:** Costos de transporte reducidos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Costo de operación vehicular en los Km intervenidos por el Programa.	\$/Km/vehículo		2010	P A			3.00
Indice de Estado	Indice	50.00	2010	P A			90.00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente 1. Obras de mantenimiento vial por estándares</b>									
Tramo Montero - Rio Ichilo - Ivirgarzama - Puerto Villarroel, Mantenido por Estándares.	Kilómetros	219,00	219,00		219,00	697.400,00	764.000,00		11.526.200,00
Tramo Patacamaya - Tambo Quemado, Mantenido por Estándares.	Kilómetros	64,02			64,02	1.972.700,00			8.130.000,00
<b>Componente 2. Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de la ABC</b>									
Capacitadores formados, Difusión Socio-Ambiental realizada, Contratistas y Microempresarios capacitados, Sistema de Gestión Ambiental implementada.	Personas	25,00			155,00	47.000,00			210.000,00
<b>Componente 3. Ingeniería y Administración</b>									
Sistema de monitoreo y evaluación de resultados del programa implementado	N/A					60.000,00			80.000,00
Unidad Técnica de Mantenimiento por Estándares - UTME	N/A					67.000,00	31.000,00		481.610,00
Auditoría	N/A					10.000,00	11.000,00		200.000,00
Imprevistos	N/A								221.990,00
Estudios de Preinversión de proyectos que posibiliten replicar la modalidad al resto de la red ejecutados	Estudios	1,00			2,00	50.000,00			150.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.904.100,00</b>	<b>806.000,00</b>		<b>20.999.800,00</b>
