
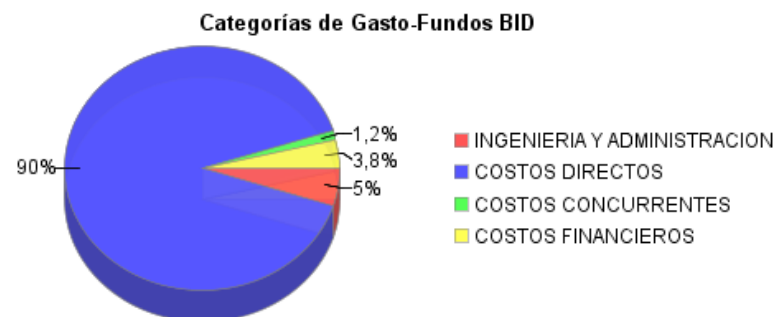
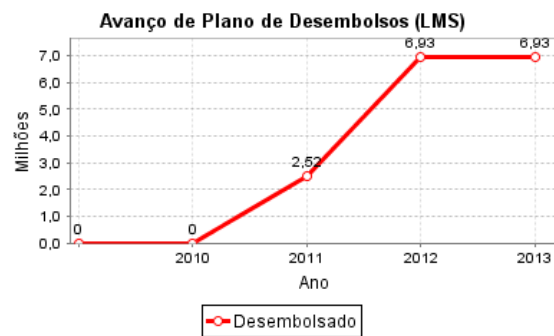



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: ALCALDIA DE MANAGUA		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING		
Número da Operação: 2243/BL-NI	Atual: 13.000.000,00	Original BID: 13.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 6.926.330,86	Corrente BID: 13.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 53,28	Pari-passu: 66,00
Operação Relacionada: NI-P1013, NI-T1042, NI-T1047	Saldo: 6.073.669,14	Cofinanciamento/País: 6.797.600,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 19.797.600,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 22-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013

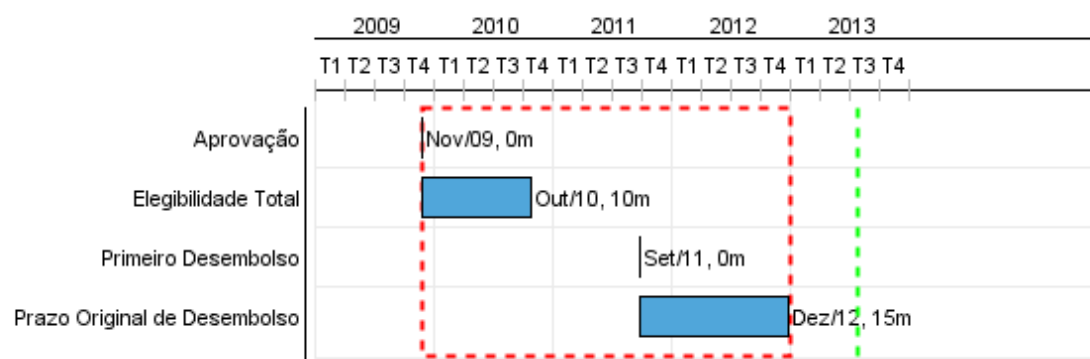

## Progresso Acumulado até 2012

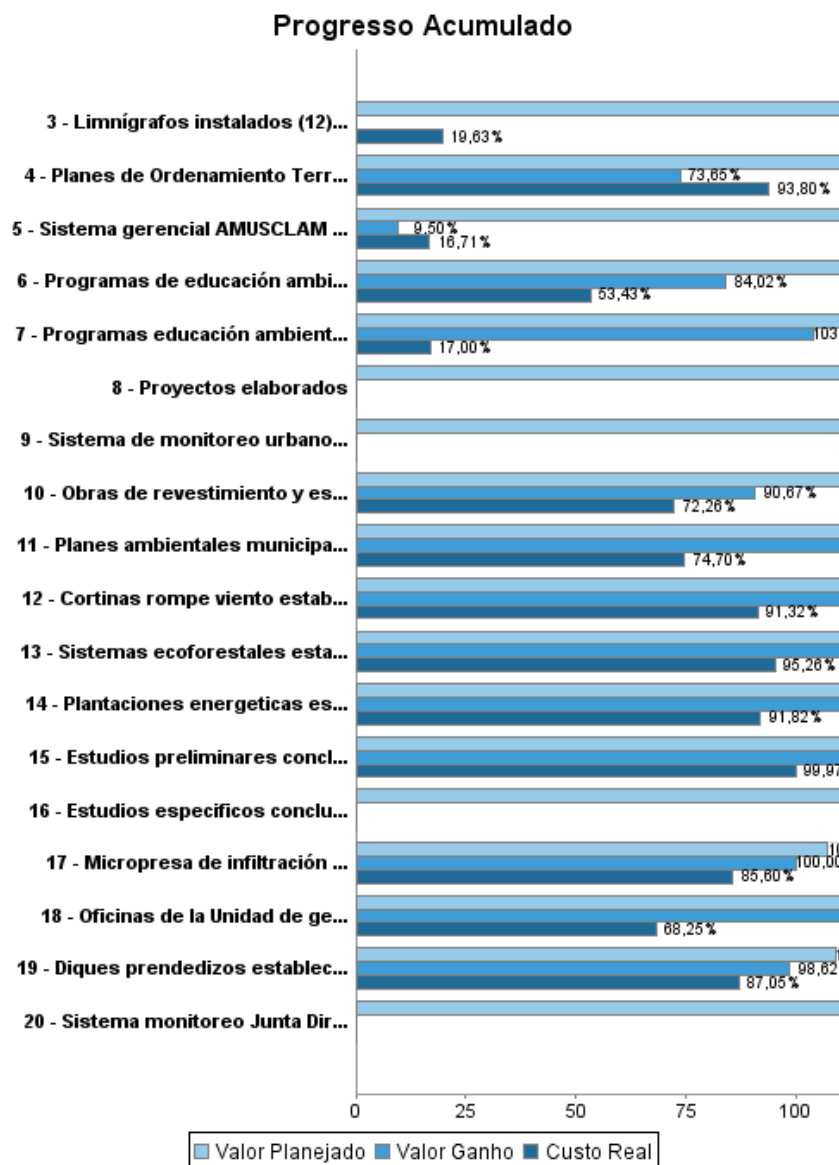

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO


NI-L1010 - Stormwater Drainage and Development Management SubWatersed III  
Managua  
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 14/03/2013

### Progresso Acumulado

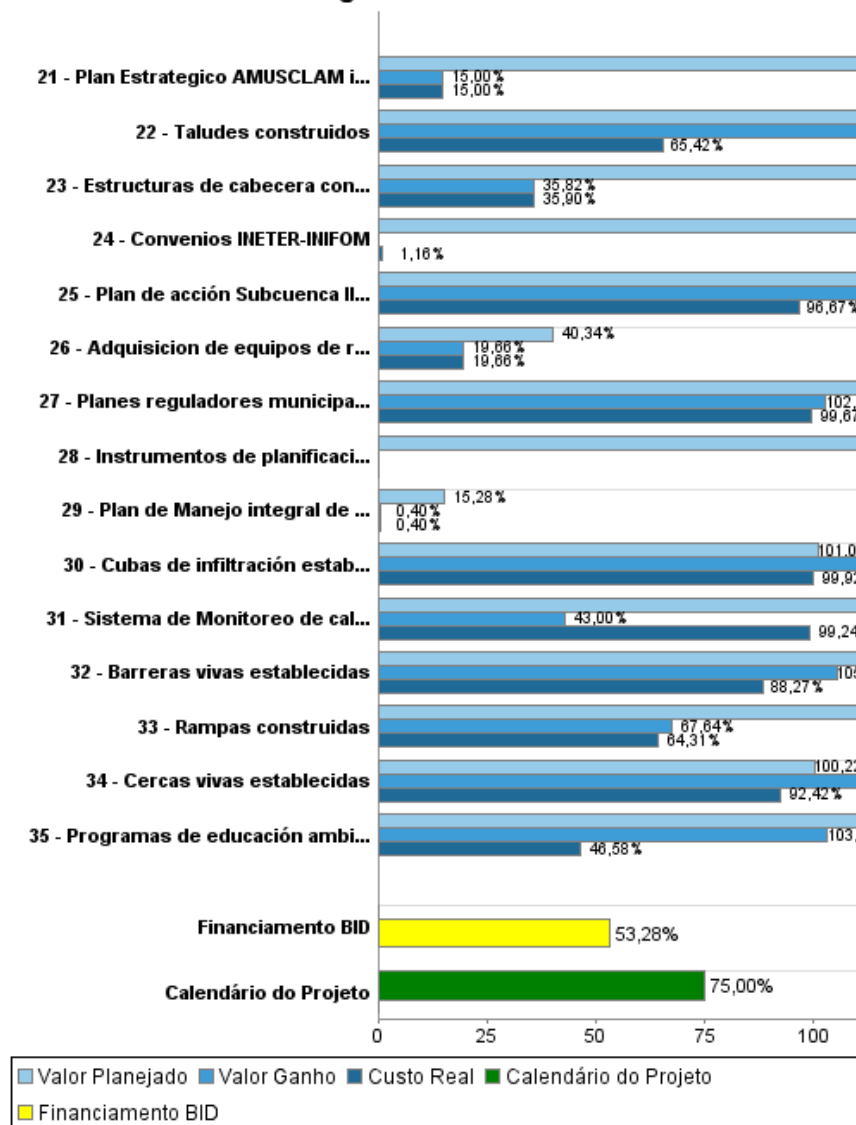

## Resultados

**Resultado:** Habitantes en riesgo de inundación reducido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Habitantes en riesgo de inundación	Habitantes	600,00	2009	P			60,00		
				A			60,00		

**Resultado:** Área de cauce recuperada (m2)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Área de cauce	metros cuadrados		2009	P			12.800,00	1.280,00	12.800,00
				A			11.520,00		

**Resultado:** Extensión de la mancha de inundación en la parte baja del Cauce 31 de Diciembre para un evento de lluvia con periodo de retorno de 25 años (Hectáreas) reducida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Extensión de la mancha de inundación (periodo de retorno 25 años)	hectáreas	177,00	2009	P					
				A					

**Resultado:** Incremento de recolección de residuos solidos en 4 municipios

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Drenaje pluvial y gestión de residuos sólidos									
Micropresa de infiltración y regulación construida	Micropresa	1,00	1,00		1,00	1.678.917,00	1.437.184,00		1.678.917,00
Obras de revestimiento y estabilizacion del cauce contruidas	metros lineales	2.458,00	2.505,00		3.072,00	4.490.227,00	3.408.000,00		5.047.000,00
Limnógrafos instalados (12) y de reposición (2)	limnógrafos	14,00			14,00	300.000,00	53.000,00		270.000,00
Plan de Manejo integral de gestión desechos sólidos mancomunado en 4 municipios implementado	plan				1,00	150.000,00	17.740,00		4.390.000,00
Adquisicion de equipos de recolección de residuos sólidos para los municipios subcuenca III	Equipos				12,00	300.000,00	242.936,00		1.236.000,00
Obras de drenaje pluvial complementarias	Glb				1,00				2.608.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Sistema monitoreo Junta Directiva AMUSCLAM implementado	Sistema	1,00			1,00	5.000,00			5.000,00
Plan Estrategico AMUSCLAM implementado	Plan				1,00	8.025,00	2.250,00		15.000,00
Oficinas de la Unidad de gestión ambiental ( UGAM) implementadas	Oficinas	1,00	1,00		5,00	74.000,00	16.896,00		361.000,00
Sistema gerencial AMUSCLAM implementado	sistema				1,00	19.000,00	3.440,00		42.000,00
Sistema de Monitoreo de calidad ambiental implementado	sistema	1,00	1,00		1,00	6.020,00	9.913,00		14.000,00
Reducción y control de erosión									
Cubas de infiltración establecidas	Cubas	2.636,00	2.669,00		11.796,00	79.348,00	78.821,00		335.000,00
Barreras vivas establecidas	metros lineales	108.420,00	110.100,00		455.703,00	69.000,00	49.133,00		246.000,00
Cortinas rompe viento establecidas	metros lineales	47.295,00	68.695,00		215.947,00	29.000,00	29.450,00		131.000,00
Diques prendedizos establecidos	metros lineales	1.994,00	2.072,00		10.116,00	75.000,00	72.252,00		314.000,00
Rampas construidas	unidades	13,00	4,00		67,00	140.000,00	58.630,00		553.000,00
Taludes construidos	metros cuadrados (m2 )	2.037,00	1.244,00		10.086,00	346.000,00	133.339,00		862.000,00
Estructuras de cabecera construidas	unidades	11,00	2,00		55,00	49.000,00	11.362,00		219.000,00
Cercas vivas establecidas	metros lineales	31.939,00	46.189,00		151.111,00	20.000,00	17.724,00		80.000,00
Sistemas ecoforestales establecidos	hectáreas	52,00	42,00		214,00	78.000,00	61.647,00		291.000,00
Plantaciones energeticas establecidas	hectáreas	114,00	112,00		322,00	106.000,00	87.242,00		246.000,00
Programas de educación ambiental formal implementados	programa	1,00	1,00		4,00	131.000,00	59.265,00		306.000,00
Programas de educaci3n ambiental no formal implementados	Programa	1,00	1,00		4,00	73.000,00	38.576,00		194.000,00

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

NI-L1010 - Stormwater Drainage and Development Management SubWatershed III  
Managua  
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 14/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Programas educación ambiental informal implementados	programa	1,00			3,00	80.000,00	7.680,00		69.000,00
<b>Planificación territorial y ambiental</b>									
Planes ambientales municipales elaborados e implementados	Planes	5,00	5,00		9,00	72.000,00	52.028,00		77.000,00
Planes de Ordenamiento Territorial aprobados	Planes	5,00	5,00		5,00	123.000,00	105.654,00		167.000,00
Planes reguladores municipales aprobados	Planes	5,00	5,00		5,00	108.000,00	104.512,00		105.000,00
Convenios INETER-INIFOM	convenios	1,00			1,00	30.000,00			30.000,00
Estudios preliminares concluidos	estudios	22,00	27,00		55,00	69.777,00	69.958,00		136.000,00
Plan de acción Subcuenca III aprobado	plan	1,00	1,00		1,00	10.000,00	8.700,00		9.000,00
Estudios específicos concluidos	estudios	10,00			10,00	100.000,00			100.000,00
Proyectos elaborados	proyectos	20,00			20,00	100.000,00			100.000,00
Instrumentos de planificación divulgados	instrumentos	11,00			11,00	50.000,00			50.000,00
Sistema de monitoreo urbano implementado	sistema	1,00			1,00	50.000,00			50.000,00
Cuadrillas topograficas equipada y capacitadas	cuadrillas				7,00				50.000,00
<b>Coordinacion &amp; Administracion, Auditoria y Evaluación, Gastos Financieros</b>									
Coordinación y administración	N/A					745.000,00	524.000,00		1.607.000,00
Ingeniería	N/A						277.108,00		415.000,00
Auditoría y evaluación	N/A					32.000,00	37.441,00		192.000,00
Gastos Financieros	N/A					200.000,00	27.008,00		250.000,00
Sin asignación	N/A								897.083,00
<b>TOTAL</b>						<b>9.996.314,00</b>	<b>7.102.889,00</b>		<b>23.748.000,00</b>
