
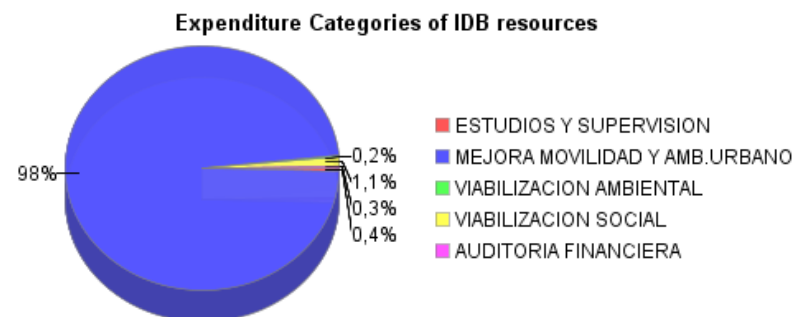
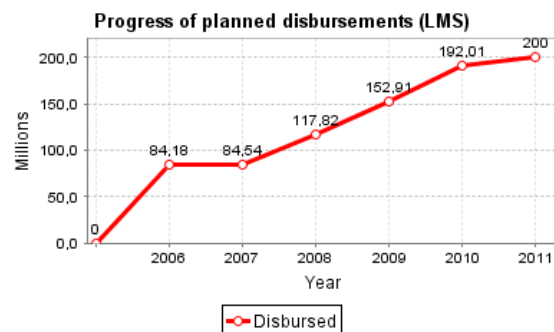



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio de Transporte				
Sector:	TRANSPORT				
Loan Number(s):	1659/OC-CO	Current Approved Amount:	200.000.000,00	Original IDB:	200.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	200.000.000,00	Current IDB:	200.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	67,00
Related Operation(s):	CO-L1101	Balance:		Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	200.000.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	B(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	09-abr-2013
			Validated by Country Representative:	10-abr-2013

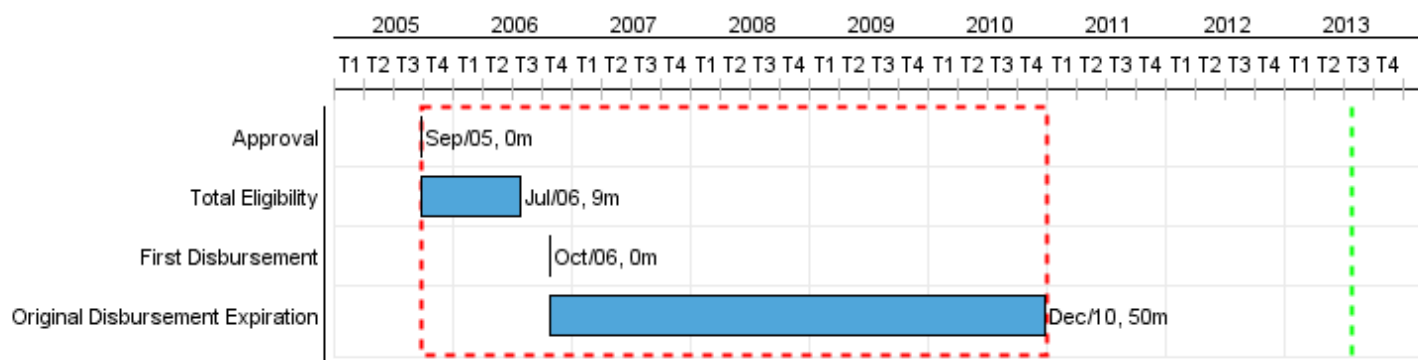

## Accumulated Progress as of 2012

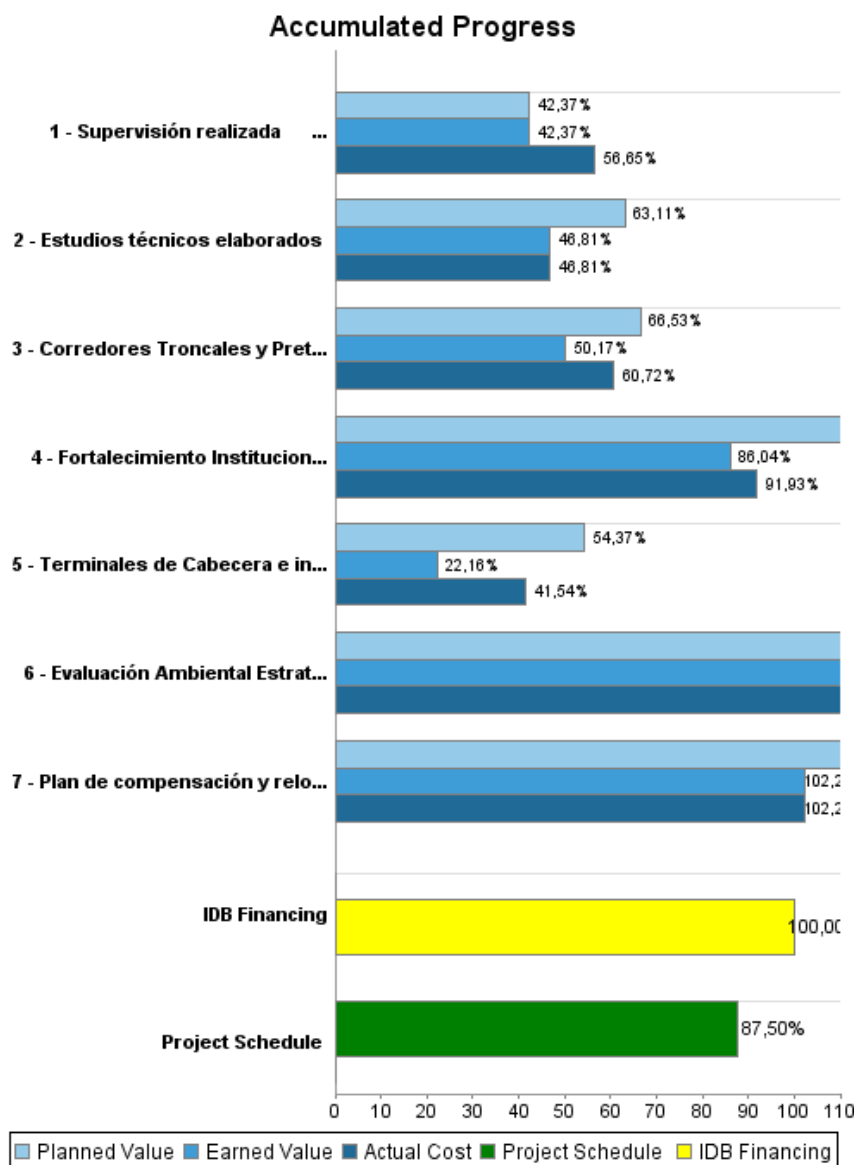

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Condiciones de movilidad de la población de Cali mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tiempo de desplazamiento del norte al sur de la ciudad.	min	25,00	2004	P	12,00
				A	
Tiempo promedio de espera en los paraderos del SITM.	minutos	25,00	2004	P	15,00
				A	

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Mejora de la movilidad del transporte Urbano.</b>									
Corredores Troncales y Pretroncales construidos	Km		0,49		282,00	11.364.272,98	19.142.656,00		542.536.539,00
Terminales de Cabecera e intermedias construidas	terminales		0,84		9,00	10.737.289,77	9.235.457,00		108.733.991,00
<b>Viabilización Ambiental</b>									
Evaluación Ambiental Estratégica implementada	Evaluación				1,00	211.652,75	90.659,00		90.659,00
<b>Fortalecimiento Institucional.</b>									
Fortalecimiento Institucional mejorado	Global	1,00	1,00		1,00	128.565,47	227.290,00		1.678.295,79
<b>Viabilización Social</b>									
Plan de compensación y relocalización de la población afectada implementado.	Plan				1,00	842.554,85	196.410,00		785.857,00
<b>Estudios y Supervisión (Interventoría).</b>									
Supervisión realizada	Supervisión	1,00	1,00		5,00	494.251,24	2.832.312,00		33.862.149,49
Estudios técnicos elaborados	Plan de Estudios				1,00	3.128.907,40			13.577.184,00
<b>Auditoria Financiera</b>									
Estados financieros del Programa auditados.	N/A						78.211,00		536.441,00
<b>TOTAL</b>						<b>26.907.494,46</b>	<b>31.802.995,00</b>		<b>701.801.116,28</b>
