
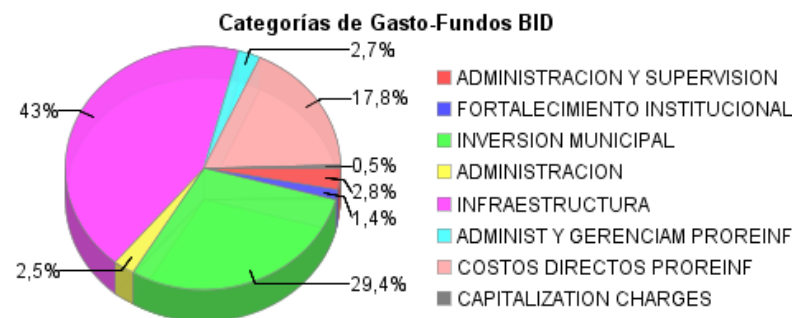
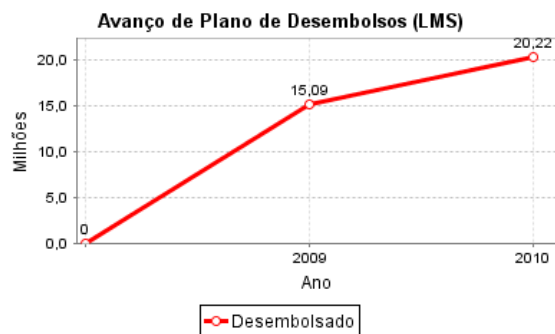



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Número da Operação:	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Atual:	162.488.867,81	Original BID:	151.600.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	144.364.108,11	Corrente BID:	162.488.867,81
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	88,85	Pari-passu:	98,59
Operação Relacionada:		Saldo:	18.124.759,70	Cofinanciamento/País:	7.600.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado:	159.200.000,00
				Período de Amortização (meses):	456

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

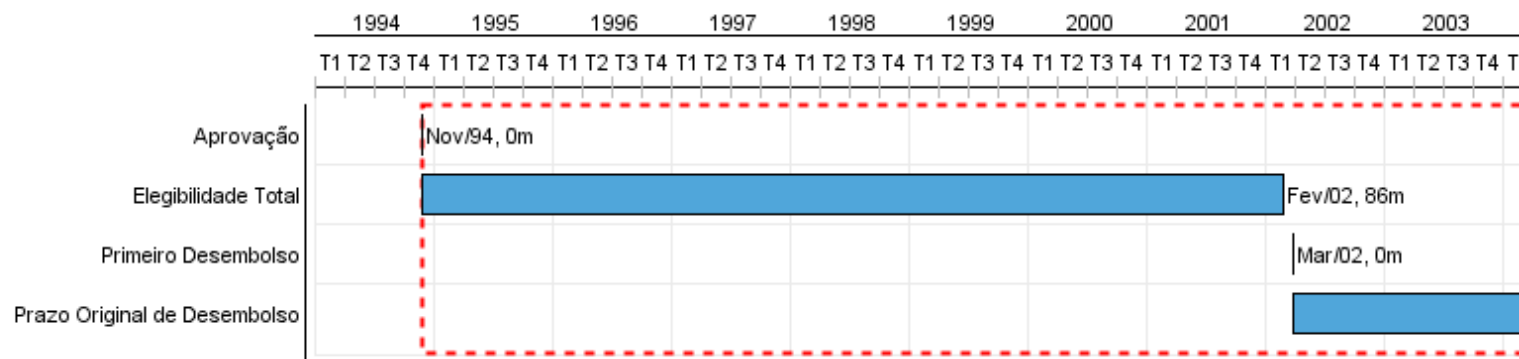

Progresso Acumulado até 2010

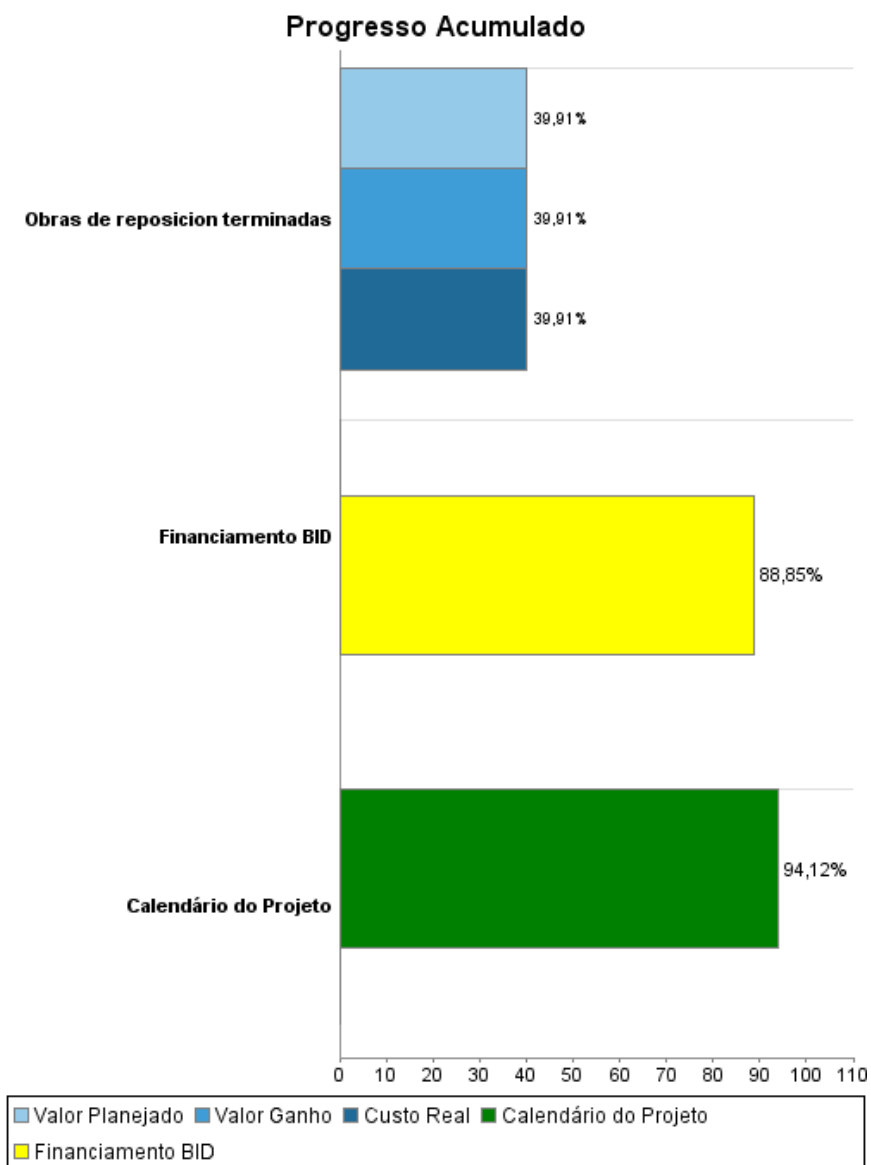

Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sub-préstamo 10 PROREINF									
Obras de reposicion terminadas	Obra	258,00	258,00		281,00	7.423.742,56	7.423.742,56		18.600.000,00
TOTAL						7.423.742,56	7.423.742,56		18.600.000,00
